

Руководитель
регионального проекта —
Черкасов Алексей Васильевич

ОДОБРЕН

(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

" (G8-38) Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом	Тысяча гектаров	0	0	0	0	0	0	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-061" Соглашение Проектный офис от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
2		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек	0	0	0	0	0	0	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №51-2019-G80017-1/1, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

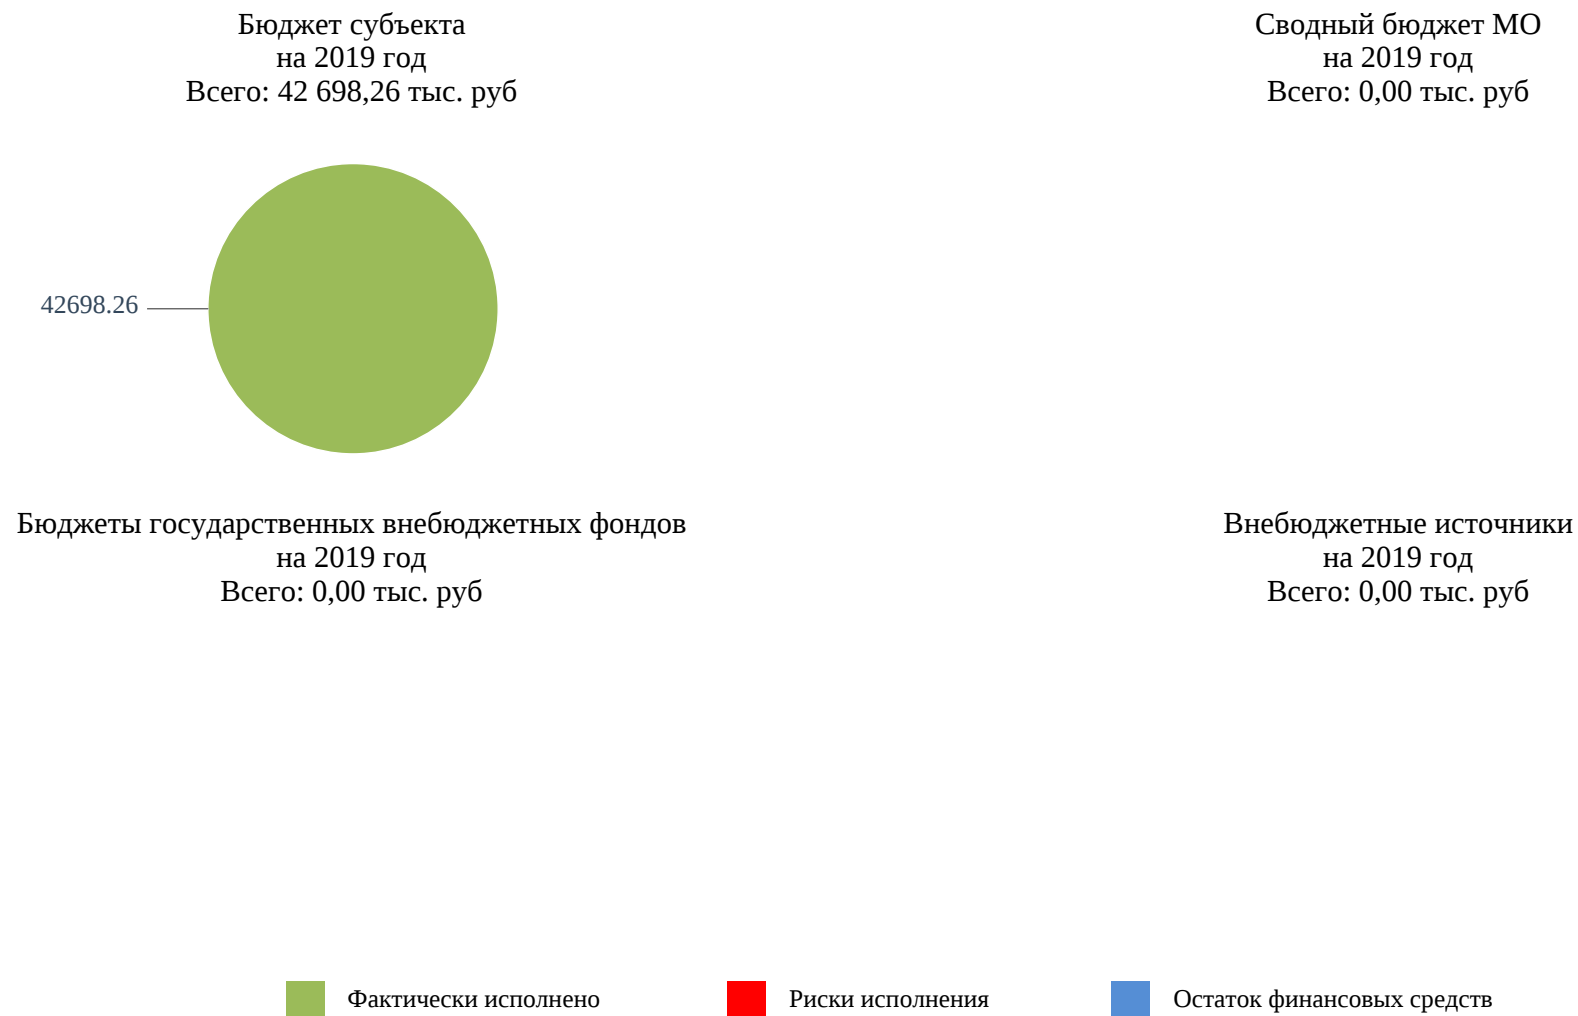3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	42 698,26	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019	
2		Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2020	
3		Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 37,4000 Дата: 29.12.2020	
4		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Закон РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл. Исполнение результата по завершении проекта в декабре 2020 года Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.4.	РРП		Закупка включена в план закупок	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.5.	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.6.	РРП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
1.7.	РРП		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
2.			Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 0,0000 Дата: 15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	Черкасов Алексей Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл. Исполнение результата по завершении проекта в декабре 2020 года. Предоставлена информация : 0 из 0.
3.			Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 37,4 га Значение: 37,4000 Дата: 29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	Черкасов Алексей Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение РПО от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Исполнение результата по завершении проекта в декабре 2020 года Предоставлена информация : 37.4 из 37.4.
3.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	18.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)» на территории Курской области " Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №051-2019-G80017-1/1, приложен файл. 2. "дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-061" Соглашение Проектный офис от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
3.2.	РРП		Документ утвержден (подписан)	12.12.2018	12.12.2018	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов на территории Курской области"" Паспорт регионального проекта Проектный офис от 12.12.2018г. №7, приложен файл. 2. "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)" Протокол Проектный офис от 12.12.2018г. №7, приложен файл.
3.2.1	РРП		Разработка паспорта регионального проекта	12.12.2018	12.12.2018	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального прокта "Сохранение

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							уникальных водных объектов на территории Курской области"" Паспорт регионального проекта Проектный офис от 12.12.2018г. №7, приложен файл. 2. "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)" Протокол Проектный офис от 12.12.2018г. №7, приложен файл.
3.3.	РРП		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.03.2019	14.02.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации" Соглашение Проектный офис от 14.02.2019г. №052-09-2012019, приложен файл.
3.3.1	РРП		Заключение соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов на финансовое обеспечение мероприятий по экологической реабилитации реки Сейм	01.03.2019	14.02.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации" Соглашение Проектный офис от 14.02.2019г. №052-09-2019-061, приложен файл.
3.4.	РРП		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	30.06.2019	25.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор на выполнение работ по осуществлению технического надзора за исполнением контракта" Договор проектный офис от 25.06.2019г. №19/ТН/19, приложен файл. 2. "акт сдачи-приемки работ" Акт приема-передачи проектный офис от 25.06.2019г. №19/ТН/19, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4.1	РРП		Заключен договор на осуществление технического надзора за исполнением работ по контракту по экологической реабилитации реки Сейм	30.06.2019	25.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "договор на выполнение работ по осуществлению технического надзора за исполнением контракта" Договор проектный офис от 25.06.2019г. №19/ТН/19, приложен файл. 2. "акт сдачи-приемки работ" Акт приема-передачи проектный офис от 25.06.2019г. №19/ТН/19, приложен файл.
3.5.	РРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	18.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Курской области»" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №51-2019-G80017-1/1, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-061" Соглашение Проектный офис от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
3.5.1	РРП		Заключение дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Курской области	10.12.2019	10.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Курской области»" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №051-2019-G80017-1/1, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.5.2	РРП		Заключение дополнительного соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов на финансовое обеспечение мероприятий по экологической реабилитации реки Сейм	18.12.2019	18.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-061" Соглашение Проектный офис от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
3.6.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2020	25.12.2020	Черкасов Алексей Васильевич	В работе. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №051-2019-G80017-1/1, приложен файл. 2. "дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-061" Соглашение Проектный офис от 18.12.2019г. №052-09-2019-061/1, приложен файл.
3.7.	РРП		Закупка включена в план закупок	31.05.2019	10.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме" Иное от 19.04.2019г. № 0144200002419000464, приложен файл. 2. "Контракт" Иное от 10.06.2019г. № 0144200002419000464_99212, приложен файл. 3. "Акт о приемке выполненных работ" Иное от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							06.06.2019г. №02-01-02/1, приложен файл. Существует риск недостижения в срок: Не заключение контракта на выполнение работ по экологической реабилитации реки Сейм от 597 км до 578 км от устья (17 км), Причина риска: В связи с поступившей жалобой в УФАС России по Курской области, процедура заключения контракта была приостановлена. В связи с чем контракт был заключен 10.06.2019, Вероятность: 10%, Последствия наступления: ожидаемая дата наступления: 10.06.2019г.
3.7.1	РРП		Проведение закупки на выполнение работ по экологической реабилитации реки Сейм	31.05.2019	10.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме" Иное от 26.04.2019г. № 0144200002419000464, приложен файл. 2. "Контракт" Иное от 10.06.2019г. № 0144200002419000464_99212, приложен файл. 3. "акт о приемке выполненных работ" Иное от 26.06.2019г. №02-01-02/1, приложен файл. В связи с поступившей жалобой в УФАС России по Курской области, процедура заключения контракта была приостановлена. В связи с чем контракт был заключен 10.06.2019
3.8.	РРП		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.05.2019	10.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по экологической реабилитации реки Сейм от 597 км до 578 км от устья (17 км)" Контракт Проектный офис от 10.06.2019г. № 0144200002419000464_99212, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме" Иной вид документа Проектный офис от 19.04.2019г. №01442000024190000464, приложен файл.
3.8.1	РРП		Заключение контракта на выполнение работ по экологической реабилитации реки Сейм	31.05.2019	10.06.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "контракт на выполнение работ по экологической реабилитации реки Сейм от 597 км до 578 км от устья (17 км)" Контракт Проектный офис от 10.06.2019г. № 0144200002419000464_99212, приложен файл. 2. "Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме" Иной вид документа Проектный офис от 19.04.2019г. №0144200002419000464, приложен файл.
4.			<i>Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019</i>	25.12.2019	25.12.2019	Черкасов Алексей Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №051-2019-G80017-1/1, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение" Соглашение Проектный офис от 10.12.2019г. №051-2019-G80017-1/1, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

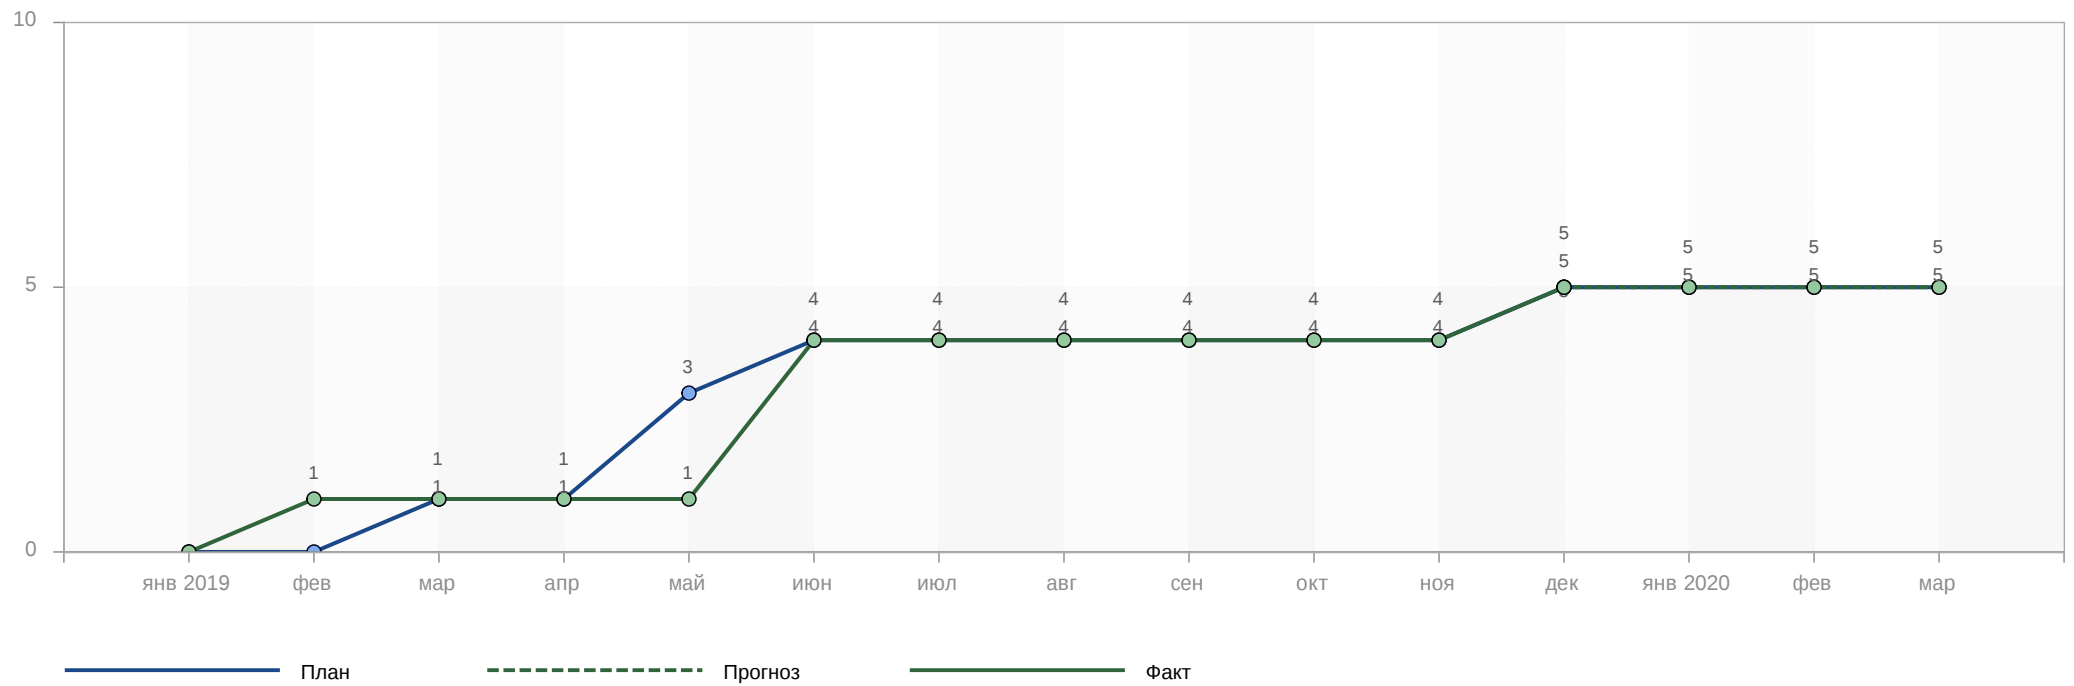


Рис. 1. " (G8-38) Сохранение уникальных водных объектов (Курская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

График достижения показателя




Рис. 3. Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом
