
(подпись)

30.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е1-38) Современная школа (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Процент		0	0	0	0		0,00	Значение показателя не задано. Будет уточняться.
2		Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0	0	0	0	0	0	0,00	Достижение значения показателя запланировано на 2021 год - 0,25 тысячи мест
3		Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	Достижение значения показателя запланировано на 2024 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0	0	0	0	0	0	0,00	Достижение значения показателя запланировано на 2020 год - 42 учреждения
5		Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0	0	0	0	0	0	0,00	Достижение показателя запланировано на 2020 год - 7,4 тысячи человек

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

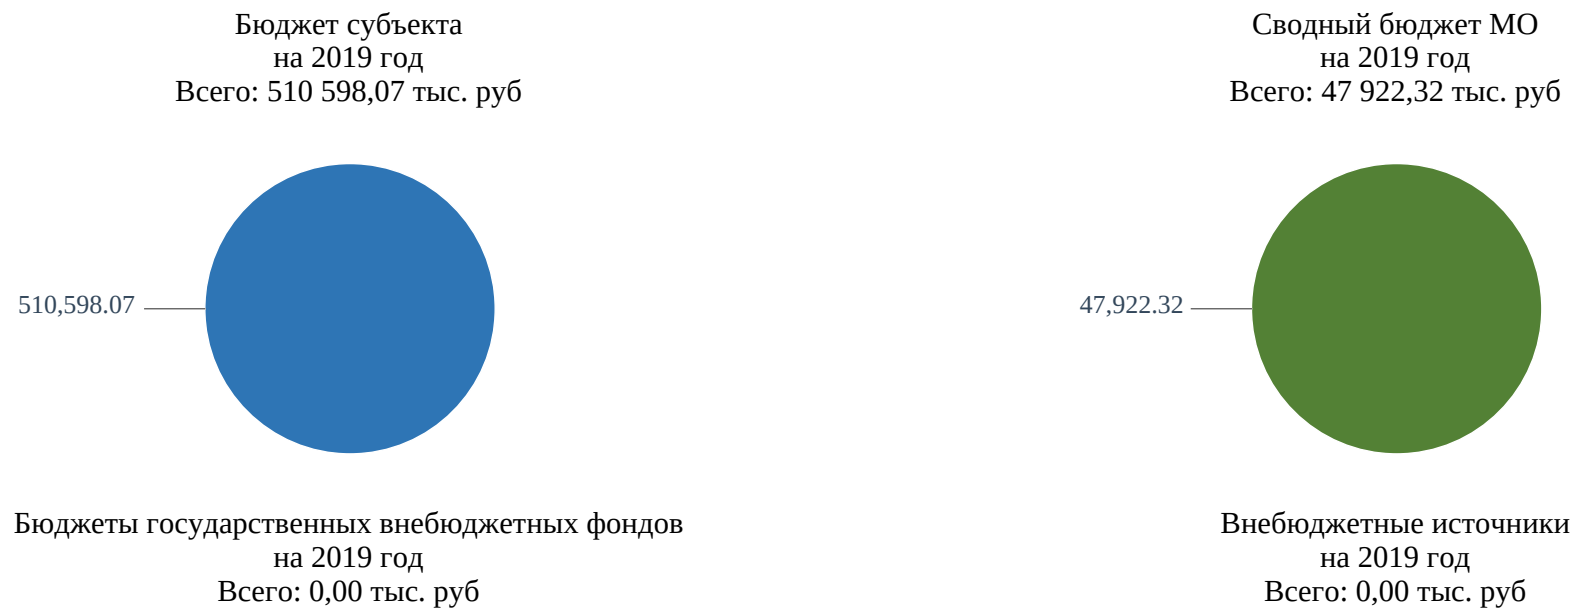3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	26 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(05) Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(21) Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	532 470,25	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	532 470,25	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	.
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	484 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			558 520,38	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			558 520,38	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			510 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	47 922,32	100,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
2		Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	
3		Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
4		Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	
5		Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	
6		Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Современная школа (Курская область)" на территории Курской области" Иное Министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. № 073-2019-Е10041-1/2, приложен файл. Отсутствует значение результата на 2019 год Предоставлена информация : 0 из 0.
2			Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе.
3			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Значение: 4, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Российская Е. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет об исполнении мерпорятий" Отчет Комитета образования и науки Курской области от 20.12.2019г. №08.1-07-01/14516, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РРП		В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	20.12.2019	Шумакова И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет по итогам реализации мероприятий" Отчет Комитета образования и науки Курской области от 20.12.2019г. №08.1.-07-01/14516, приложен файл.
3.1.1	РНП		Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30.10.2018	29.10.2018	Шумакова И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо об участии в отборе" Заявка Администрации Курской области от 29.10.2018г. №01-11/842, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	ВДЛ		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2019	10.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 10.02.2019г. №073-08-2019-349, приложен файл.
4			<i>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам Значение: 6, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Российская Е. Н.	Информация по значению результата: В работе.
4.1	РНП		Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	31.12.2020	Шумакова И. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РНП		Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.08.2019	04.07.2019	Шумакова И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе" Заявка Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-09/644, приложен файл.
4.1.2	ВДЛ		Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2020	20.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 20.12.2019г. №073-09-2020-317, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Курская область)» на территории Курской области" Иное Министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. № 073-2019-Е10041-1/2, приложен файл. В 2019 году значение по результату отсутствовало Предоставлена информация : 0 из 0.
6			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.042, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений







Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1	РРП		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	01.05.2020	01.05.2020	Уколов А. Ф.	В работе.
6.1.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	30.08.2019	04.07.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе" Заявка Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-09/638, приложен файл.
6.1.2	РРП		Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019	15.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Современная школа (Курская область)"" Иное Министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-Е10041-1/2, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.3	РРП		Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет	31.12.2019	20.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 20.12.2019г. №073-09-2020-317, приложен файл.
6.2	РРП		Не менее чем в 42 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	31.12.2020	31.12.2020	Василенко И. В.	В работе.
6.2.1	РРП		Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста	01.10.2019	30.09.2019	Василенко И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по созданию в 2020 году Центров образования" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 30.09.2019г. №1-1073, приложен файл.
6.2.2	РРП		Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	31.12.2019	17.12.2019	Евдокимов Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019г. №Р-133, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			<i>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Курская область)» на территории Курской области" Иное министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. № 073-2019-Е10041-1/2, приложен файл. В 2019 году показатели результата отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
7.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	09.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством Просвещения РФ и Администрацией Курской области" Соглашение Министерства Просвещения от 09.02.2019г. №073-09-2019-196, приложен файл.
7.1.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	28.02.2019	09.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между министерством Просвещения Российской Федерации и Администрации Курской области" Соглашение Министерства Просвещения от 09.02.2019г. №073-09-2019-196, приложен файл.
8			<i>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1			Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.06.2019	30.06.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "КТ появилась по итогам синхронизации, не требуется, будет удалена в ближайшем запросе на изменение" Иное комитета образования науки Курской области от 30.06.2019г. №б/н, указана ссылка. В следствие технической ошибки исполнение мероприятия запланировано в 2020 году, в новой редакции РП дата исполнения будет скорректирована.
9			Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 2000, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Курская область)» на территории Курской области" Иное министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. № 073-2019-Е10041-1/2, приложен файл. Предоставлена информация : 2000 из 2000.
9.1			Оборудование приобретено	10.12.2019	30.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оснащении средствами обучения и воспитания " Отчет Комитета образования и науки Курской области от 30.12.2019г. №08.1-07-02/15012, приложен файл.
9.1.1	РФП		Оборудование приобретено	10.12.2019	30.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие документы: 1. "отчет об оснащении средствами обучения и воспитания" Отчет Комитета образования и науки Курской области от 30.12.2019г. №08.1-07-02/15012, приложен файл. 2. "Приложение" Прочий тип документа Комитета образования и науки Курской области от 30.12.2019г. №08.1-07-02/15012, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.2			Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2019	26.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "лицензия на осуществление образовательной деятельности" Иное Комитета образования и науки Курской области от 31.08.2018г. №2923, приложен файл.
9.2.1	РФП		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2019	31.08.2018	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия на осуществление образовательной деятельности" Иное Комитета образования и науки Курской области от 31.08.2018г. №2923, приложен файл.
9.3	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	09.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством Просвещения РФ и Администрацией Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 09.02.2019г. №073-09-2019-091, приложен файл.
9.3.1	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	28.02.2019	09.02.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством Просвещения РФ и Администрацией Курской области" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 09.02.2019г. №073-09-2019-091, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

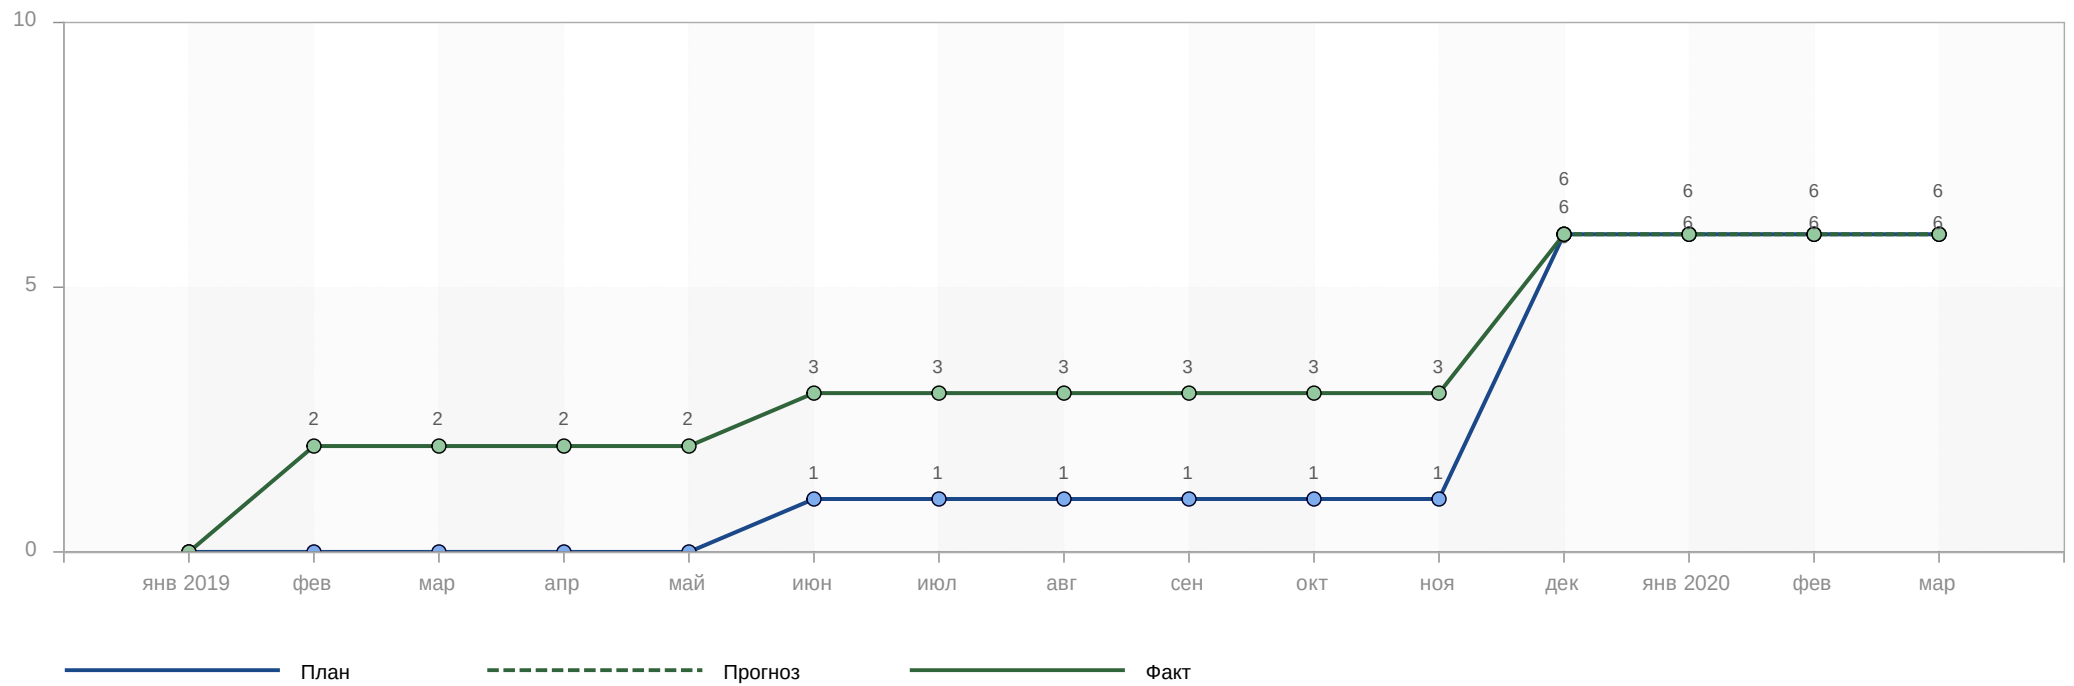


Рис. 1. "(Е1-38) Современная школа (Курская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

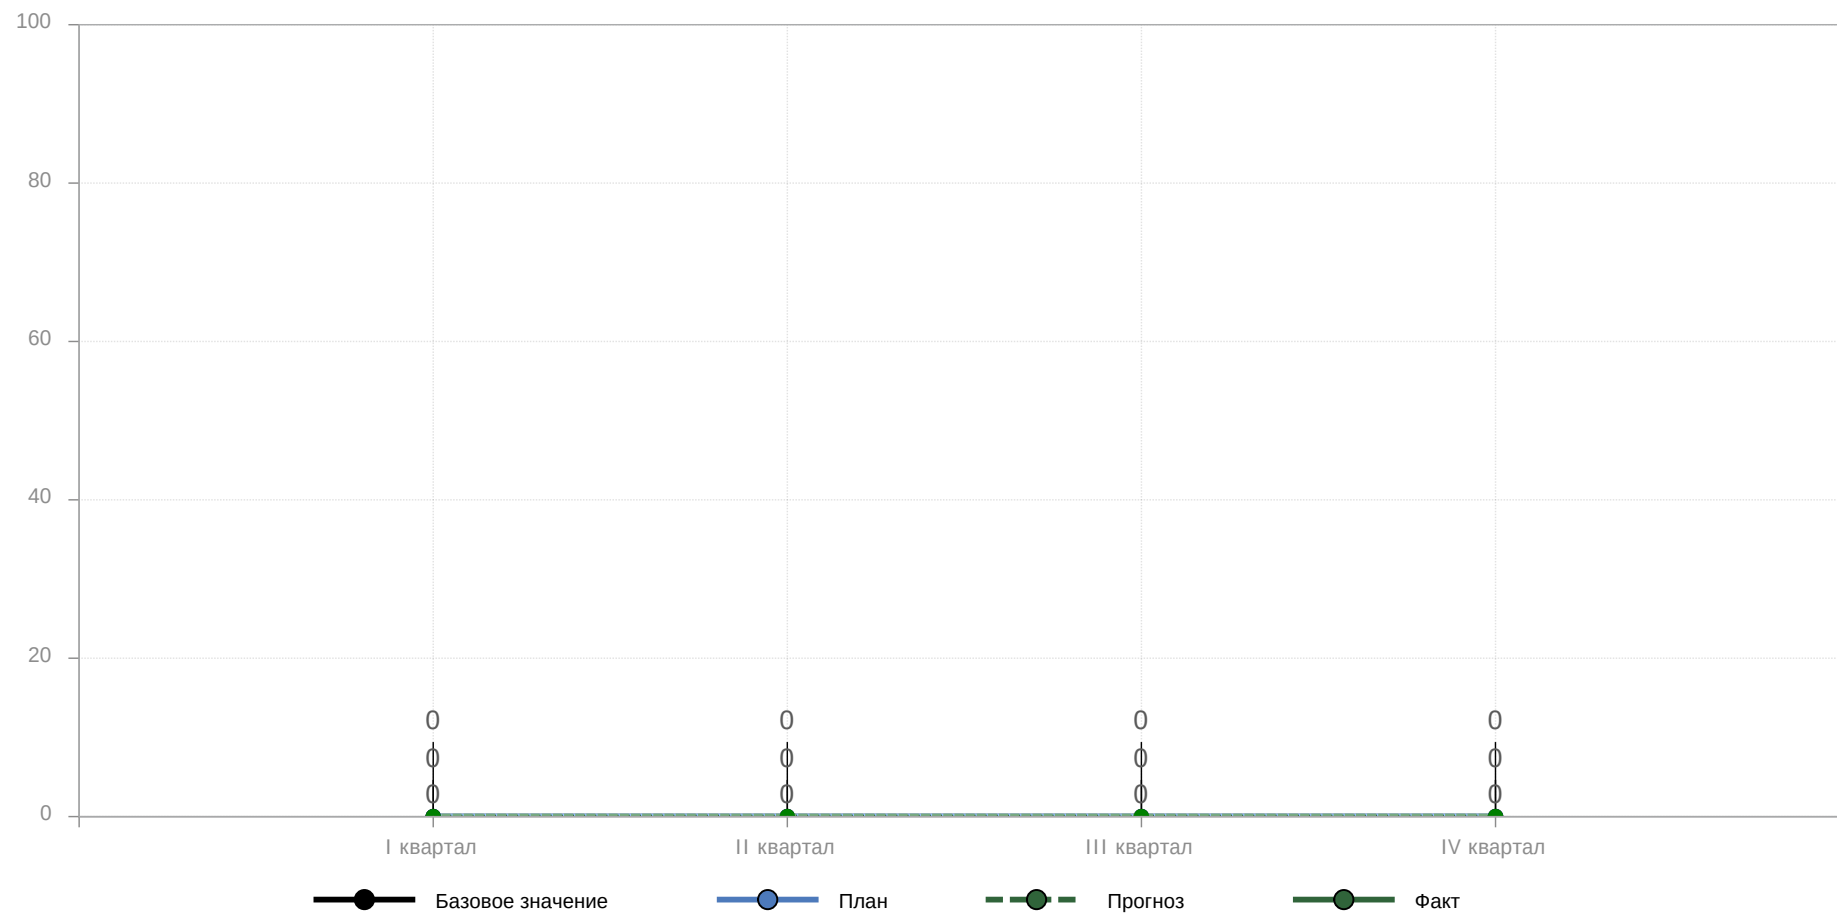


Рис. 1. Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

Диаграмма достижения показателя

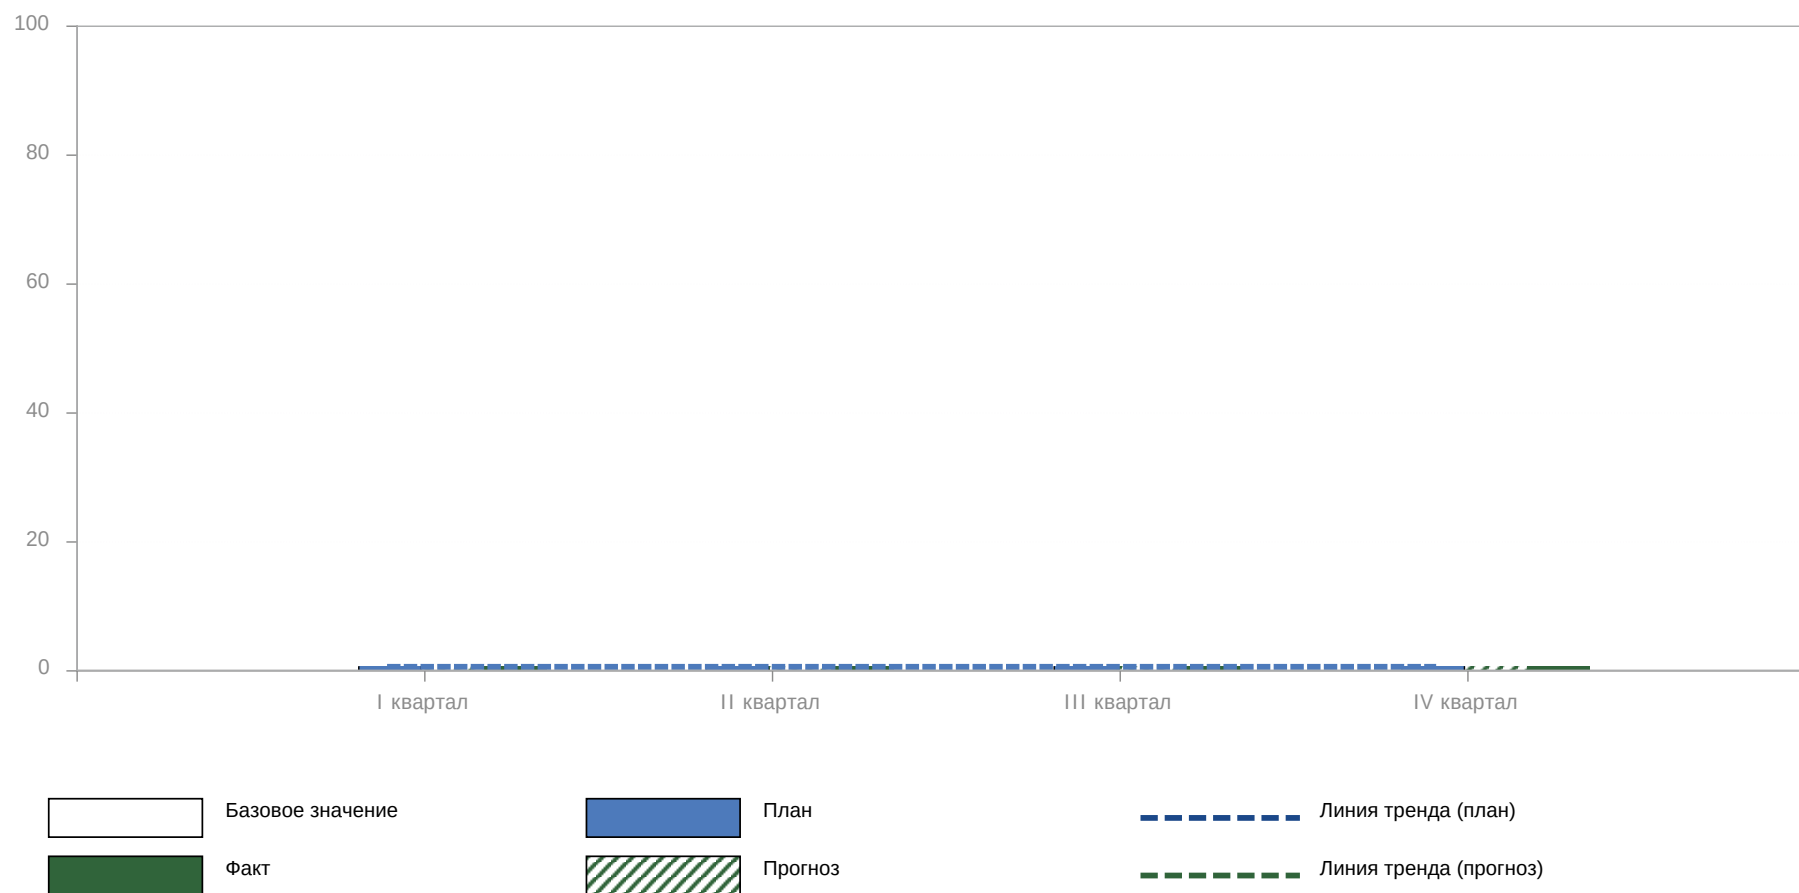


Рис. 2. Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

График достижения показателя

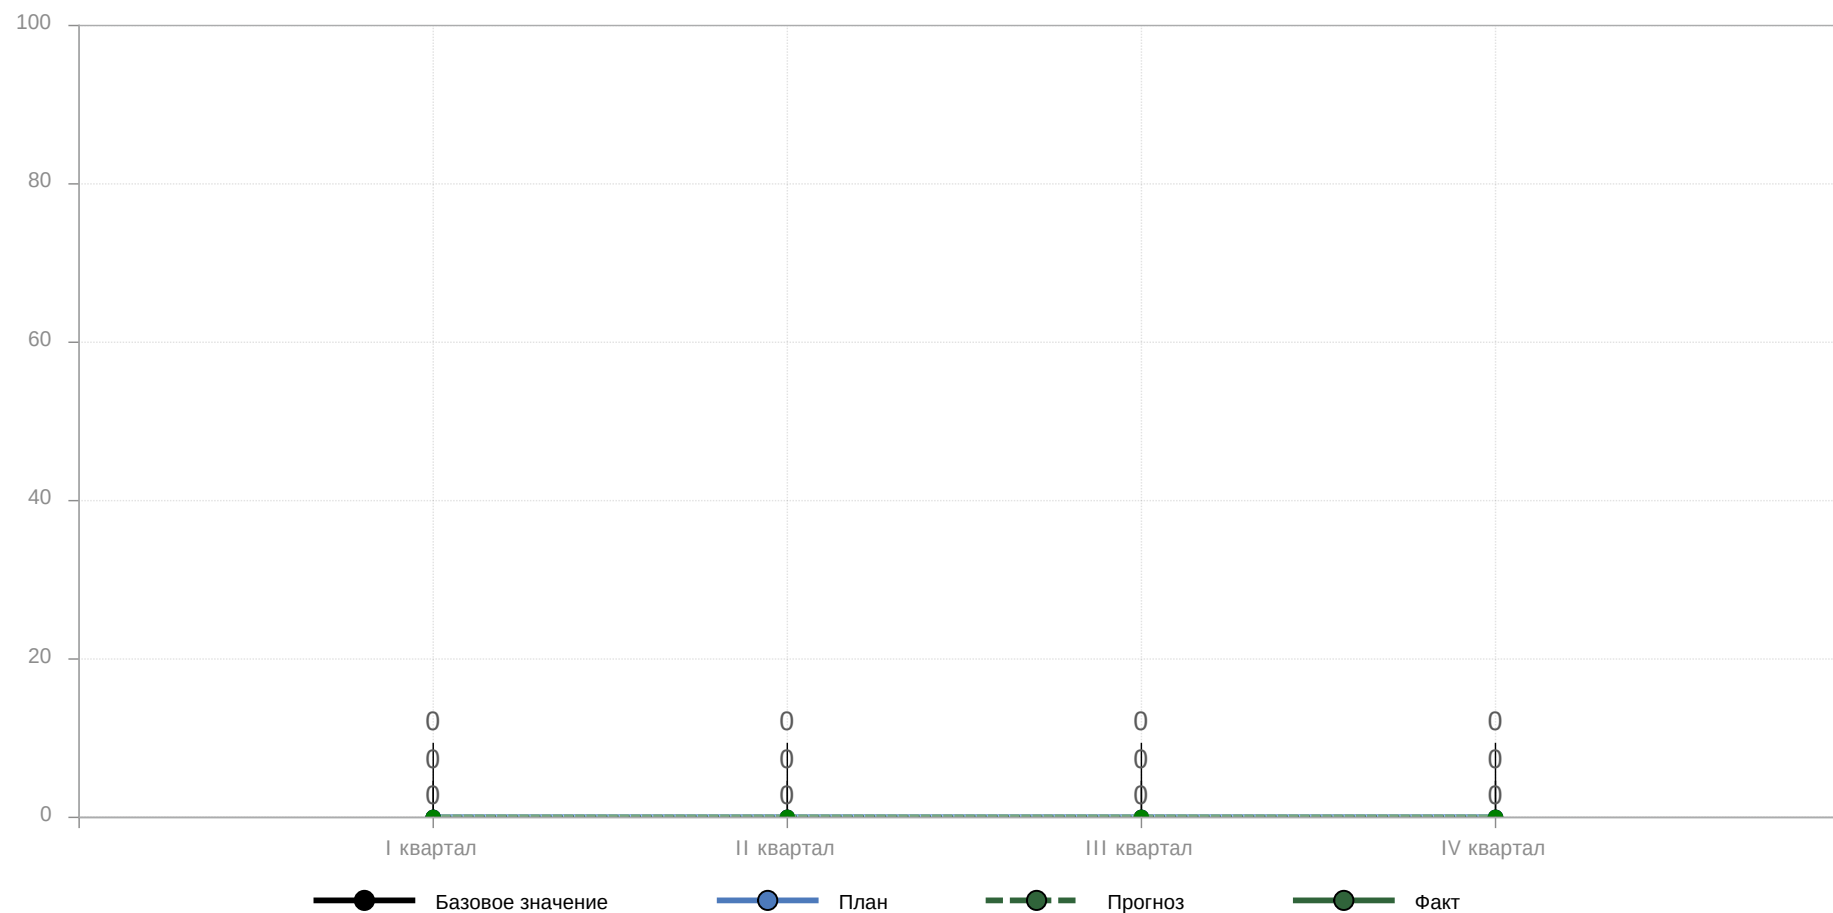


Рис. 3. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

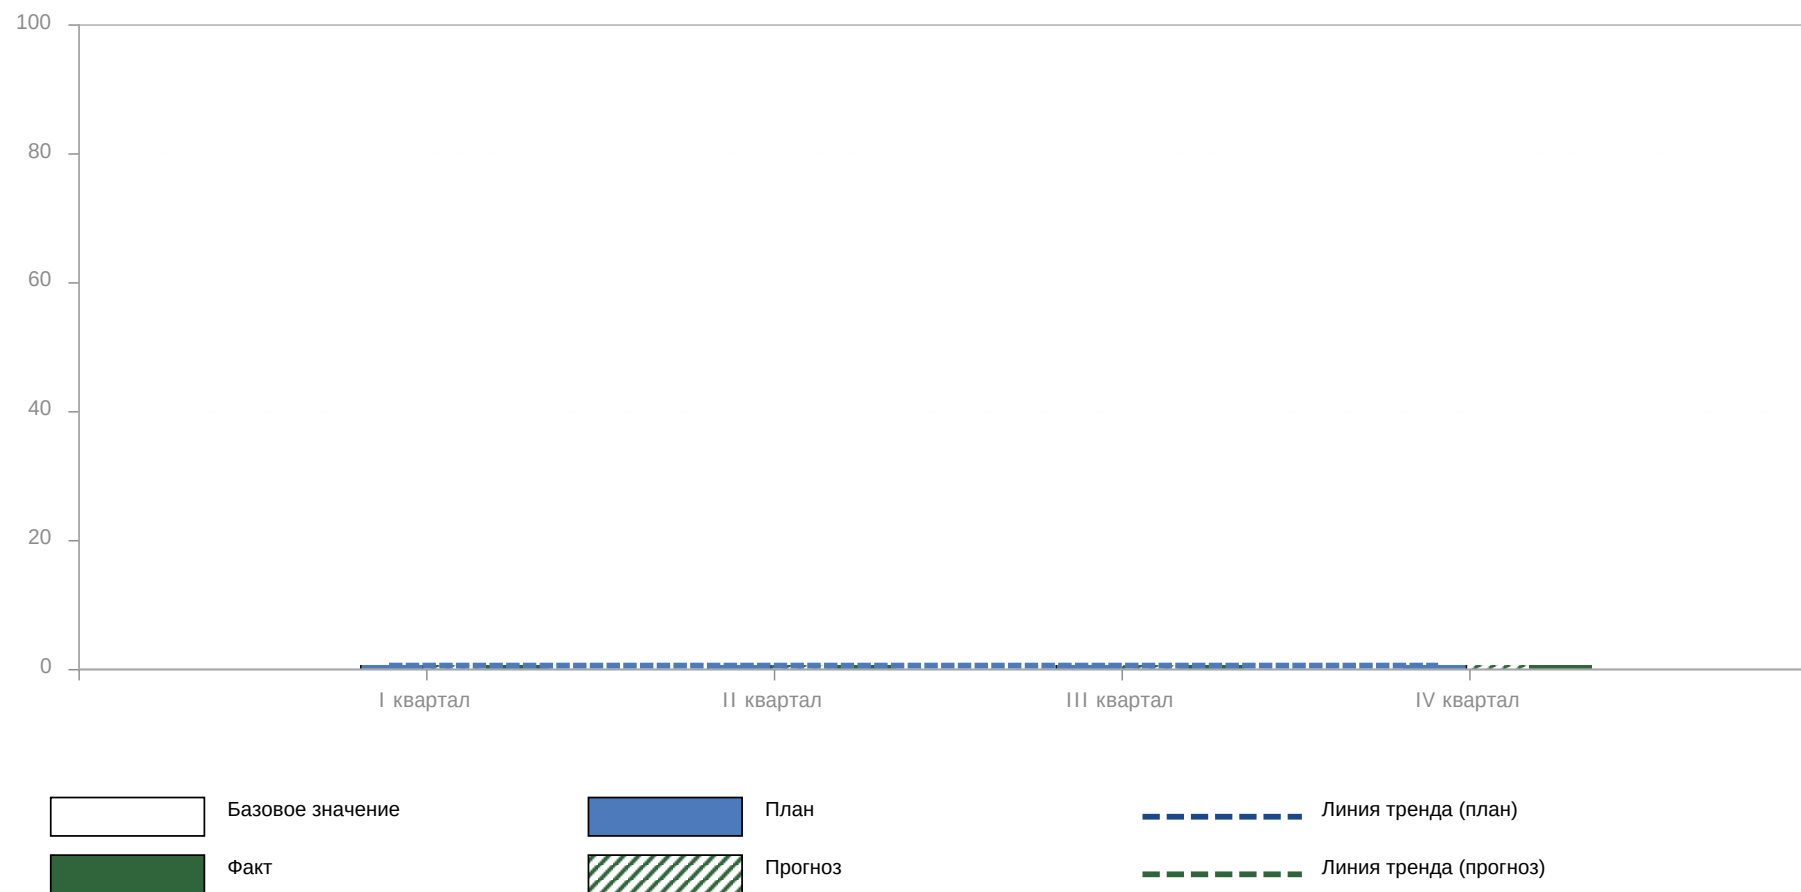


Рис. 4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

График достижения показателя

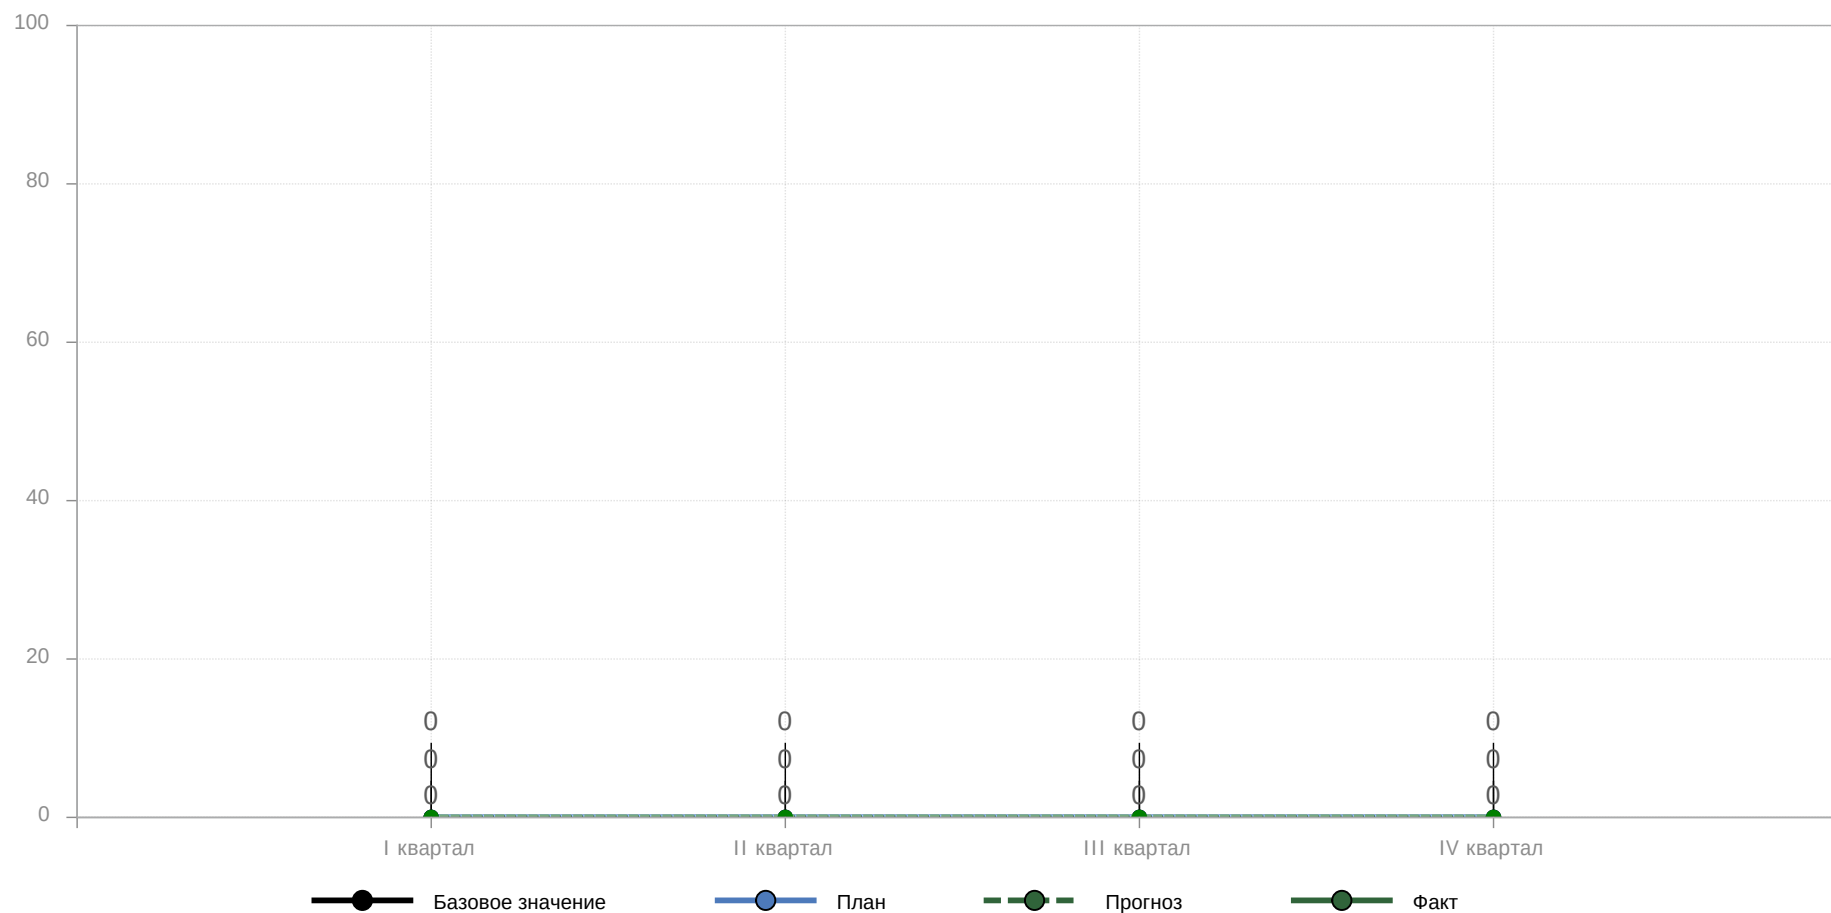


Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент

Диаграмма достижения показателя

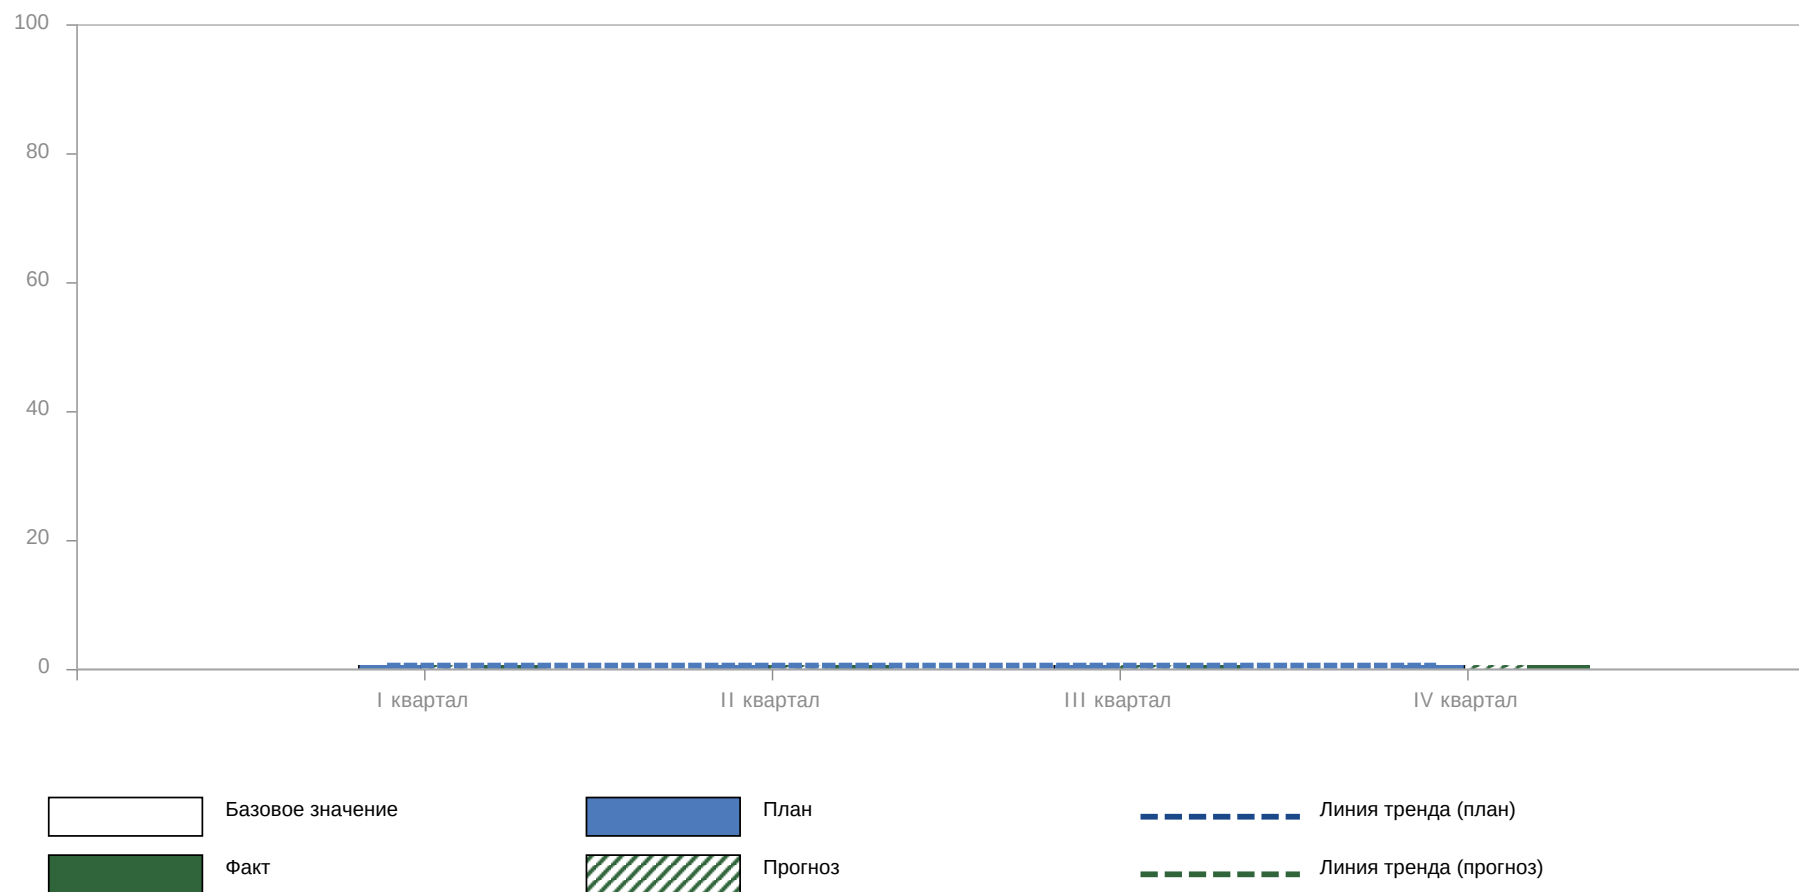


Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент

График достижения показателя

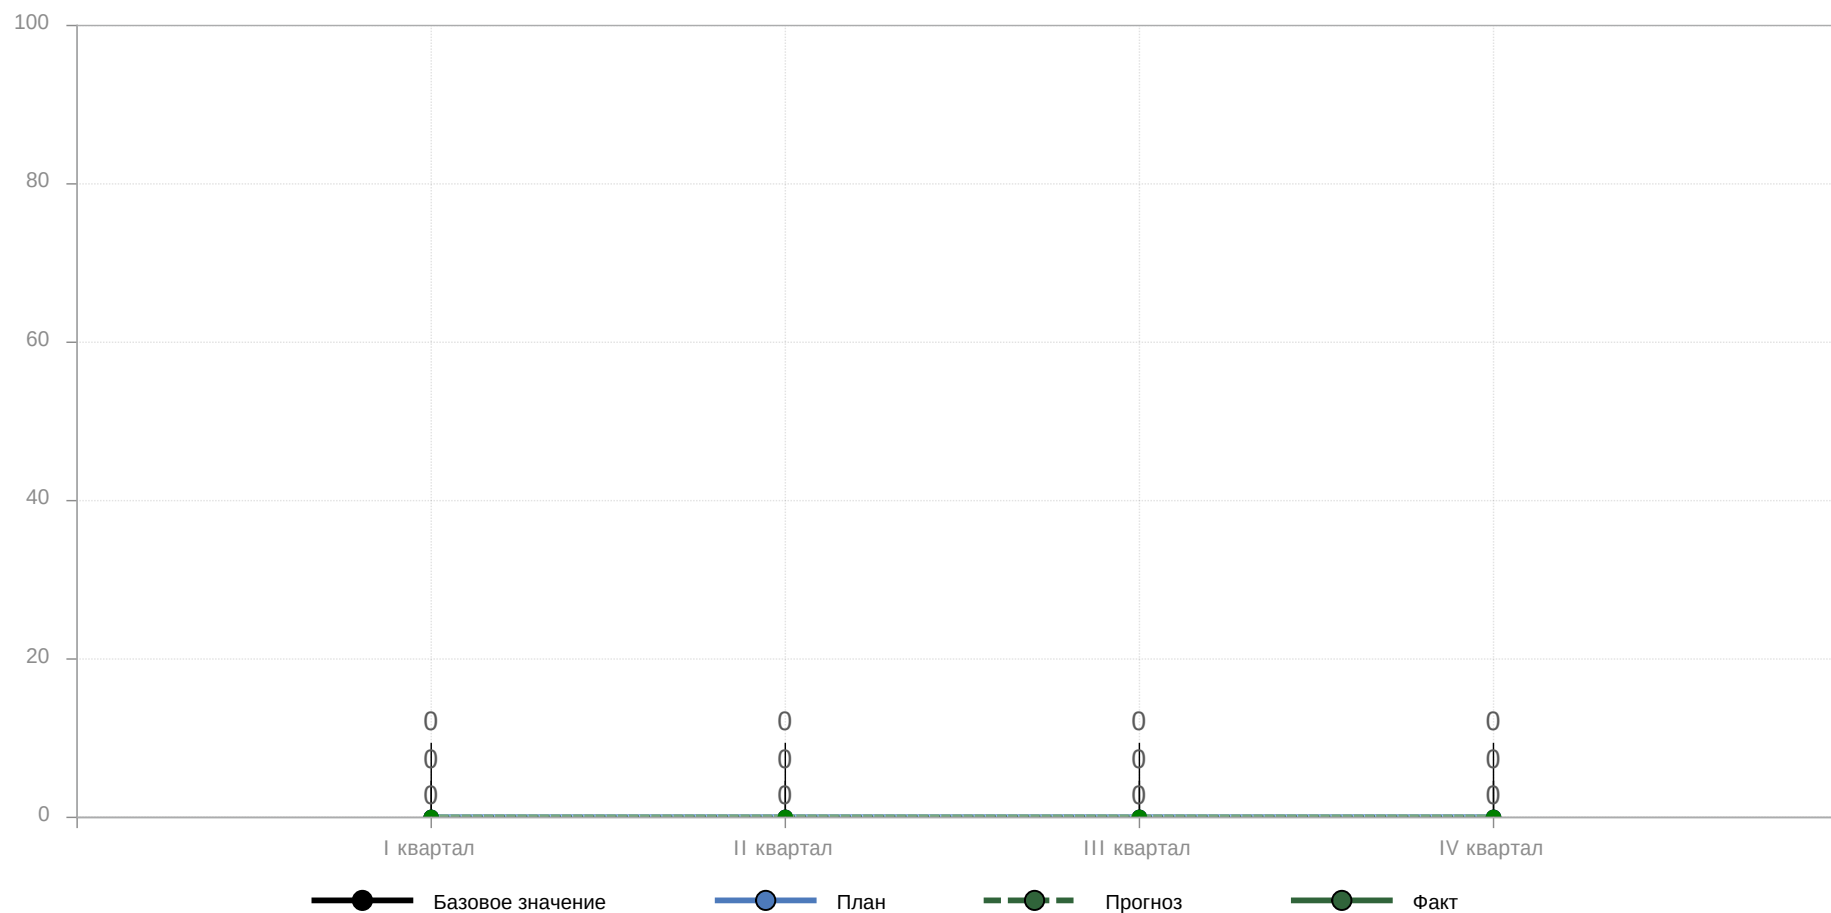


Рис. 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Диаграмма достижения показателя

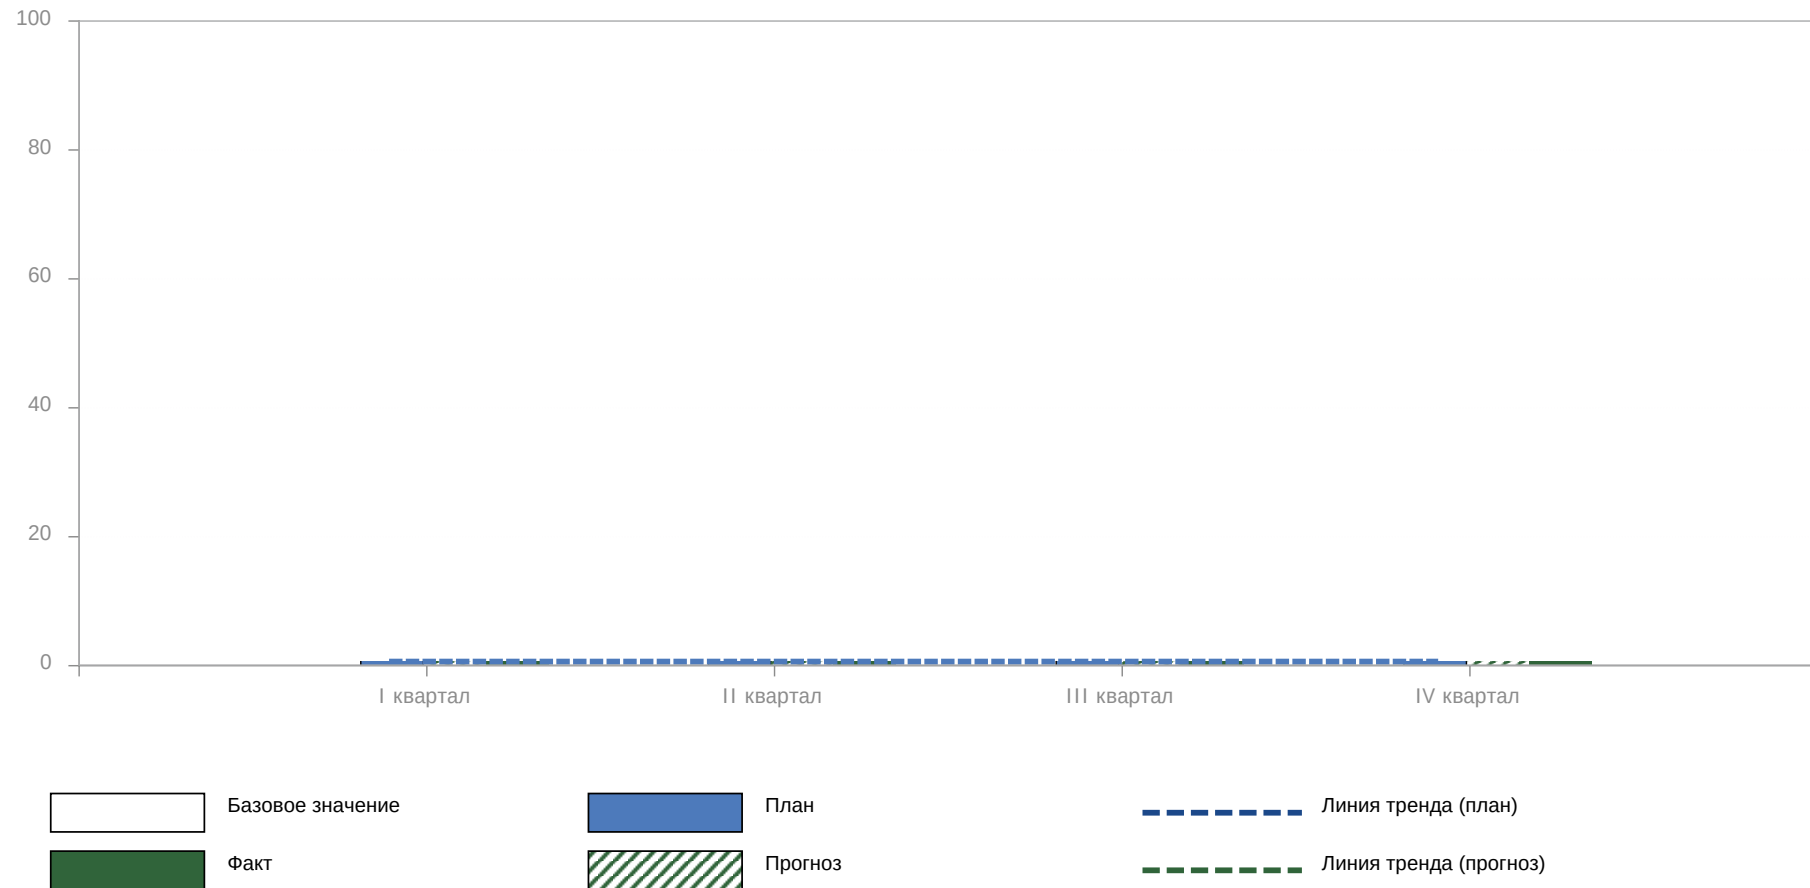


Рис. 8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

График достижения показателя

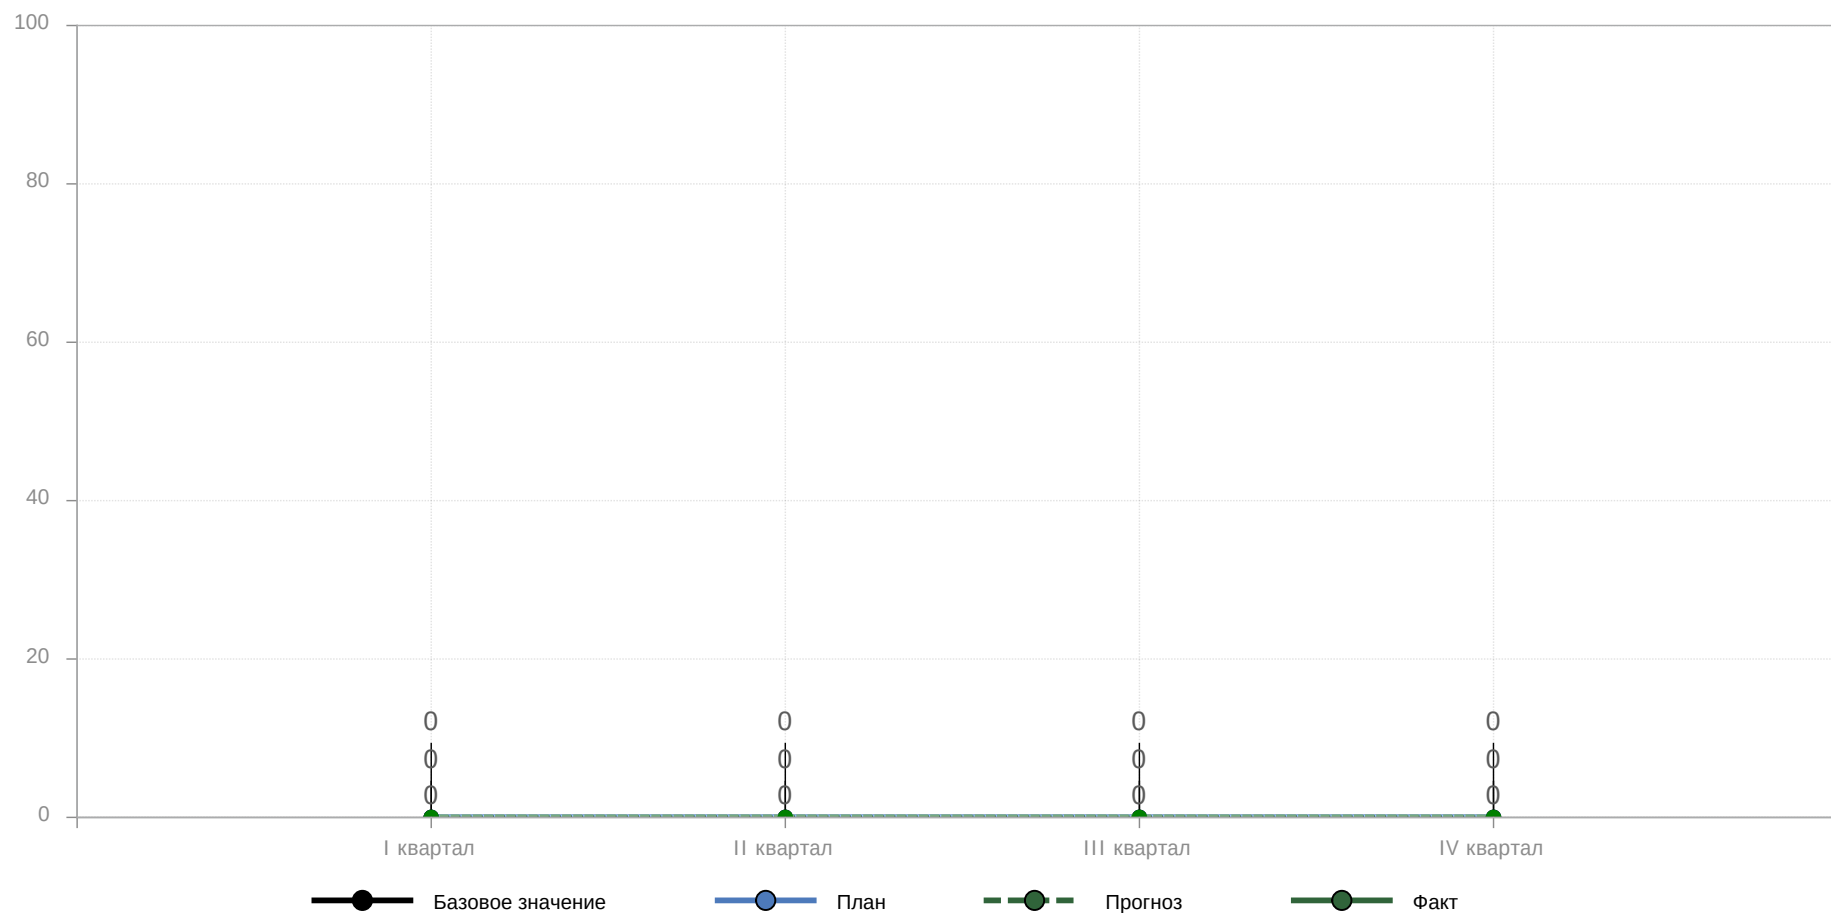


Рис. 9. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Диаграмма достижения показателя

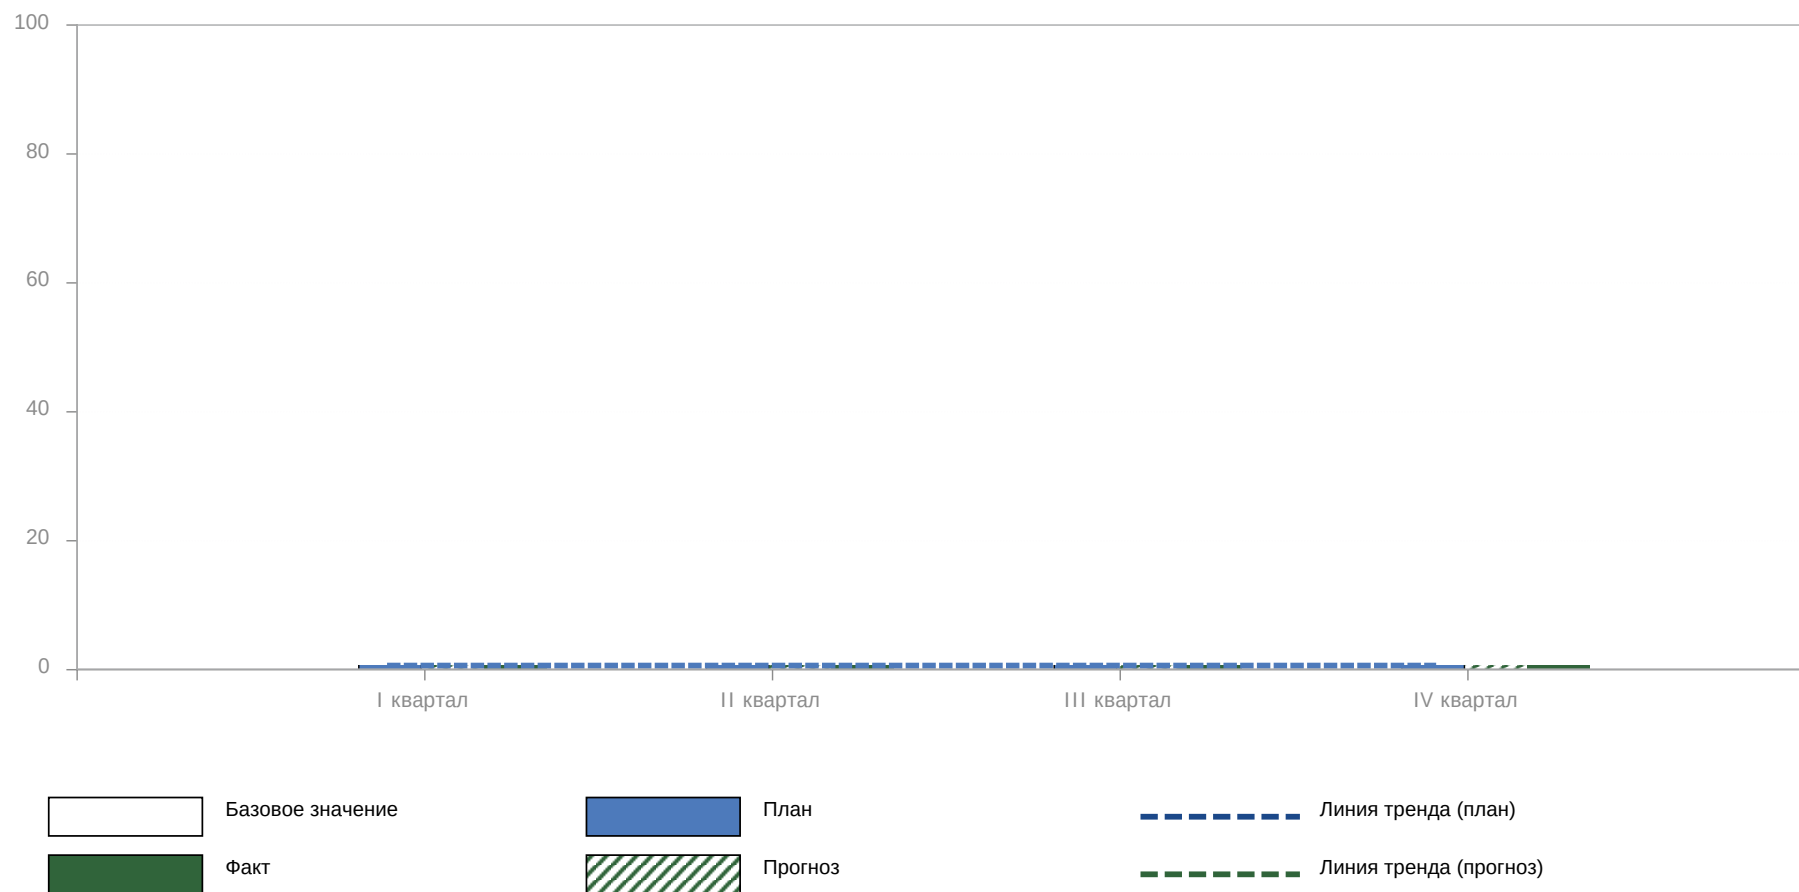


Рис. 10. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
