

Руководитель
регионального проекта —
Пархоменко Наталья Александровна

ОДОБРЕН

(подпись)

25.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е6-38) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-		0	0	0	0		0,00	Внедрена итоговая аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
2		Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Единица	0	0	0	0	0	0	0,00	Открытие центра запланировано в 2021 году
3		Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Процент	0	0	0	5	5	9.09	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена" Иное Союза "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Процент	0	0	0	5	5	3.93	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена" Отчет Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.
5		Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Единица	0	0	0	0	15	15	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Акты мониторинга исполнения контрактов" Акт Комитета образования и науки Курской области от 05.11.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 7 394,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(03) Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(09) Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(11) Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	 
2		Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	
3		Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки	
4		Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области: не менее 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена	 
5		В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	 
6		Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	 
7		Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области: не менее 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена Значение: 25, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
1.1	РРП		Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2019	25.06.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" Отчет Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.03.2019	19.03.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "О проведении демонстрационного экзамена" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 19.03.2019г. №1-243, приложен файл.
1.1.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2019	29.04.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 59 дней. Подтверждающие документы: 1. "Электронный аттестат" Иное Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 29.04.2019г. №837-19/0804, приложен файл.
1.1.3	РРП		Проведение демонстрационного экзамена и оформление его результатов	30.06.2019	25.06.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" Отчет Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2	РРП		Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.
1.2.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	01.03.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	01.03.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.
2			<i>В Курской области созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием Значение: 1, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
2.1	РРП		В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2019	25.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Фотографии с открытий" Иное Комитета образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Акты мониторинга исполнения контрактов на закупку мастерских" Акт Комитета образования и науки Курской области от 05.11.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РНП		Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	30.12.2018	28.02.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 60 дней. Подтверждающие документы: 1. "На участие в конкурсном отборе" Заявка ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж" от 28.02.2019г. №01/215, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.2	РРП		Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	28.02.2019	17.06.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 109 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и ОБПОУ "Железнодорожный горно-металлургический колледж"" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 17.06.2019г. №073-15-2019-755, приложен файл.
2.1.3	РРП		Получена субсидия из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.05.2019	24.06.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 54 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Банка от 24.06.2019г. №482959, приложен файл.
2.1.4	РРП		Мониторинг исполнения контрактов на закупку современного оборудования для мастерских	31.12.2019	05.11.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт мониторинга исполнения контрактов на закупку" Акт Комитета образования и науки Курской области от 05.11.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.5	РНП		Обеспечена готовность в профессиональных образовательных организациях к использованию современного оборудования мастерских	31.12.2019	25.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Фотография" Иное Комитета образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Фотография 2" Иное Комитета образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Фотография 3" Иное Комитета образования и науки Курской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.2	РРП		В профессиональных образовательных организациях Курской области функционирует 19 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	30.12.2019	10.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка" Заявка Администрации Курской области от 10.12.2019г. №01-091463, приложен файл.
2.2.2	РРП		Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	28.02.2020	28.02.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена Значение: 50, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
3.1	РРП		В 5 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена	31.12.2019	25.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена" Отчет Союза "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.03.2019	19.03.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "О проведении демонстрационного экзамена" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 19.03.2019г. №1-243, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2019	29.04.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 59 дней. Подтверждающие документы: 1. "Электронный аттестат" Иное Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 29.04.2019г. №837-19/0804, приложен файл.
3.1.3	РРП		Проведение демонстрационного экзамена и оформление его результатов	30.06.2019	25.06.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет главного эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена" Отчет Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 25.06.2019г. №б/н, приложен файл.
3.2	РРП		В 7 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.
3.2.1	РРП		Определение перечня компетенций, площадок проведения, формирование графика проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	01.03.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.
3.2.2	РРП		Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена	01.03.2020	01.03.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Значение: 3.93, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Курской области" Иное Министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-Е60046-1/2, приложен файл. Предоставлена информация : 3.93 из 3.93.
5			Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Молодые профессионалы"" Иное Министерства Просвещения РФ от 15.12.2019г. №073-2019-Е60046-1/2, приложен файл. В 2019 года значение результата - 0
6			Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 0, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.
7			Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.
7.1	РРП		На базе ведущей профессиональной образовательной организации Курской области создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки	31.12.2021	31.12.2021	Скоморохова Н. И.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РРП		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	01.08.2019	04.07.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета" Заявка Администрации Курской области от 04.07.2019г. №01-09/647, приложен файл.
7.1.2	РРП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	29.02.2020	22.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.12.2019г. № 073-09-2020-794, приложен файл.
8			<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Значение: 1, на дату 31.12.2023</i>	31.12.2023	31.12.2023	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1	РРП		В Курской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2019	14.11.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о приеме" Приказ ОБПОУ "КГТТС" от 19.09.2019г. № 14/вк-к, приложен файл. 2. "Приказ об отчислении" Приказ ОБПОУ "КГТТС" от 14.11.2019г. №16/вк-к, приложен файл.
8.1.1	РРП		Разработка перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	15.06.2019	09.06.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заседания РУМО в системе СПО Курской области" Протокол РУМО от 09.06.2019г. №2, приложен файл. 2. "Перечень региональных примерных основных программ профессионального обучения" Перечень РУМО от 09.06.2019г. №Приложение 2, приложен файл.
8.1.2	РРП		Разработка новых программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	30.06.2019	28.06.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональная примерная основная программа профессионального обучения" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 28.06.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Региональная примерная основная программа по профессии 16675 Повар" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 26.06.2019г. №б/н, приложен файл.
8.1.3	РРП		Сформированы группы для обучения по новым программам профессионального обучения	15.09.2019	19.09.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о приеме" Приказ ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий и сервиса" от 19.09.2019г. №14/вк-к, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1.4	РРП		Организовано обучение по программам профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2019	14.11.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об отчислении" Приказ ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий и сервиса" от 14.11.2019г. №16/вк-к, приложен файл.
9			<i>Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0.078, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О прошедших обучение по программам повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) в 2019 году" Письмо Регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" в Курской области от 25.12.2019г. №92, приложен файл. Предоставлена информация : 0.078 из 0.078.
9.1			Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.05.2019	25.04.2019	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 25.04.2019г. №Р-52, приложен файл. 2. "Об утверждении методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 28.02.2019г. №Р-15, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.1	РНП		Разработка методических рекомендаций о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	01.03.2019	28.02.2019	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ, ОСНОВАННЫМ НА ОПЫТЕ СОЮЗА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕРТИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 28.02.2019г. №Р-15, приложен файл.
9.1.2	РНП		Разработка методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	01.05.2019	25.04.2019	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок" Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 25.04.2019г. №Р-52, приложен файл.
9.2			Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прошедших обучение по программам повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) в 2019 году" Письмо Регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" в Курской области от 25.12.2019г. №92, приложен файл.
9.2.1	РНП		Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	31.12.2019	31.12.2019	Харсеева О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прошедших обучение по программам повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) в 2019 году" Письмо Регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" в Курской области от 25.12.2019г. №92, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10			Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение: 0.533, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Харсеева О. В.	Информация по значению результата: В работе.
10.1	РРП		Не менее 90 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	25.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прошедших обучение по программам повышения квалификации преподавателей в 2019 году" Письмо Регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" в Курской области от 25.12.2019г. №92, приложен файл.
10.1.1	РРП		Сформированы списки педагогических работников, направляемых на обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	31.03.2019	31.03.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список прохождения преподавателями повышения квалификации" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 31.03.2019г. №б/н, приложен файл.
10.1.2	РРП		Организовано обучение педагогических работников по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс. Мониторинг обучения.	31.12.2019	01.12.2019	Чальцева Т. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Актуализированный список прохождения преподавателями повышения квалификации на 01.12.2019 прошли обучение 103 педагога" Иное ОГБУ ДПО КИРО от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1.3	РРП		Сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2019	25.12.2019	Скоморохова Н. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О прошедших обучение по программам повышения квалификации преподавателей в 2019 году" Письмо Регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" (Worldsills Russia) в Курской области от 25.12.2019г. №92, приложен файл.
10.2	РРП		Не менее 114 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2020	31.12.2020	Скоморохова Н. И.	В работе.
10.2.1	РРП		Сформированы списки педагогических работников, направляемых на обучение по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	15.03.2020	15.03.2020	Чальцева Т. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек

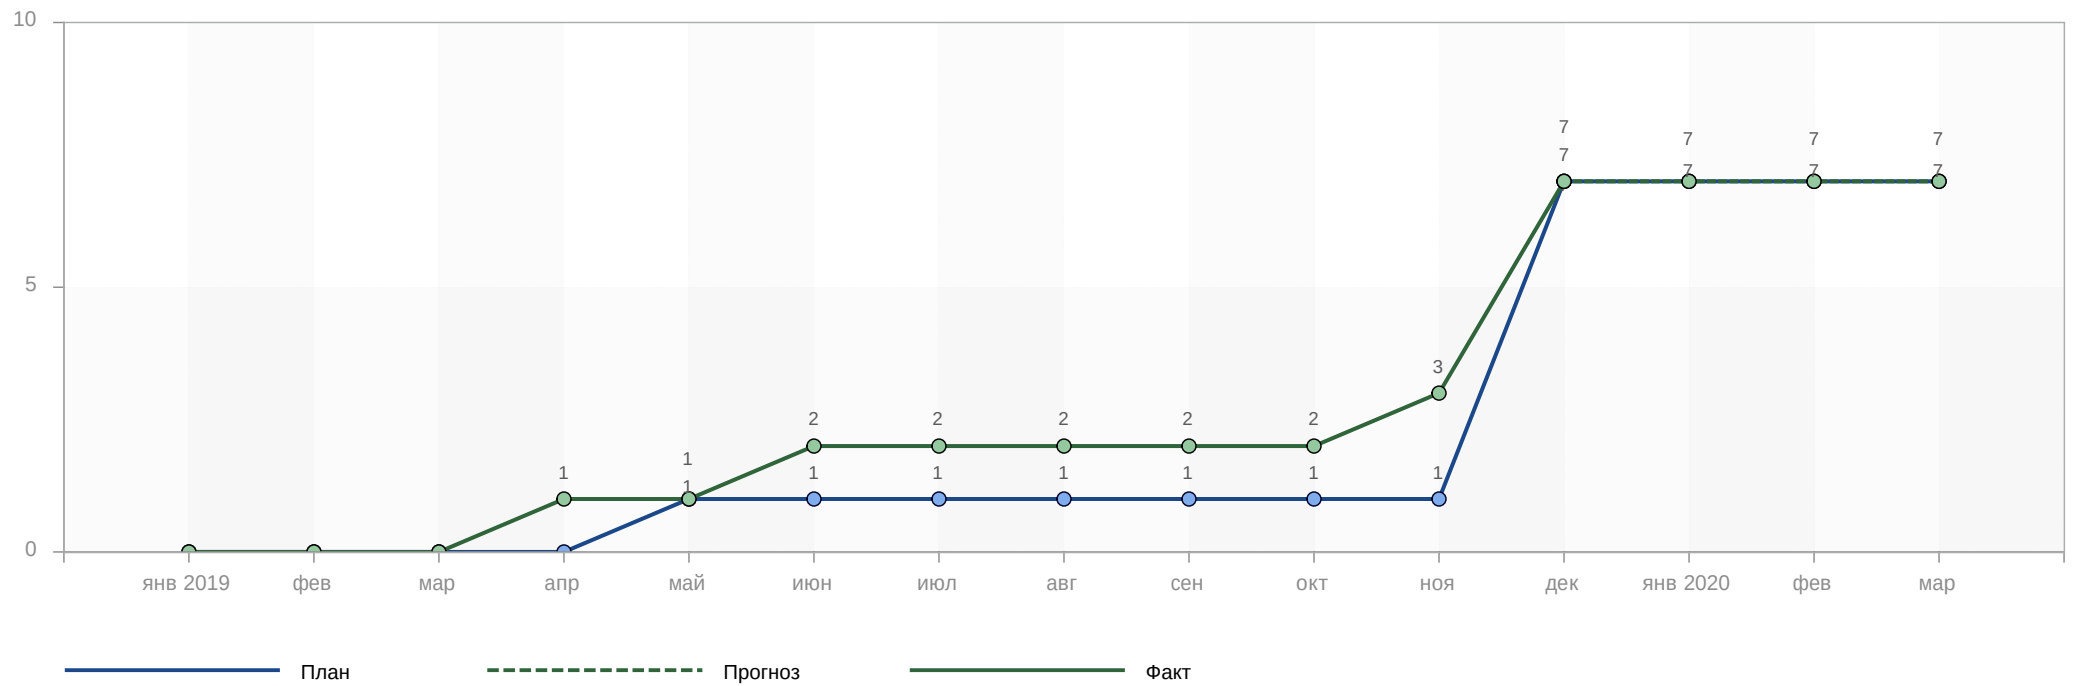


Рис. 1. "(Е6-38) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Курская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

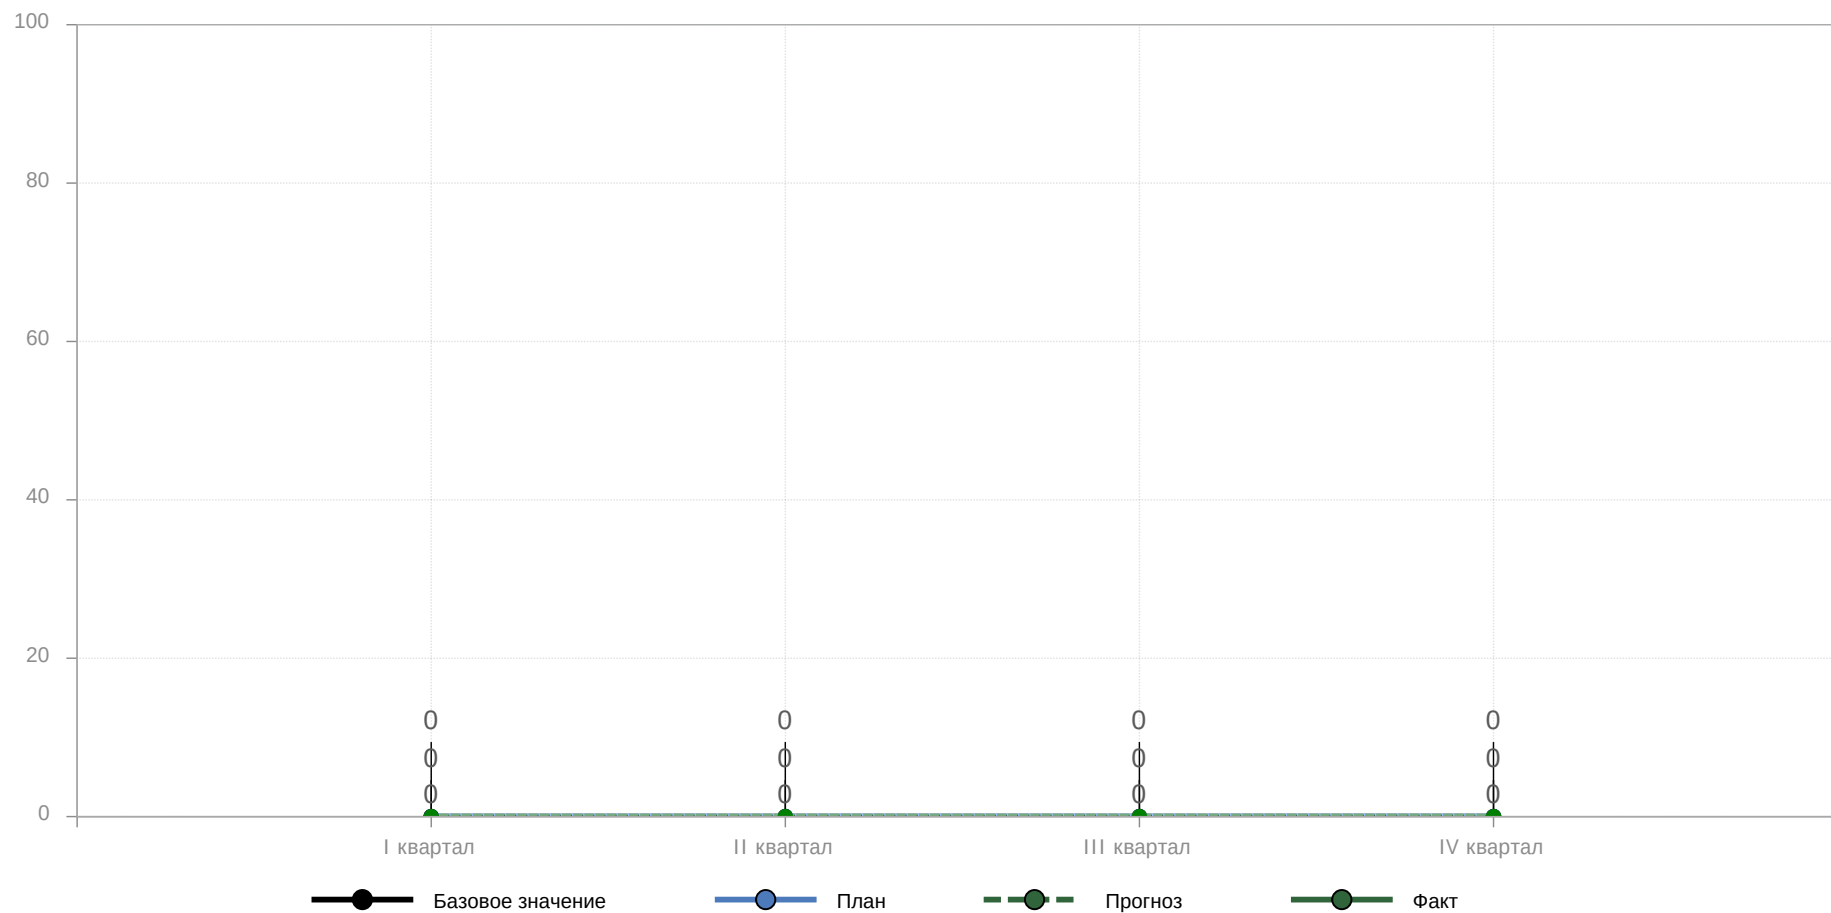


Рис. 1. Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Диаграмма достижения показателя

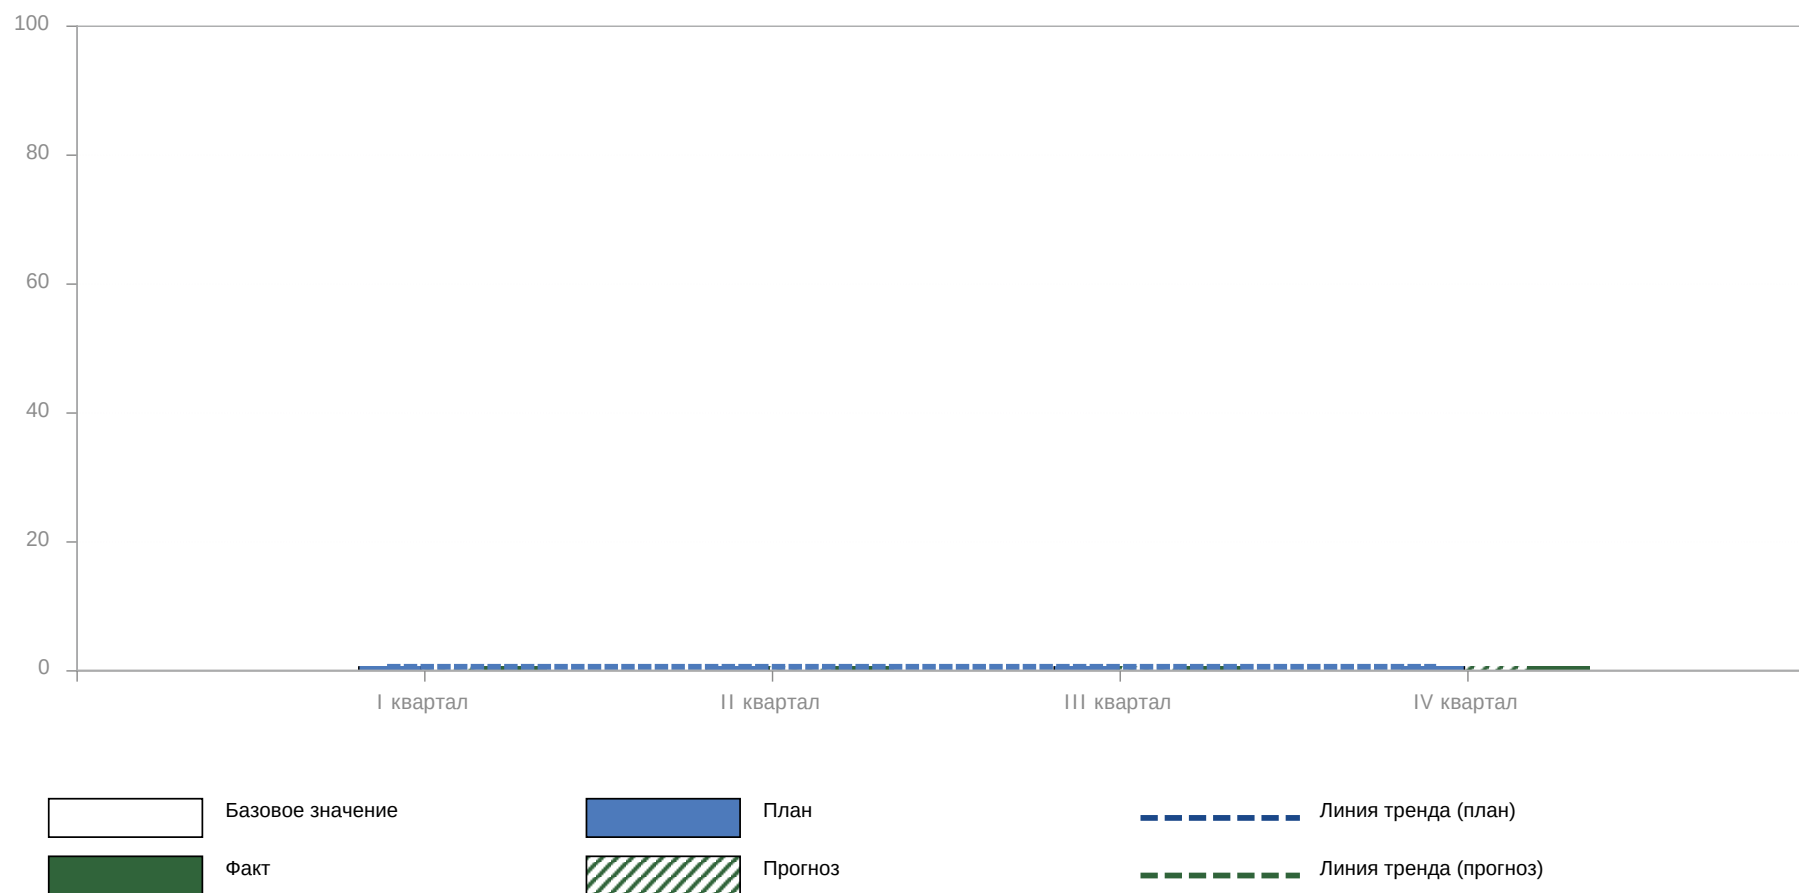


Рис. 2. Внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

График достижения показателя

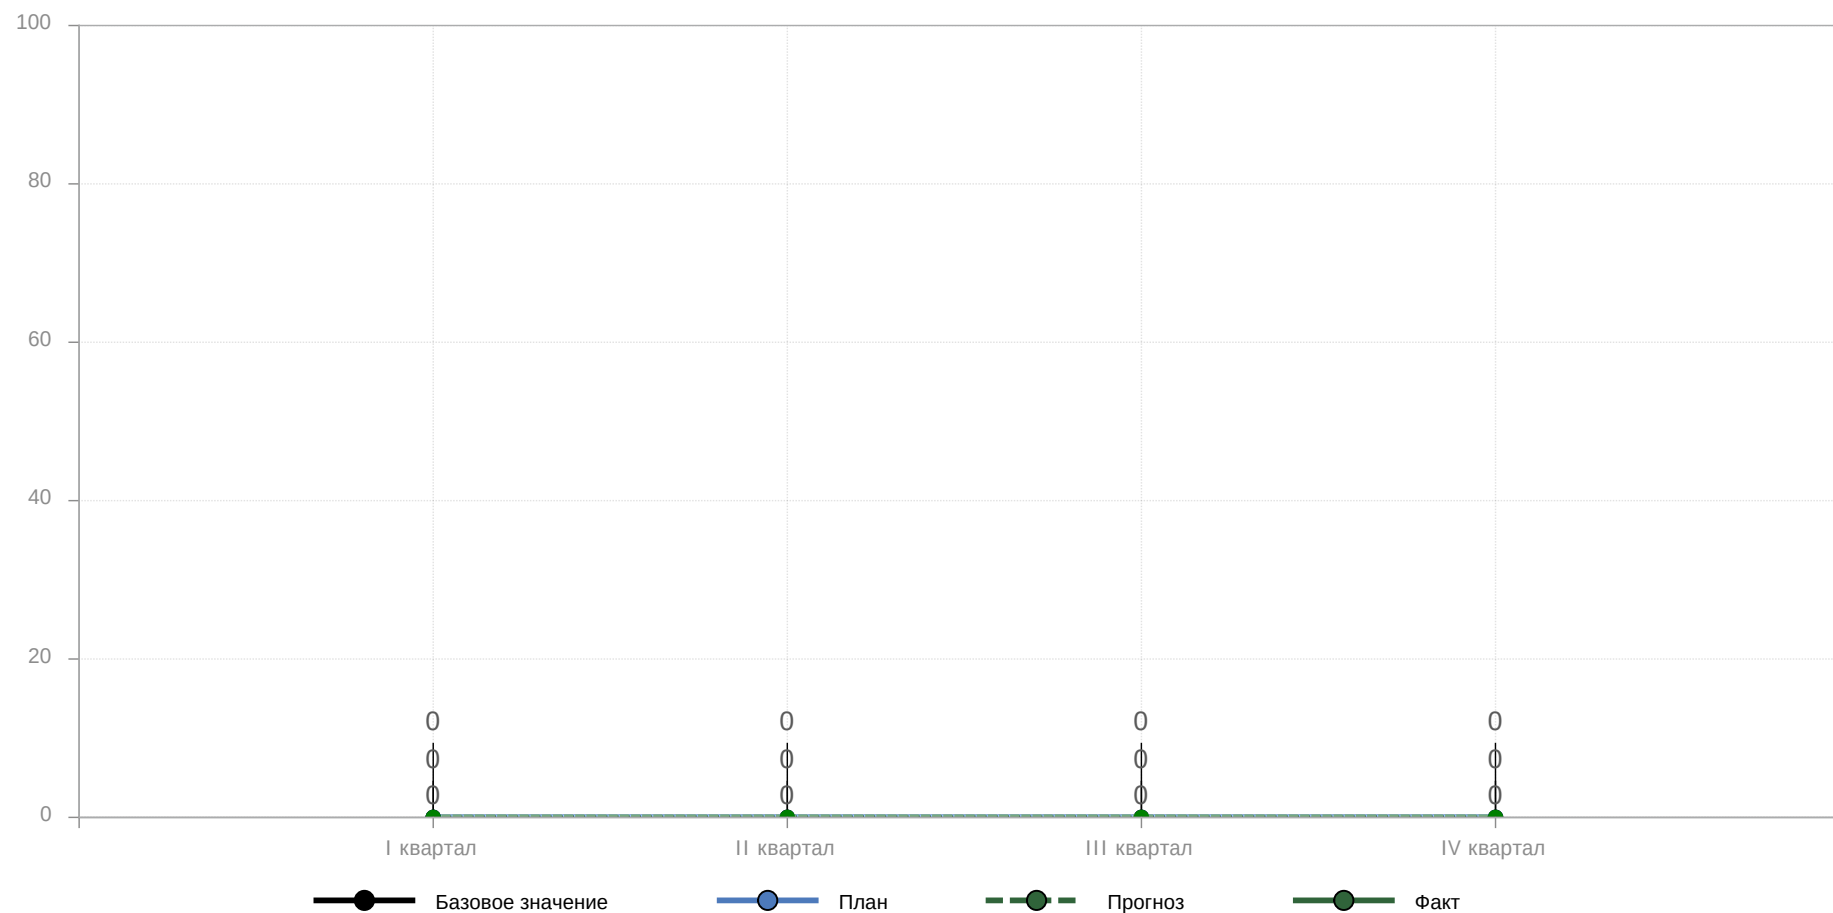


Рис. 3. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

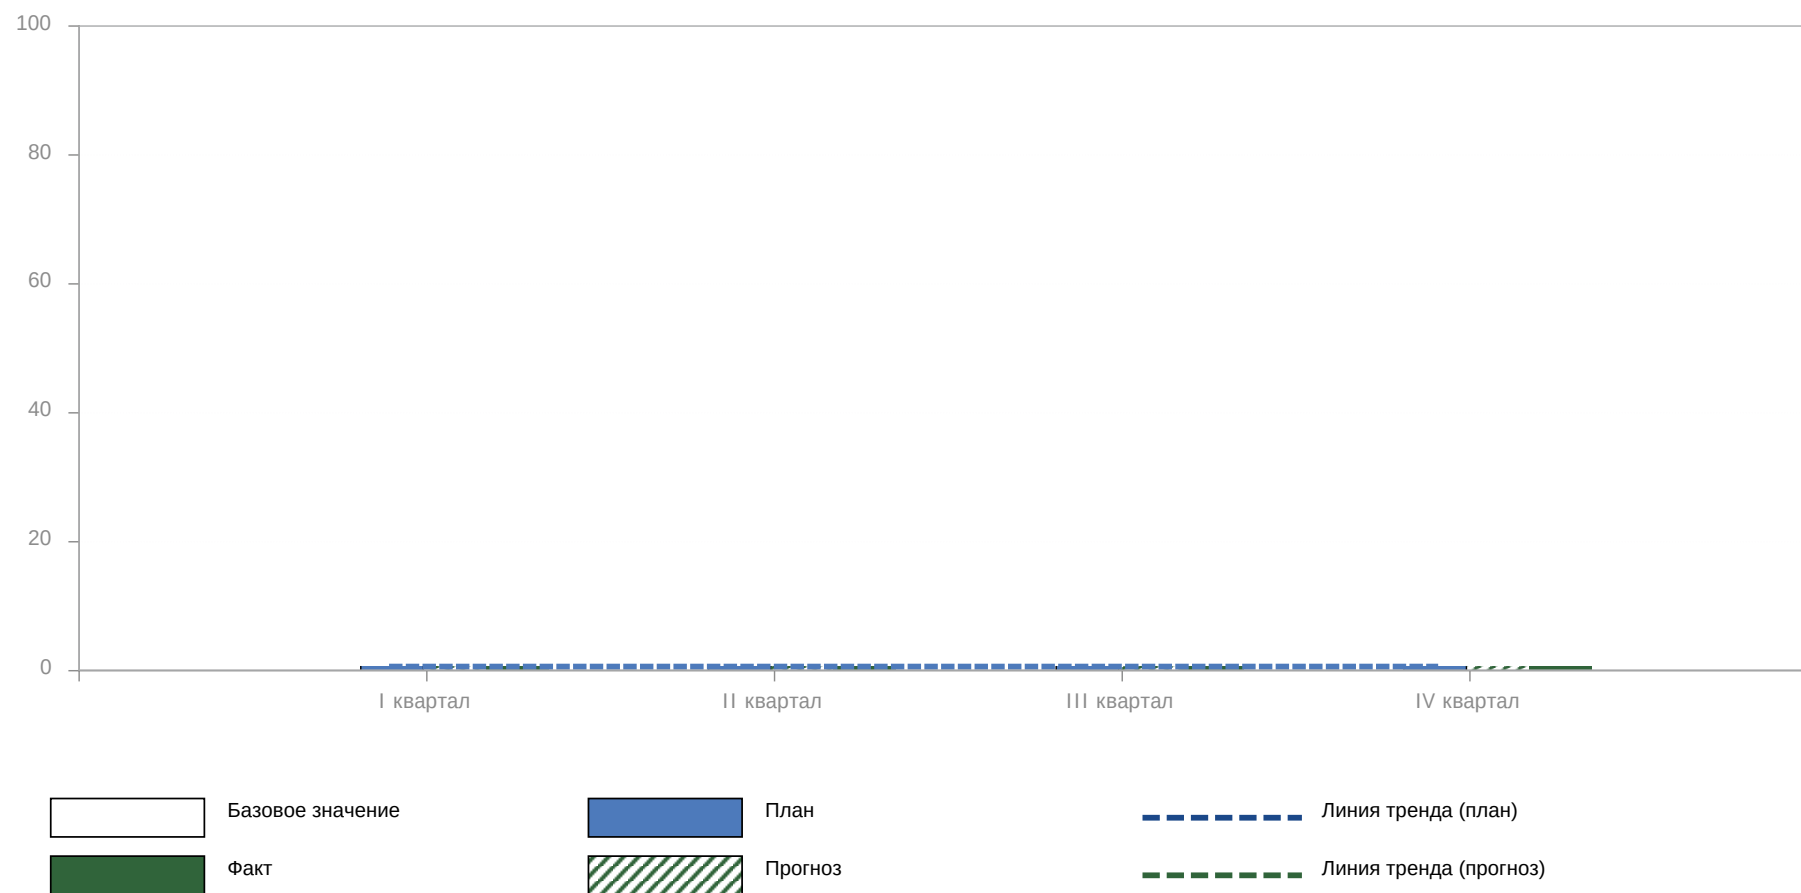


Рис. 4. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц

График достижения показателя

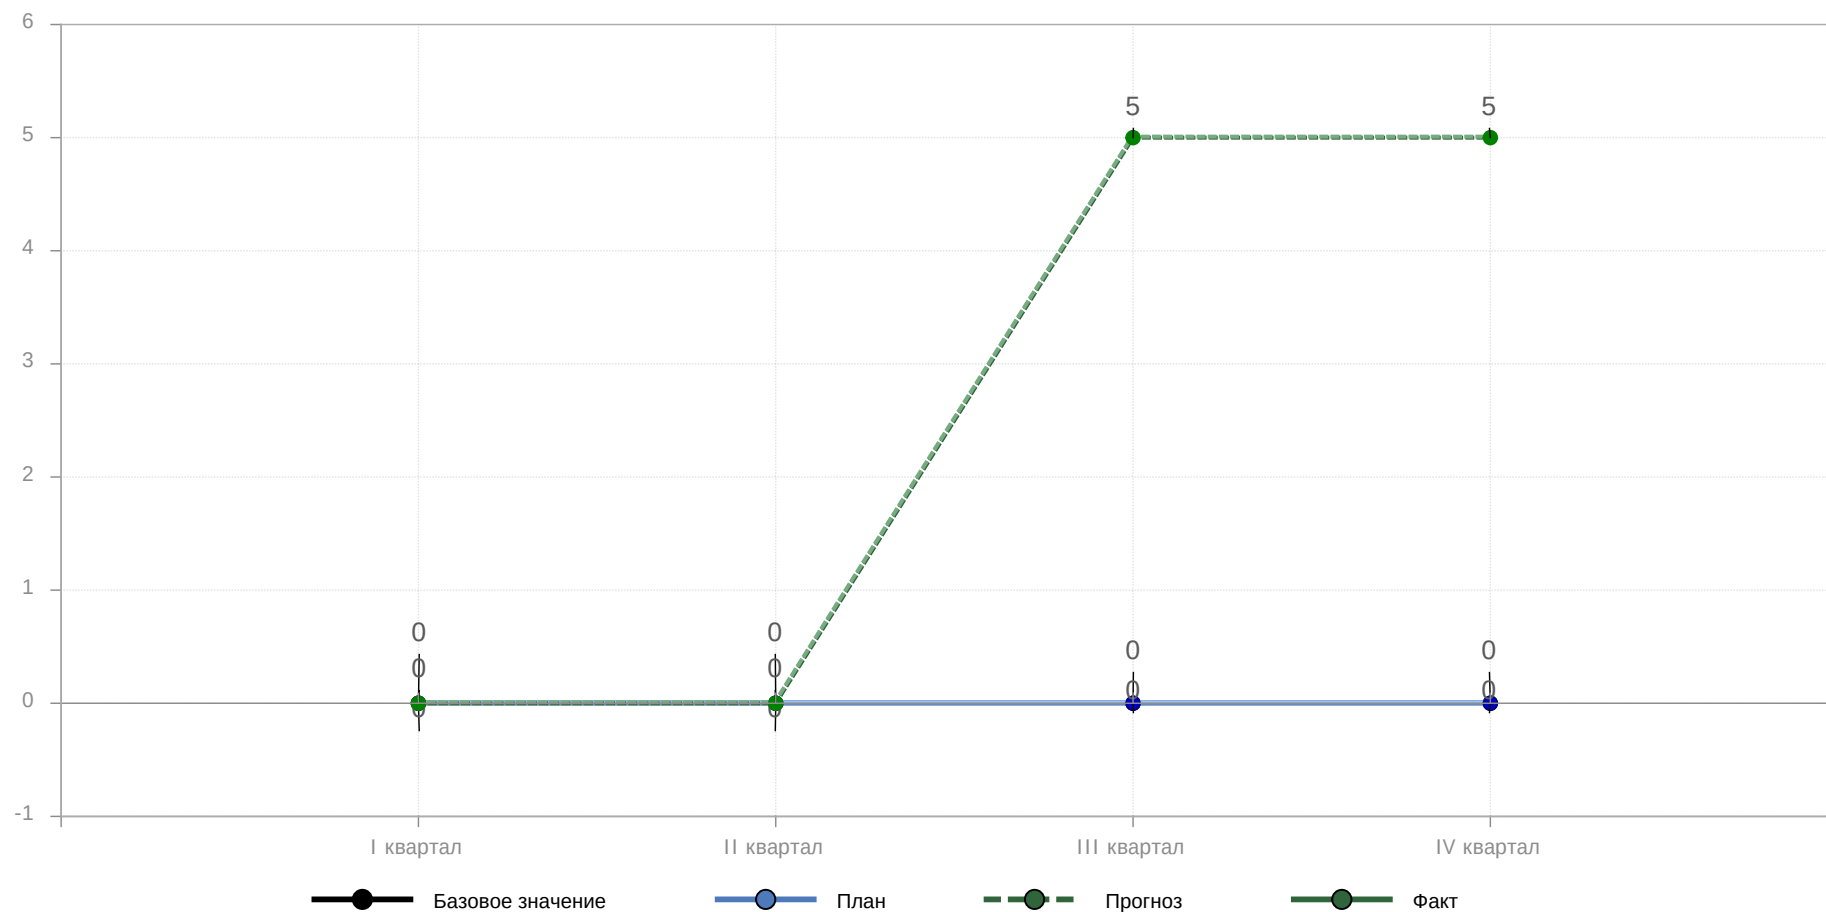


Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

Диаграмма достижения показателя

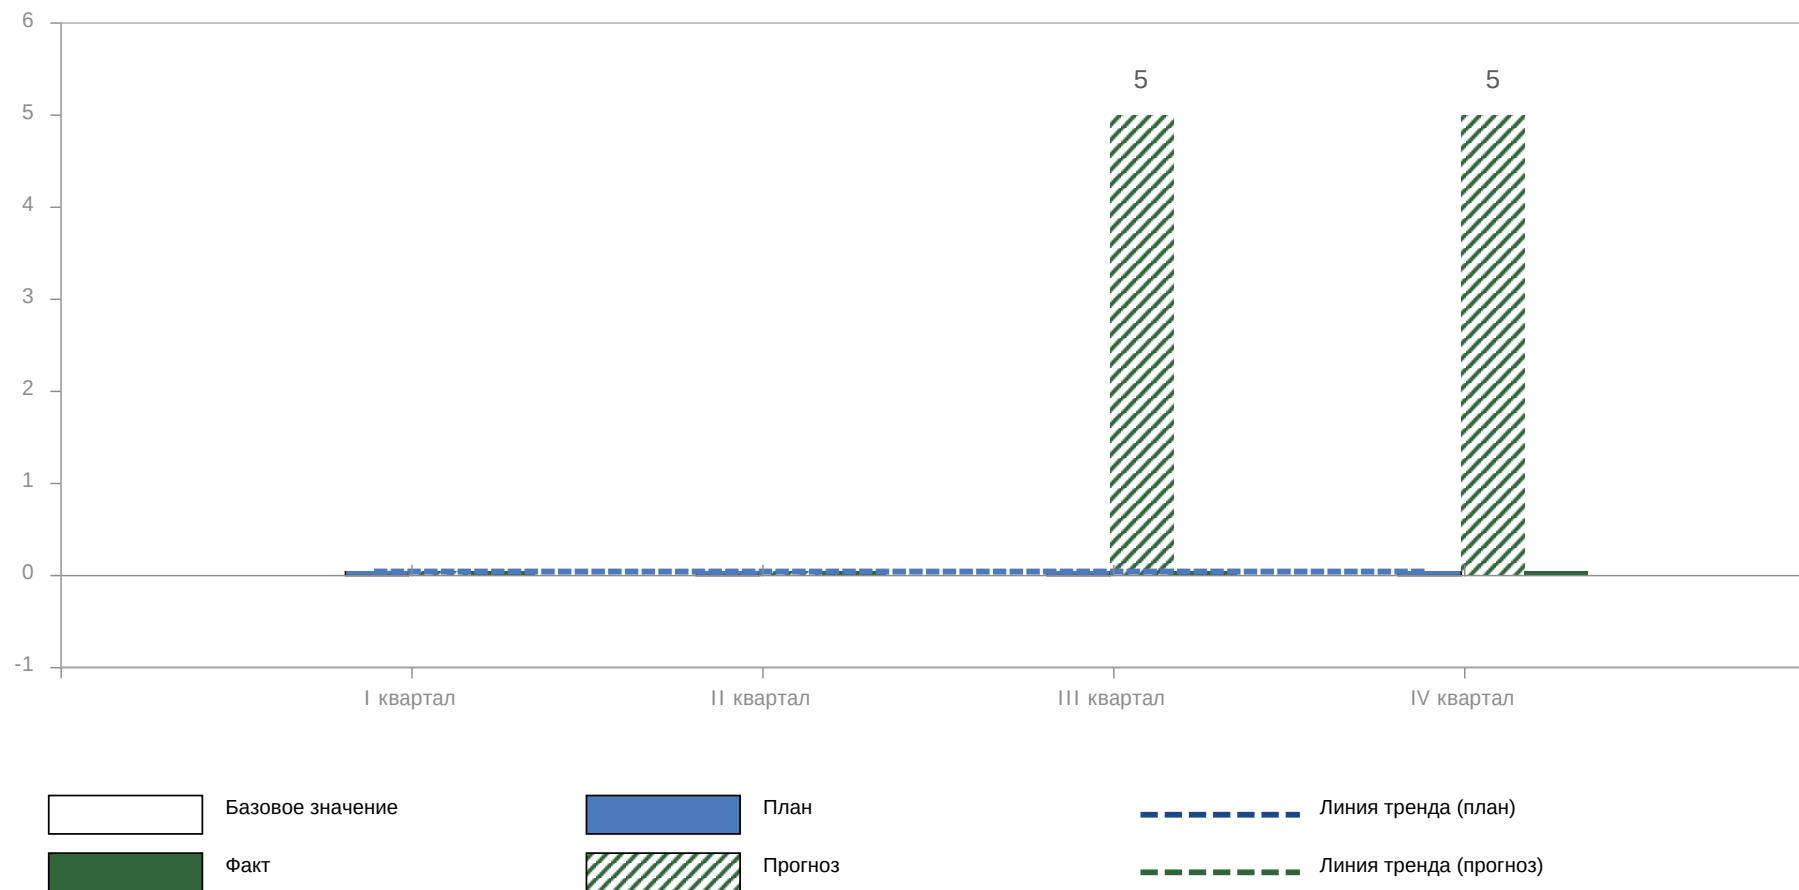


Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

График достижения показателя

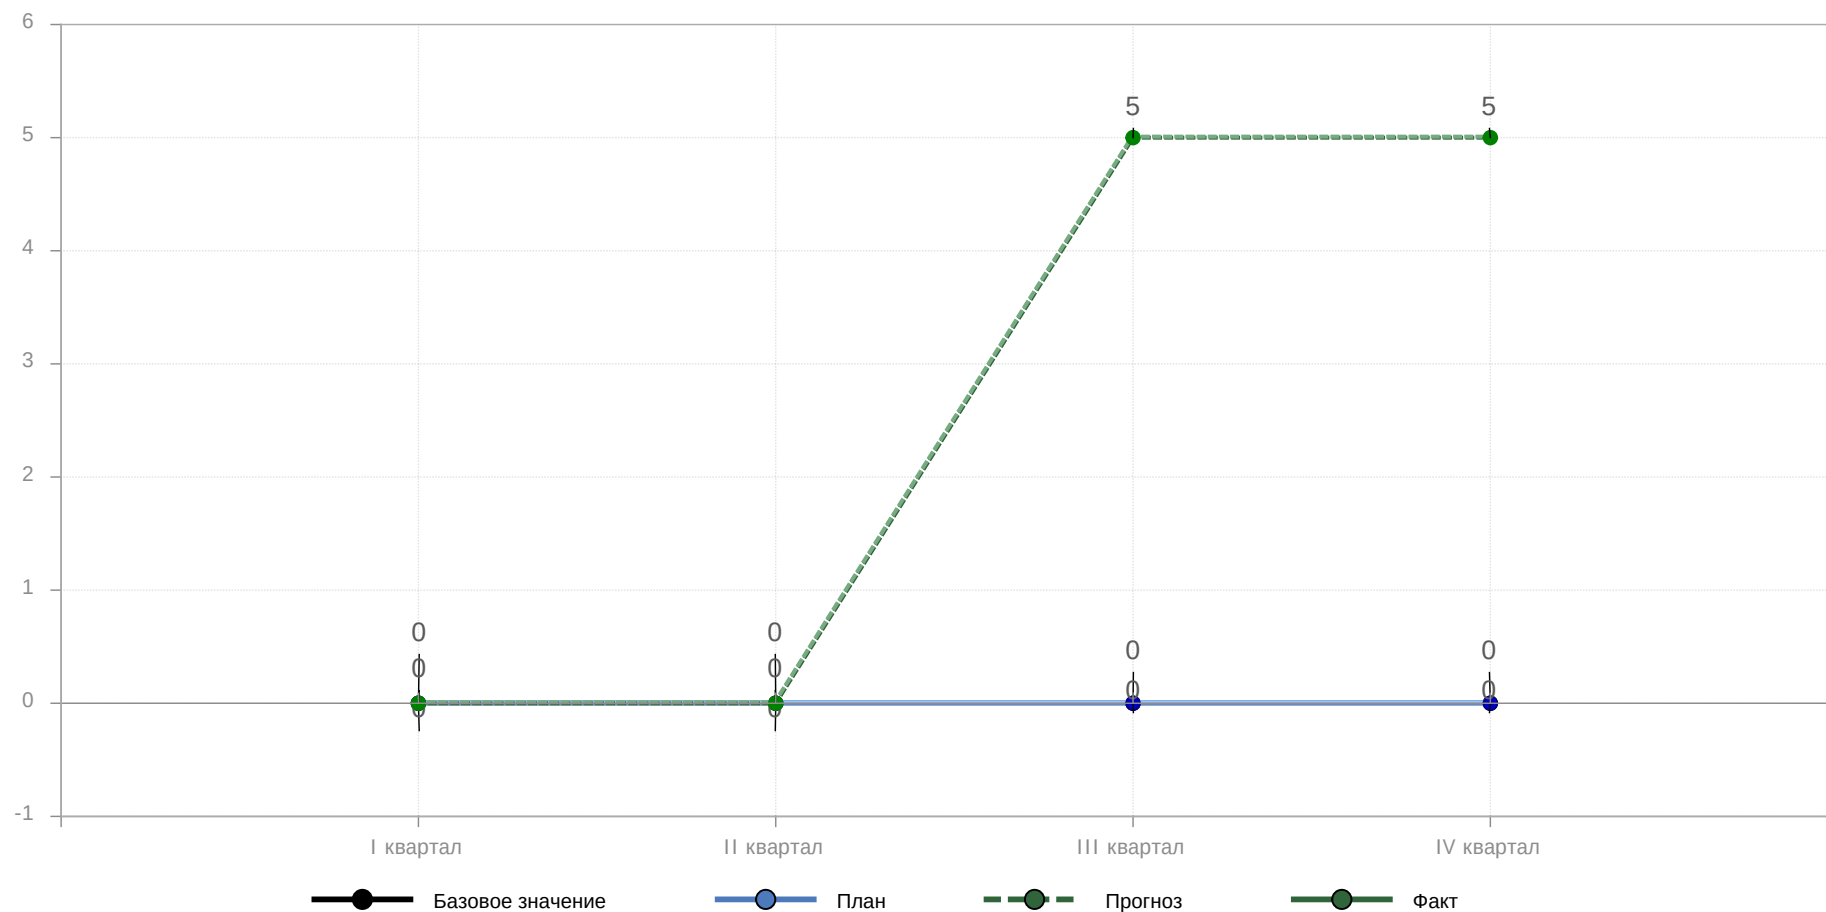


Рис. 7. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

Диаграмма достижения показателя

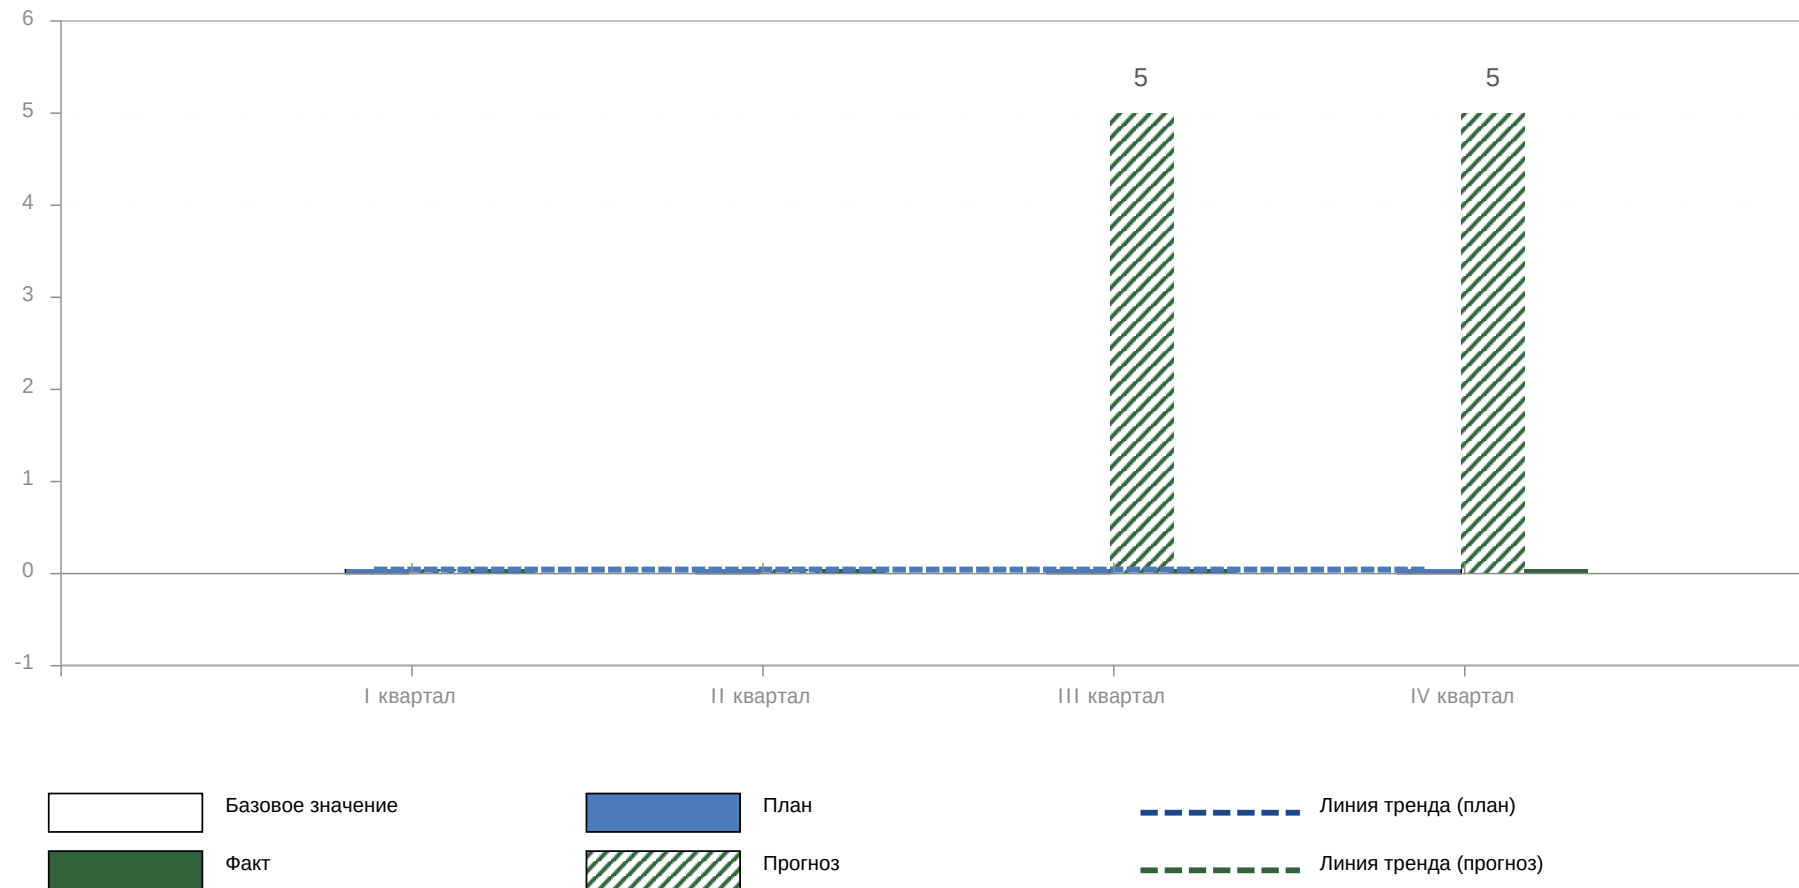


Рис. 8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

График достижения показателя

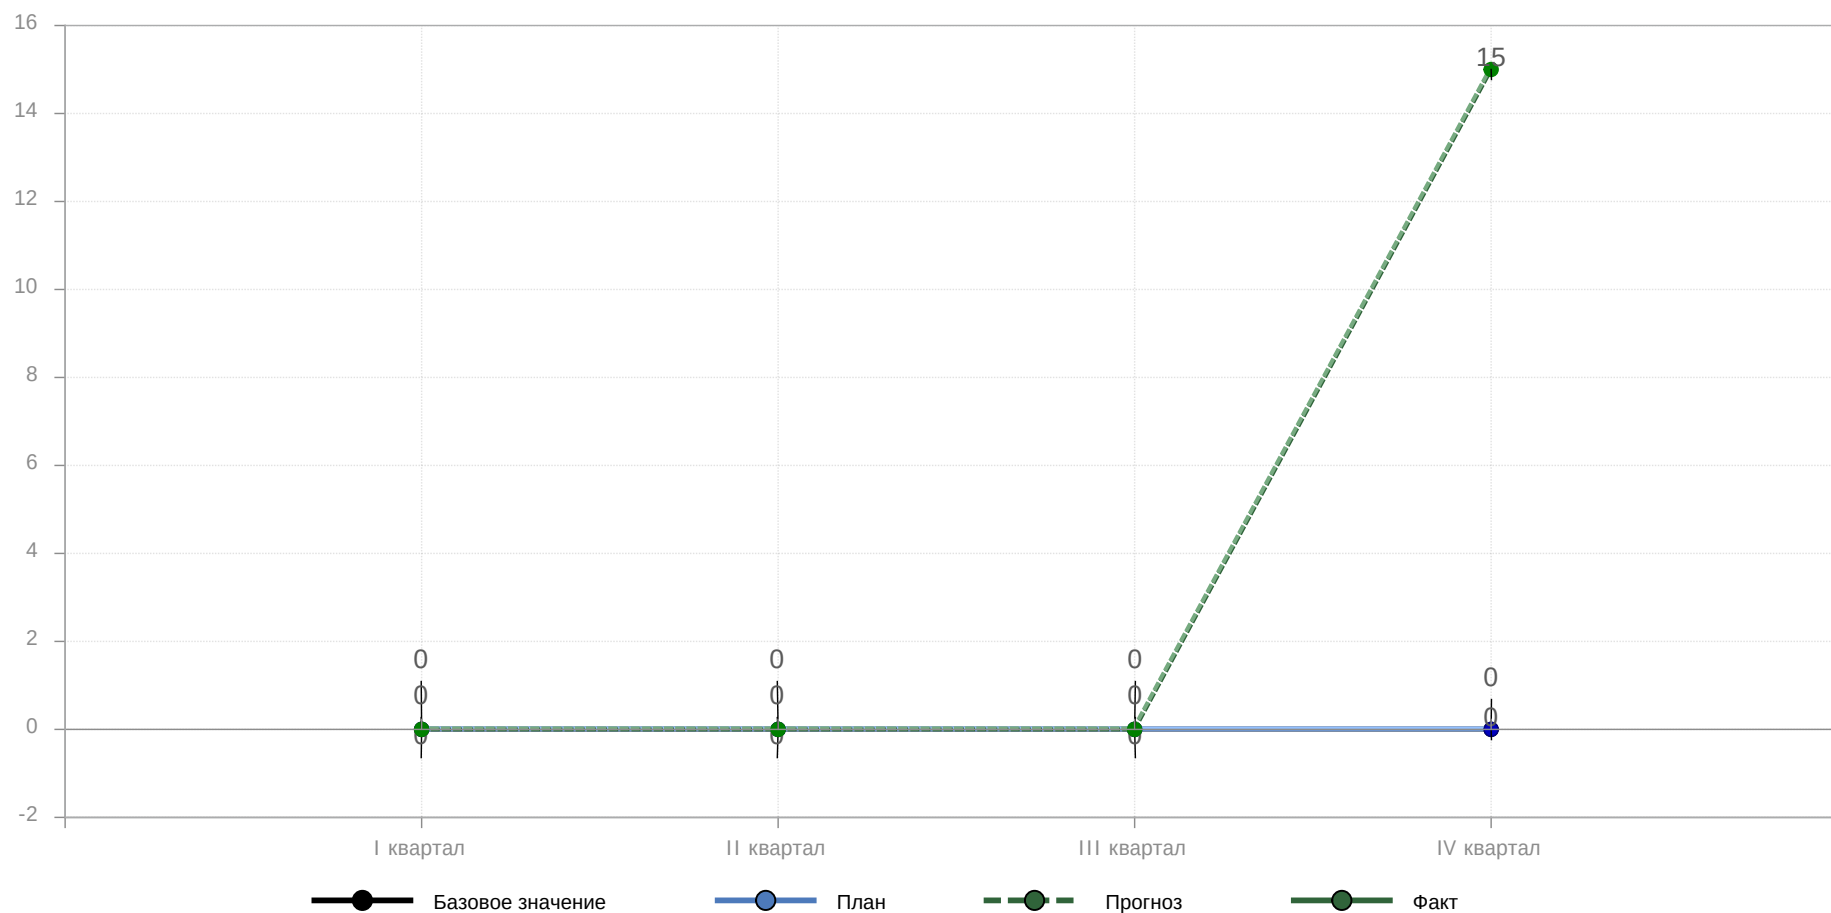


Рис. 9. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц

Диаграмма достижения показателя

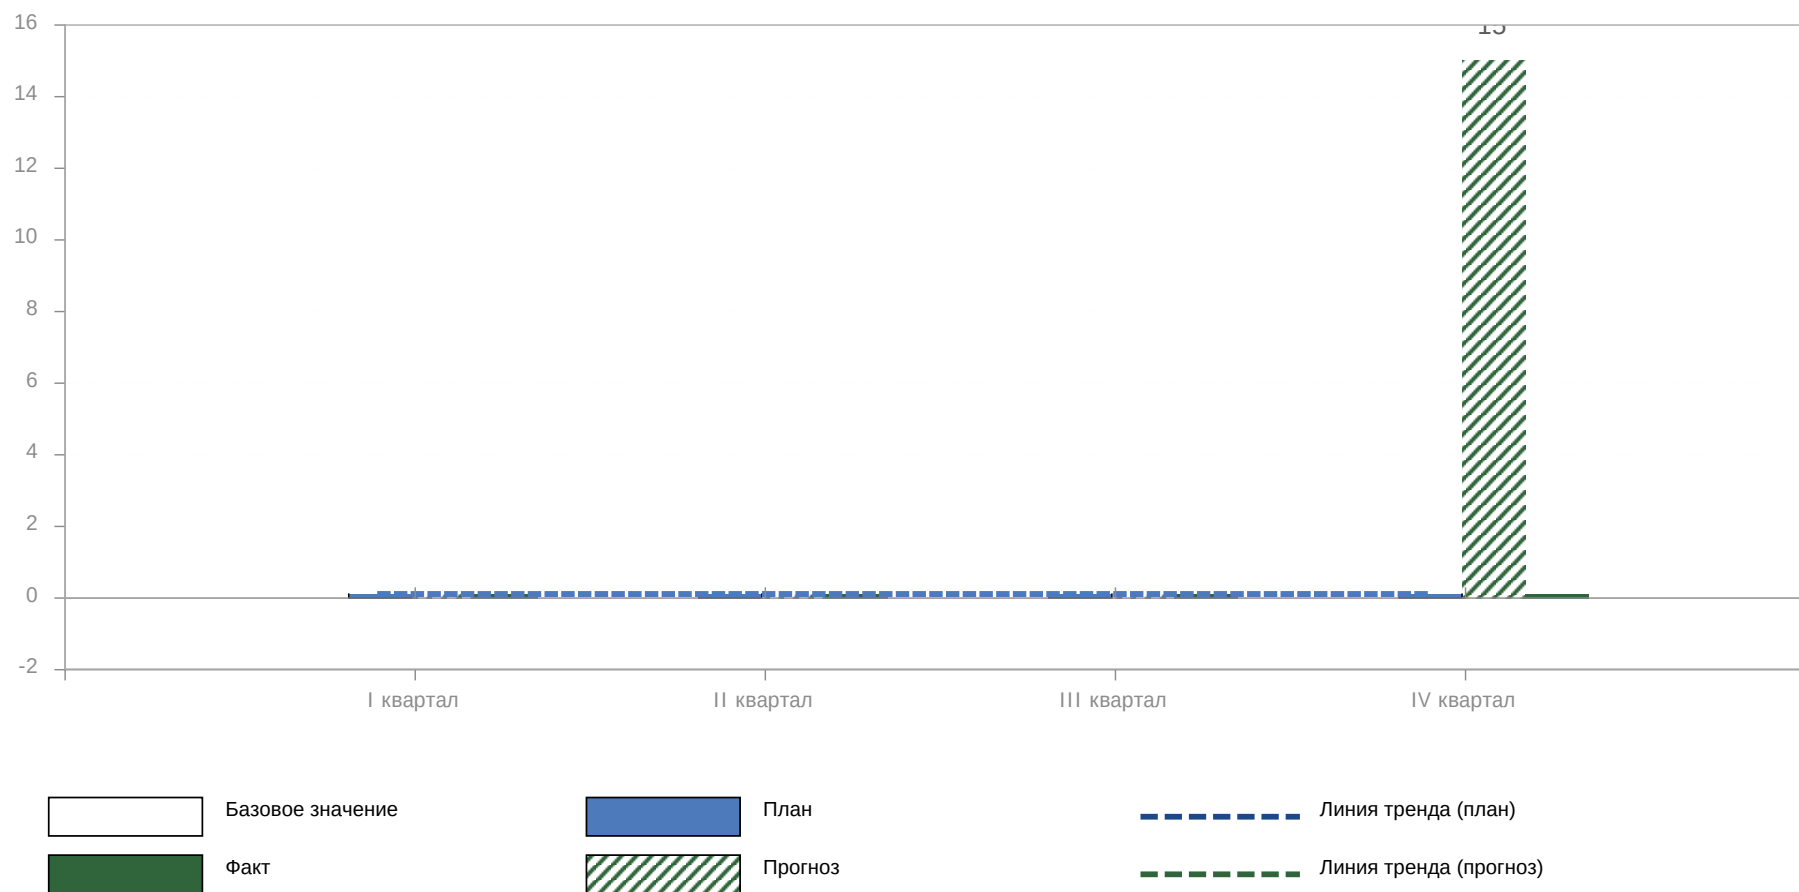


Рис. 10. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц
