

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД**  
*"(Е2-38) Успех каждого ребенка (Курская область)"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет                                                                           | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <i>Отсутствие отклонений</i>                                                      | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                      | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                        | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                        | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                        |

За период 2019-2020 годов в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" 78,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в регионе началось внедрение системы "Навигатор", которая официально будет запущена в течение 2021 года. Создан 1 технопарк Кванториум, 1 мобильный технопарк Кванториум, охват которых составил 14 тысяч детей. Более 40 тысяч детей стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория". В 2019 году был создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, охват которого составил более 4 тысяч детей.

Для более 2000 детей была обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 46% детей с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Было создано 13 904 новых места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 30 муниципальных образованиях Курской области.

## 1. Ключевые риски

| № п/п                      | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |        |                                                        |                        |                      |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование целей и показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |        |        |        | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                        | I                     | II     | III    | IV     |                                 |                    |                                                                                                                                                                                     |
| 1     |    | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Процент                     | 78                                     | 78                    | 78     | 78     | 78.5   | 78.5                            | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя" Отчет ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2149, приложен файл. 125 500 детей из 159 800 охвачены дополнительным образованием |
| 2     |   | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек              | 8                                      | 8                     | 8      | 8      | 14     | 14                              | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Отчеты по охвату детей" Иное Образовательных организаций от 31.12.2020г. №6/н, приложен файл.                                                         |
| 3     |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных                                                                                                                                                                                                                           | Миллион человек             | 0.0286                                 | 0.0286                | 0.0286 | 0.0286 | 0.0425 | 0.0425                          | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Сведения о результатах участия " Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2144, указана ссылка.                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование целей и показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                        | I                     | II | III | IV |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |   | аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                        |                       |    |     |    |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     |   | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"                                                                                                                         | Тысяча человек              | 6.5                                    | 0                     | 0  | 0   | 12 | 12                              | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл. Дополнительным соглашением от 03.02.2020 № 073-2019-Е20047-1/6 прекращена реализация показателя. В годовом отчете отображается информация по причине отсутствия показателя в отчете за январь 2020 года. Фактическое значение установлено в соответствии с плановым для избежания указания рисков по показателю.                                                  |
| 5     |  | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | Единица                     | 1                                      | 1                     | 1  | 1   | 1  | 1                               | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "О создании регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей" Приказ ОБОУ "Лицей-интернат №1" от 19.06.2019г. №347, указана ссылка. 2. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл. Создание Центра в субъекте было реализовано в 2019 году, дополнительным соглашением создание Центров в 2020 году не предусмотрено. Охват детей в процессе функционирования Центра в 2020 году составил 4153 чел. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2020 год  
Всего: 143 845,33 тыс. руб

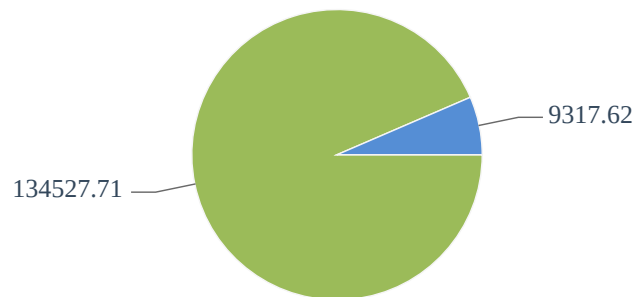

Сводный бюджет МО  
на 2020 год  
Всего: 103 923,21 тыс. руб

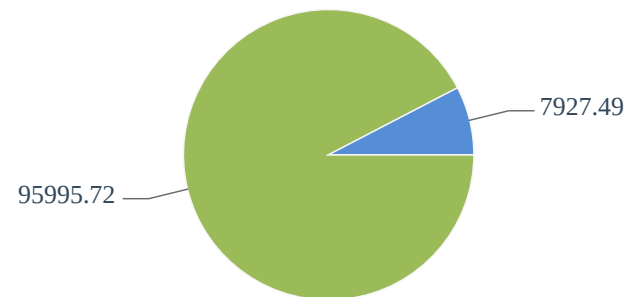

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                                 | 10          |

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий                                                                           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                     | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |                                                                                       |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                   | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                 | 10                                                                                    |
| 1        |        | (01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 100 967,27                                             | 100 967,27                     | 100 967,27                          | 15 131,03                              | 92 792,71              | 91,90                             |                                                                                       |
| 1.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                     | 100 967,27                                             | 100 967,27                     | 100 967,27                          | 15 131,03                              | 92 792,71              | 91,90                             |                                                                                       |
| 1.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                | 99 277,54                                              | 99 277,54                      | 99 277,54                           | 15 131,03                              | 91 239,48              | 91,90                             | В результате исполнения контрактов образовалась экономия. Контракты исполнены на 100% |
| 1.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                    | 82 796,70                                              | 82 796,70                      | 82 796,70                           | 0,00                                   | 76 108,45              | 91,92                             |                                                                                       |
| 1.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                   | 84 486,43                                              | 84 486,43                      | 84 486,43                           | 0,00                                   | 77 661,68              | 91,92                             | В результате исполнения контрактов образовалась экономия. Контракты исполнены на 100% |
| 1.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |                                                                                       |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                                                    | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий                                             |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |                                                         |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                 | 10                                                      |
| 2        |        | (04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 19 436,78                                              | 19 436,78                       | 19 436,78                           | 0,00                                   | 18 334,04              | 94,33                             |                                                         |
| 2.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                      | 19 436,78                                              | 19 436,78                       | 19 436,78                           | 0,00                                   | 18 334,04              | 94,33                             |                                                         |
| 2.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                 | 12 633,91                                              | 12 633,91                       | 12 633,91                           | 0,00                                   | 11 917,13              | 94,33                             | Сложившаяся экономия в результате исполнения контрактов |
| 2.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                     | 12 633,91                                              | 12 633,91                       | 12 633,91                           | 0,00                                   | 11 917,13              | 94,33                             |                                                         |
| 2.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                    | 19 436,78                                              | 19 436,78                       | 19 436,78                           | 0,00                                   | 18 334,04              | 94,33                             | Сложившаяся экономия в результате исполнения контрактов |
| 2.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |                                                         |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                            | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий                                                                           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                              | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |                                                                                       |
| 1        | 2      | 3                                                                                                            | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                                 | 10                                                                                    |
| 3        |        | (12) Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 31 933,88                                              | 31 933,88                      | 31 933,88                           | 31 371,10                             | 31 371,10              | 98,24                             |                                                                                       |
| 3.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                              | 31 933,88                                              | 31 933,88                      | 31 933,88                           | 31 371,10                             | 31 371,10              | 98,24                             |                                                                                       |
| 3.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                         | 31 933,88                                              | 31 933,88                      | 31 933,88                           | 31 371,10                             | 31 371,10              | 98,24                             | В результате исполнения контрактов образовалась экономия. Контракты исполнены на 100% |
| 3.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований             | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                              |                                                                                       |
| 3.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                              |                                                                                       |
| 3.2      |        | внебюджетные источники                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                              |                                                                                       |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                 | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                                   | 152 337,93                                             | 152 337,93                     | 152 337,93                          | 46 502,13                              | 142 497,85             | 93,54                             |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                                   | 152 337,93                                             | 152 337,93                     | 152 337,93                          | 46 502,13                              | 142 497,85             | 93,54                             |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                                   | 143 845,33                                             | 143 845,33                     | 143 845,33                          | 46 502,13                              | 134 527,71             | 93,52                             |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                                   | 95 430,61                                              | 95 430,61                      | 95 430,61                           | 0,00                                   | 88 025,58              | 92,24                             |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                                   | 103 923,21                                             | 103 923,21                     | 103 923,21                          | 0,00                                   | 95 995,72              | 92,37                             |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                | Достижение контрольных точек                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |    | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Значение: 13,9040 Дата: 31.12.2020                                                                                                   |    |
| 2     |    | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Значение: 31,0380 Дата: 31.12.2021                                                                                                   |    |
| 3     |    | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020                                                                         |    |
| 4     |    | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"<br>Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020 |                                                                                       |
| 5     |    | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"<br>Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021 |    |
| 6     |    | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом<br>Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2020                                                  |    |
| 7     |   | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом<br>Значение: 28,0000 Дата: 31.12.2021                                                  |  |
| 8     |  | Созданы детские технопарки "Кванториум"<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 9     |  | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий<br>Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020                                                                          |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Достижение контрольных точек                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    |    | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 11    |    | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020 |                                                                                       |
| 12    |    | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020                                               |                                                                                       |
| 13    |    | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 14    |    | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)<br>Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 15    |    | В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 16    |   | В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 17    |  | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                         |  |
| 18    |  | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества<br>Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                         |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Достижение контрольных точек                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       |  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024 |  1 |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    |                               |    | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Значение: 13,9040 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Приказы о зачислении детей на новые созданные места" Приказ Образовательных организаций от 31.12.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Текущие мероприятия и контрольные точки исполнены.<br>Приказы о зачислении детей на новые места приложены.<br><br>Предоставлена информация : 13.904 из 13.904. |
| 1.1.  | РРП                           |   | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 31.12.2020      | 21.12.2019   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства просвещения РФ от 21.12.2019г. №073-09-2020-260, приложен файл.                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1 | РРП                           |  | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2020      | 21.12.2019   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области"                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                               |        | информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"                                                |                 |              |                           | Соглашение министерства Просвещения РФ от 21.12.2019г. №073-09-2020-260, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.  | РРП                           |        | Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 31.12.2020      | 01.09.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Приказы о зачислении детей на новые созданные места" Иное Образовательных организаций Курской области от 31.12.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Подтверждающие сведения готовы. В связи с проблемой загрузки подтверждающих документов, размещена ссылка на архив с приказами о зачислении детей на новые созданные места.                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.1 | РРП                           |        | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей<br>Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей                                                                                                                       | 01.03.2020      | 01.06.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 13.05.2020г. №ИМЗ-2020-000930, указана ссылка.<br>2. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 13.05.2020г. №ИМЗ-2020-000925, указана ссылка.<br>3. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 13.05.2020г. №ИМЗ-2020-000926, указана ссылка. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                              | <p>4. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 13.05.2020г. №ИМЗ-2020-000929, указана ссылка.</p> <p>5. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Куркой области от 13.05.2020г. №ИМЗ-2020-000903, указана ссылка.</p> <p>6. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 06.05.2020г. №ИМЗ-2020-000891, указана ссылка.</p> <p>7. "Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ" Извещение Малых закупок Курской области от 30.04.2020г. №ИМЗ-2020-000881, указана ссылка.</p> |
| 1.2.2    | РРП                              |        | <p>Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения</p> <p>Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения</p>                                                                    | 25.08.2020      | 25.08.2020   | Егорова М. В.                | <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Товарные накладные, акты приема-передачи" Иное Муниципальных образований Курской области от 25.08.2020г. №б/н, указана ссылка.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.3    | РРП                              |        | <p>Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места</p> | 25.08.2020      | 14.08.2020   | Егорова М. В.                | <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Список педагогов дистанционного (заочного) этапа повышения квалификации" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 31.07.2020г. №04.1-07/9180, приложен файл.</p> <p>2. "Регистрация участников очного этапа повышения квалификации" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 14.08.2020г. №04.1-07/9950,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                              | приложен файл.<br>3. "Приложение к письму 04.1-07/9180 от 31.07.2020"<br>Иное Комитета образования и науки Курской области от<br>31.07.2020г. №б/н, приложен файл.<br>4. "Приложение к письму 04.1-07/9950 от 14.08.2020"<br>Иное Комитета образования и науки Курской области от<br>14.08.2020г. №б/н, приложен файл.                       |
| 1.2.4    | РРП                              |        | <i>Проведен мониторинг оснащенности<br/>         средствами обучения и приведения<br/>         площадок в соответствие с<br/>         требованиями, предъявляемыми к<br/>         организации дополнительного<br/>         образования детей</i> Проведен<br>мониторинг оснащенности средствами<br>обучения и приведения площадок в<br>соответствие с требованиями,<br>предъявляемыми к организации<br>дополнительного образования детей | 30.08.2020      | 11.06.2020   | Тулиёва О. Л.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О проведении мониторинга" Письмо Комитета<br>образования и науки Курской области от 11.06.2020г. №<br>04.1-07/6772, приложен файл.<br>2. "Приложение к письму о проведении мониторинга"<br>Иное Комитета образования и науки Курской области от<br>11.06.2020г. №04.1-07/6772, приложен файл. |
| 1.2.5    | РРП                              |        | <i>Завершение набора детей,<br/>         обучающихся по образовательным<br/>         программам на новых местах</i><br>Завершение набора детей, обучающихся<br>по образовательным программам на<br>новых местах                                                                                                                                                                                                                          | 01.09.2020      | 01.09.2020   | Тулиёва О. Л.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Приказы о зачислении детей" Иное Комитета<br>образования и науки Курской области от 01.09.2020г. №<br>б/н, указана ссылка.                                                                                                                                                                    |
| 1.2.6    | РРП                              |        | <i>Утвержден медиаплан<br/>         информационного сопровождения<br/>         создания новых мест<br/>         дополнительного образования детей</i><br>Утвержден медиаплан<br>информационного сопровождения<br>создания новых мест<br>дополнительного                                                                                                                                                                                  | 15.01.2020      | 30.09.2019   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении медиаплана информационного<br>сопровождения создания новых мест дополнительного<br>образования детей в Курской области" Приказ Комитета<br>образования и науки Курской области от 30.09.2019г. №1<br>-1083, приложен файл.                                                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения



| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                             |
|       |                               |    | образования детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                           |                                                                                                                                                                             |
| 1.2.7 | РРП                           |    | Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в случае необходимости) Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в случае необходимости)                                                  | 25.08.2020      | 25.08.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Лицензии образовательных учреждений" Иное Комитета образования и науки Курской области от 25.08.2020г. №б/н, указана ссылка. |
| 2.    |                               |    | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Значение: 31,0380 Дата: 31.12.2021                                                                                                                                         | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Мероприятия на этапе исполнения.<br><br>Предоставлена информация : 31.038 из 31.038.                   |
| 2.1.  | РРП                           |   | Созданы 31 038 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей<br>Созданы 31 038 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Тулиёва О. Л.             | В работе.<br>Текущие мероприятия на этапе исполнения. Отклонения отсутствуют.                                                                                               |
| 2.1.1 | РРП                           |  | Согласован и утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей, перечень организаций, в которых создаются новые места                                                                                                                                                                              | 01.12.2020      | 15.08.2019   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в                            |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                  |        | дополнительного образования детей<br>Согласован и утвержден план-график<br>создания новых мест дополнительного<br>образования детей, перечень<br>организаций, в которых создаются<br>новые места дополнительного<br>образования детей                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                              | Курской области"" Постановление Администрации<br>Курской области от 15.08.2019г. №764-па, приложен<br>файл.                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.2    | РРП                              |        | Сформирован и перечень средств<br>обучения и воспитания для создания<br>новых мест дополнительного<br>образования детей<br>(инфраструктурный лист)<br>Сформирован и перечень средств<br>обучения и воспитания для создания<br>новых мест дополнительного<br>образования детей (инфраструктурный<br>лист)                                                                                                                                                                                                  | 20.12.2020      | 20.12.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Вебинар для региональных координаторов" Иное<br>Академии Минпросвещения России от 19.11.2020г. №б/н,<br>указана ссылка.<br>Перечень средств обучения и воспитания в соответствии с<br>изменениями будет сформирован в системе управления<br>проектной деятельности. |
| 2.1.3    | РРП                              |        | средств, предусмотренных в<br>консолидированном бюджете Курской<br>области, на финансовое обеспечение<br>деятельности по реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных программ на<br>созданных местах дополнительного<br>образования по направлениям<br>расходов Представлена информация<br>об объемах средств,<br>предусмотренных в<br>консолидированном бюджете<br>Курской области, на финансовое<br>обеспечение деятельности по<br>реализации дополнительных<br>общеобразовательных программ на | 30.11.2020      | 30.11.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Выписка" Иное Комитета образования и науки<br>Курской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.                                                                                                                                                                  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                               |    | дополнительного образования по направлениям расходов                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4 | РРП                           |    | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей<br>Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей                                                                                                                       | 01.03.2021      | 01.03.2021   | Егорова М. В.             | В работе.<br>Отклонения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.5 | РРП                           |    | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей<br>Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей | 25.08.2020      | 21.08.2020   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении должностных лиц в составе РВПО" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 21.08.2020г. №1-855, приложен файл.                                                  |
| 2.1.6 | РРП                           |   | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей<br>Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей                                                                                                           | 15.01.2021      | 15.01.2021   | Егорова М. В.             | В работе.<br>Медиаплан разрабатывается. Планируется утверждение в установленные сроки.                                                                                                                                                    |
| 3.    |                               |  | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию<br>Значение: 0,0000                                                                                                                                | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Результат участия" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2144, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Мероприятия и контрольные точки исполнены. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                               |        | Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                           | Предоставлена информация : 0.0425 из 0.0425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.  | РРП                           |        | Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.09.2020      | 01.09.2020   | Долгушина С. В.           | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Расписание занятий" Иное Интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "Информация от регионального координатора по расписанию занятий и форматам проведения" Иное ОГБУ ДПО "КИРО" от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.         |
| 3.1.1 | РРП                           |        | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.09.2020      | 01.09.2020   | Чальцева Т. А.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Расписание уроков" Иное Интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников "Проектория" от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "Информация регионального оператора "Проектория" о занятиях и форматах проведения" Иное ОГБУ ДПО "КИРО" от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка. |
| 3.2.  | РРП                           |        | Услуга оказана (работы выполнены)<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Долгушина С. В.           | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Результат участия в цикле Всероссийских открытых уроков" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                           | 01/2144, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Мероприятия исполнены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2.1 | РРП                           |        | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 25.12.2020      | 25.12.2020   | Сахневич И. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Всероссийские открытые уроки" Иное Проектория от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Отклонения отсутствуют. В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-87 от 31.08.2020 запланированные уроки в сентябре и октябре были проведены. Все оставшиеся запланированные уроки будут проведены в установленные сроки. Завершение мероприятия планируется 25.12.2020 г. |
| 3.2.2 | РРП                           |        | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию                                                                                         | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Сахневич И. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Результат участия образовательных организаций Курской области в цикле Всероссийских открытых уроков" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. № 01/2144, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Проводится мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках.                                                                                               |
| 4.    |                               |        | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "О реализации проекта по ранней профессиональной                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                               |        | соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                              |                 |              |                           | ориентации" Письмо Комитета образования и науки Курской области от 18.11.2020г. №04.1-07/14668, приложен файл.<br>2. "Мониторинг численности" Иное Платформы Проекта "Билет в будущее" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.<br><br>Предоставлена информация : 12 из 12. |
| 5.    |                               |        | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021 | 31.12.2021      | 25.12.2021   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Достижение установленных значений планируется без отклонений.<br><br>Предоставлена информация : 18 из 18.                                                                                                                   |
| 5.1.  | РРП                           |        | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                             | 20.01.2021      | 20.01.2021   | Василенко И. В.           | В работе.<br>Отклонения отсутствуют. Утверждение необходимых документов будет выполнено в соответствии с планом мероприятий                                                                                                                                                                     |
| 5.1.1 | РФП                           |        | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"                                                                                                                                             | 20.01.2021      | 20.01.2021   | Уколов А. Ф.              | В работе.<br>Отклонения отсутствуют. План мероприятий будет разработан и утвержден в установленные сроки.                                                                                                                                                                                       |
| 5.2.  | РРП                           |        | Услуга оказана (работы выполнены)<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                              | 25.12.2021      | 25.12.2021   | Василенко И. В.           | В работе.<br>Отклонения отсутствуют. Текущие мероприятия на этапе                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                              | исполнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2.1    | РФП                              |    | Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"<br>Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.02.2021      | 01.02.2021   | Уколов А. Ф.                 | В работе.<br>Информация об отклонениях запланированного мероприятия отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.       |                                  |  | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Документы, подтверждающие достижение установленных значений." Иное Муниципальные районы Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Подтверждающие документы загружены. Отклонения отсутствуют. Спортивные залы обновлены в 9 образовательных организациях, расположенных в сельской местности, с охватом 1316 детей. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                           | Предоставлена информация : 19 из 19.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.  | РНП                           |        | Услуга оказана (работы выполнены)<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документы, подтверждающие " Иное Муниципальными районами Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы предоставлены районами: Беловский, Железногорский, Курский, Мантуровский, Медвенский и Обоянский. |
| 6.1.1 | РРП                           |        | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности<br>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных | 01.08.2020      | 25.08.2020   | Монастырева Н. В.         | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Заявка" Письмо Губернатора Курской области от 25.08.2020г. №01-11/937, приложен файл.                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                               |    | организациях, расположенных в сельской местности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.2 | РРП                           |   | <p><i>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</i></p> <p><i>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</i></p> | 29.02.2020      | 23.12.2019   | Уколов А. Ф.              | <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области" Соглашение Министерства Просвещения от 23.12.2019г. №073-09-2020-425, приложен файл.</p> |
| 7.    |                               |  | <p><i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i> Значение: 28,0000 Дата:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.              | <p>Информация по значению результата: В работе.Подготовительные мероприятия по результату на этапе исполнения. Отклонения отсутствуют.</p> <p>Предоставлена информация : 28 из 28.</p>                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                               |   | 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1.  | РНП                           |   | В 28 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года) В 28 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)                                                                                                             | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Тулиёва О. Л.             | В работе. Отклонения отсутствуют. Текущие мероприятия на этапе исполнения.                                                                                                                                         |
| 7.1.1 | РРП                           |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | 28.02.2021      | 27.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерства просвещения РФ от 27.12.2020г. №073-09-2021-549, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Соглашение заключено. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                               |        | финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности            |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.    |                               |        | Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                  | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл.<br>Дополнительным соглашением установлено значение "1" на 31.12.2020 нарастающим итогом, которое достигнуто в 2019 году. Охват детей нарастающим итогом 8250 чел. В 2020 году - 3550 чел.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1.                                      |
| 9.    |                               |        | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020 | 31.12.2020      | 30.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "О результатах мониторинга" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2145, указана ссылка.<br>Отклонения отсутствуют. Письмо с результатами мониторинга приложено.<br>Из общего числа детей с ОВЗ 2811 дополнительные общеобразовательные программы, в т.ч. с использованием дистанционных технологий, освоили 1591 обучающийся, что составило 55%<br><br>Предоставлена информация : 55 из 46. |
| 9.1.  | РРП                           |        | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                                                                                                                            | 01.10.2020      | 01.10.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Методические рекомендации" Иное ОГБУ ДПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                               |        | (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                           | КИРО от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. На основе полученной информации по запросу были разработаны методические рекомендации.                                                                                                                                                                    |
| 9.1.1 | РРП                           |        | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.10.2020      | 01.10.2020   | Чальцева Т. А.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О выявлении лучших практик" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 16.06.2020г. №01/879, 01/878, приложен файл.                                                                                                                                                     |
| 9.2.  | РРП                           |        | Услуга оказана (работы выполнены)<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.12.2020      | 30.12.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Просрочка 10 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О результатах мониторинга" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2145, указана ссылка. Письмо с результатами мониторинга загружено в систему в виде ссылки на файл по причине технических проблем с загрузкой документов. |
| 9.2.1 | РФП                           |        | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.12.2020      | 30.12.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Просрочка 10 дней.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                  |        | детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий<br>Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий                                                                                        |                 |              |                              | 1. "Результат мониторинга" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2145, указана ссылка.<br>Отклонения отсутствуют. МЗагружена ссылка на файл с результатами мониторинга, т.к. загрузка файлов в настоящее время не работает.                                                                                                                                                     |
| 10.      |                                  |        | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                    | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное соглашение" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл.<br>Значение указывается нарастающим итогом, результат исполнен в 2019 году. Охват детей деятельностью Центра в 2020 году 4153 чел.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 11.      |                                  |        | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций | 31.12.2020      | 30.09.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл.<br>Дополнительным соглашением установлено значение "0" на 31.12.2020<br><br>Предоставлена информация : 0 из 0.                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                  |        | Национальной технологической<br>инициативы Значение: 0,0000 Дата:<br>31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.      |                                  |        | Оказана поддержка организациям на<br>реализацию пилотных проектов по<br>обновлению содержания и технологий<br>дополнительного образования по<br>приоритетным направлениям, в том<br>числе поддержаны проекты по<br>организации летних школ,<br>организованных российскими<br>образовательными организациями, с<br>участием не менее 18 тыс. детей и<br>представителей молодежи из числа<br>иностраных граждан Значение:<br>0,0000 Дата: 31.12.2020 | 31.12.2020      | 30.09.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное соглашение" Соглашение<br>Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-<br>2019-E20047-1/6, приложен файл.<br>Дополнительным соглашением установлено значение "0"<br>на 31.12.2020<br><br>Предоставлена информация : 0 из 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.      |                                  |        | Созданы мобильные технопарки<br>"Кванториум" (для детей,<br>проживающих в сельской местности<br>и малых городах) Значение: 1,0000<br>Дата: 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Персональная страница мобильного технопарка<br>"Кванториум"" Иное ОБУ ДО "ОЦРТДиЮ" от<br>01.09.2020г. №6/н, указана ссылка.<br>2. "Перечисление благотворительной помощи для<br>реализации мероприятий по созданию мобильного<br>технопарка "Квантоориум"" Платежное поручение АО<br>"УК КЭАЗ" от 25.11.2020г. №30349, приложен файл.<br>Значение результата достигнуто. Были привлечены<br>внебюджетные средства в размере 100 тысяч рублей от<br>АО "УК КЭАЗ", платежное поручение от 25.11.2020 №<br>30349<br>С момента создания мобильного технопарка<br>"Кванториум" охват детей составил 4700 человек<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                       | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.1.  | РРП                           |        | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» | 31.12.2020      | 21.12.2019   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства просвещения РФ от 21.12.2019г. №073-09-2020-260, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.2.  | РРП                           |        | Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)                                                                               | 31.12.2020      | 15.10.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Мобильный технопарк "Кванториум" (страница сущности с информацией о дате создания)" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.2.1 | РРП                           |        | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум" Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                               | 01.03.2020      | 17.04.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Извещение о проведении электронного аукциона для закупки №0144200002420000514" Извещение Единая информационная система в сфере закупок от 17.04.2020г. №0144200002420000514, указана ссылка.<br>2. "Перечень закупок учреждения с возможностью просмотра даты размещения" Извещение Единая информационная система в сфере закупок от 17.04.2020г. №0144200002420000514, указана ссылка. |
| 13.2.2 | РРП                           |        | Утверждено штатное расписание структурного подразделения мобильного технопарка "Кванториум" Утверждено штатное расписание структурного подразделения                                                                                                                                          | 15.08.2020      | 06.02.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Штатное расписание" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 06.02.2020г. №4, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                  |        | мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.2.3   | РРП                              |        | Проведено повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка "Кванториум" Проведено повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                                                         | 31.12.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информация о повышении квалификации (профмастерства) сотрудников мобильного технопарка "Кванториум" в 2020 г." Письмо ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 15.10.2020г. №522, приложен файл. |
| 13.2.4   | РРП                              |        | Завершено приведение мобильного технопарка "Кванториум" в соответствие с фирменным стилем: доставлено, установлено, налажено оборудование Завершено приведение мобильного технопарка "Кванториум" в соответствие с фирменным стилем: доставлено, установлено, налажено оборудование                                                     | 20.08.2020      | 01.09.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О прибытии мобильного технопарка "Кванториум"" Иное Комитета образования и науки Курской области от 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.                                     |
| 13.2.5   | РРП                              |        | Проведен мониторинг оснащения мобильного технопарка "Кванториум" средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем Проведен мониторинг оснащения мобильного технопарка "Кванториум" средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем | 30.08.2020      | 30.08.2020   | Тулиёва О. Л.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Мониторинг " Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.                                                                                                     |
| 13.2.6   | РРП                              |        | Запущен мобильный технопарк "Кванториум" в единый день открытий Запущен мобильный технопарк "Кванториум" в единый день открытий                                                                                                                                                                                                         | 01.09.2020      | 01.09.2020   | Уколов А. Ф.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информация о мобильном кванториуме" Иное Комитета образования и науки Курской области от                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения



| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                               |        |                                                                                                                                                       |                 |              |                           | 01.09.2020г. №б/н, указана ссылка.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.2.7 | РРП                           |        | Создан сайт (раздел сайта), посвященный мобильному технопарку "Кванториум" Создан сайт (раздел сайта), посвященный мобильному технопарку "Кванториум" | 01.05.2020      | 01.05.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Раздел сайта мобильного "Кванториума"" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 01.05.2020г. №б/н, указана ссылка.                                                                                                                                                     |
| 13.2.8 | РРП                           |        | Утверждены образовательные программы Утверждены образовательные программы                                                                             | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" Приказ ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 01.07.2020г. №124.1, приложен файл.                                                                                                             |
| 13.2.9 | РРП                           |        | Утвержден годовой план мобильного технопарка "Кванториум" Утвержден годовой план мобильного технопарка "Кванториум"                                   | 01.09.2020      | 27.08.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План работы отдела "Детский технопарк "Кванториум" г.Курска - мобильный технопарк "Кванториум"" на 2020-2021 учебный год" Иное ОБУДО "ОЦРТДиЮ" от 27.08.2020г. №б/н, приложен файл.                                                                   |
| 14.    |                               |        | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение: 6,0000<br>Дата: 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. В связи с новой утвержденной конкурсной документацией Курской областью была подана заявка на участие в отборе. Концепция реализации изменилась, будет утверждена новая дорожная карта.<br><br>Предоставлена информация : 6 из 6. |
|        |                               |        |                                                                                                                                                       |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1.  | РРП                           |    | Созданы 6 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Созданы 6 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)             | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Тулиёва О. Л.             | В работе.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>На основании утвержденной конкурсной документации указанный результат меняет свое название и будет относиться к проекту "Современная школа"                                                                                                    |
| 14.1.1 | РРП                           |   | Утвержден состав агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного технопарка "Кванториум" Утвержден состав агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного технопарка "Кванториум" | 01.10.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации. |
| 14.1.2 | РРП                           |  | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                   | 31.12.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                               |        | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                           | 1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации.                                            |
| 14.1.3 | РРП                           |        | <i>Представлена информация об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" по статьям расходов</i><br>Представлена информация об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" по статьям расходов | 30.11.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации. |
| 14.1.4 | РРП                           |        | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум" Объявлены                                                                                                                                                                                                                       | 01.03.2021      | 01.03.2021   | Егорова М. В.             | В работе.<br>С 01.01.2021 прекращается исполнение результата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                               |    | закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.1.5 | РРП                           |    | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование мобильных технопарков "Кванториум"<br>Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование мобильных технопарков "Кванториум" | 25.08.2020      | 21.08.2020   | Уколов А. Ф.              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении должностных лиц в составе РВПО" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 21.08.2020г. №1-855, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.1.6 | РРП                           |   | Определен детский технопарк "Кванториум", на базе которого создается мобильный технопарк "Кванториум" Определен детский технопарк "Кванториум", на базе которого создается мобильный технопарк "Кванториум"                                                                                                                                  | 25.10.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации. |
| 14.1.7 | РРП                           |  | Утверждено Положение о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" Утверждено Положение                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.10.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                        | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                               |        | о деятельности мобильного технопарка "Кванториум"                                                                                                                                                                                      |                 |              |                           | 1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации.                                            |
| 14.1.8 | РРП                           |        | Утверждены медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум"<br>Утверждены медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования мобильного технопарка "Кванториум" | 15.10.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации. |
| 14.1.9 | РРП                           |        | Привлечены партнеры к созданию и деятельности мобильного технопарка "Кванториум" Привлечены партнеры к                                                                                                                                 | 01.11.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п    | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                  |        |                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                  |        | созданию и деятельности мобильного<br>технопарка "Кванториум"                                                                                                |                 |              |                              | 1. "Документация на участие в отборе субъектов<br>Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023<br>годах субсидии из федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на создание на базе<br>общеобразовательных организаций детских технопарков<br>«Кванториум» в рамках федерального проекта<br>«Современная школа» национального проекта<br>«Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от<br>15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте<br>"Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные<br>технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и<br>становится частью федерального проекта "Современная<br>школа" на основании конкурсной документации.                                            |
| 14.1.1<br>0 | РРП                              |        | Согласован и утвержден дизайн-<br>проект мобильного технопарка<br>"Кванториум" Согласован и утвержден<br>дизайн-проект мобильного технопарка<br>"Кванториум" | 30.12.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов<br>Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023<br>годах субсидии из федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на создание на базе<br>общеобразовательных организаций детских технопарков<br>«Кванториум» в рамках федерального проекта<br>«Современная школа» национального проекта<br>«Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от<br>15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте<br>"Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные<br>технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и<br>становится частью федерального проекта "Современная<br>школа" на основании конкурсной документации. |
| 14.1.1<br>1 | РРП                              |        | Заключено соглашение о реализации<br>образовательных программ в сетевой<br>форме между детским технопарком                                                   | 30.11.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п       | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                               |        | "Кванториум" и общеобразовательными организациями Заключено соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между детским технопарком "Кванториум" и общеобразовательными организациями                                                                           |                 |              |                           | 1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации.                                            |
| 14.1.1<br>2 | РРП                           |        | Представлена информация об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум"<br>Представлена информация об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" | 30.11.2020      | 15.10.2020   | Егорова М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»" Иное Министерства просвещения РФ от 15.10.2020г. №ТВ-31/02вн, указана ссылка.<br>В соответствии с изменениями в федеральном паспорте "Успех каждого ребенка" результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум"" изменяет свое название и становится частью федерального проекта "Современная школа" на основании конкурсной документации. |
| 15.         |                               |        | В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования                                                                                                                                                                                 | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                  |        | детей Значение: 0,0000 Дата:<br>31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                              | 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области" Соглашение Министерства просвещения РФ от 03.02.2020г. №073-2019-Е20047-1/6, приложен файл.<br>Дополнительным соглашением на 31.12.2020 установлено значение "0"<br><br>Предоставлена информация : 0 из 0. |
| 16.      |                                  |        | В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата:<br>31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                            | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Текущие мероприятия на этапе исполнения.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1.                                                                                                                                                                                          |
| 16.1.    | РРП                              |        | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области<br>Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.                 | В работе.<br>Текущее мероприятие контрольной точки на этапе исполнения. Отклонения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.1.1   | РРП                              |        | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами                                                                                                                                                                                                            | 28.02.2021      | 07.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 07.12.2020г. №073-2019-Е20047-1/7, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Ожидаем формирования новых                                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения



| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                  |        | государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |                 |              |                              | дополнительных соглашений со стороны Министерства просвещения.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.1.2   | РРП                              |        | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"               | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Уколов А. Ф.                 | В работе.<br>Отклонения отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.      |                                  |        | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием                                                                                                                                                                                                        | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                               |        | образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                        |                 |              |                           | образовательных программ" Распоряжение Министерства просвещения РФ от 27.12.2019г. №Р-154, приложен файл. Отклонения отсутствуют.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.1.  | РРП                           |        | Документ утвержден (подписан)<br>Документ утвержден (подписан)                                                                          | 21.12.2020      | 21.12.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ" Распоряжение Министерства просвещения РФ от 27.12.2019г. №Р-154, приложен файл. Отклонения отсутствуют.                                                                                                  |
| 17.1.1 | РРП                           |        | Документ разработан Документ разработан                                                                                                 | 21.12.2020      | 21.12.2020   | Сахневич И. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ" Распоряжение Министерства просвещения РФ от 27.12.2019г. №Р-154, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Ведется разработка документа. Подтверждающие сведения будут предоставлены в установленные сроки. |
| 18.    |                               |        | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, | 31.12.2024      | 20.12.2024   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Достижение запланированных значений результат идет согласно утвержденному плану мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                               |        | <i>вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70,0000<br/>Дата: 31.12.2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                           | Предоставлена информация : 70 из 70.                                                                                                                                                                                        |
| 18.1.  | РРП                           |        | <i>Услуга оказана (работы выполнены)<br/>Услуга оказана (работы выполнены)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.12.2024      | 20.12.2024   | Тулиёва О. Л.             | В работе.<br>Отклонения отсутствуют. Исполнение контрольной точки идет согласно установленным срокам.                                                                                                                       |
| 18.1.1 | РФП                           |        | <i>Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам<br/>Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам</i> | 20.12.2020      | 30.12.2020   | Тулиёва О. Л.             | Выполнено.<br>Просрочка 10 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Исполнение мероприятия" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2145, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Мероприятие выполнено.              |
| 19.    |                               |        | <i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>                                                                                        | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Уколов А. Ф.              | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Запланированные контрольные точки и мероприятий реализуются в соответствии с утвержденным планом мероприятий.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.1.    | РРП                              |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта<br>Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.07.2021      | 01.07.2021   | Тулиёва О. Л.                | В работе.<br>Просрочка 10 дней.<br>Отклонения отсутствуют. Запланированные мероприятия контрольной точки реализуются.                                                                                                |
| 19.1.1   | РФП                              |  | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ<br>Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 20.12.2020      | 30.12.2020   | Уколов А. Ф.                 | Выполнено.<br>Просрочка 10 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Результат мониторинга" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2145, приложен файл.<br>Отклонения отсутствуют. Данные мониторинга загружены. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

## Динамика достижения контрольных точек

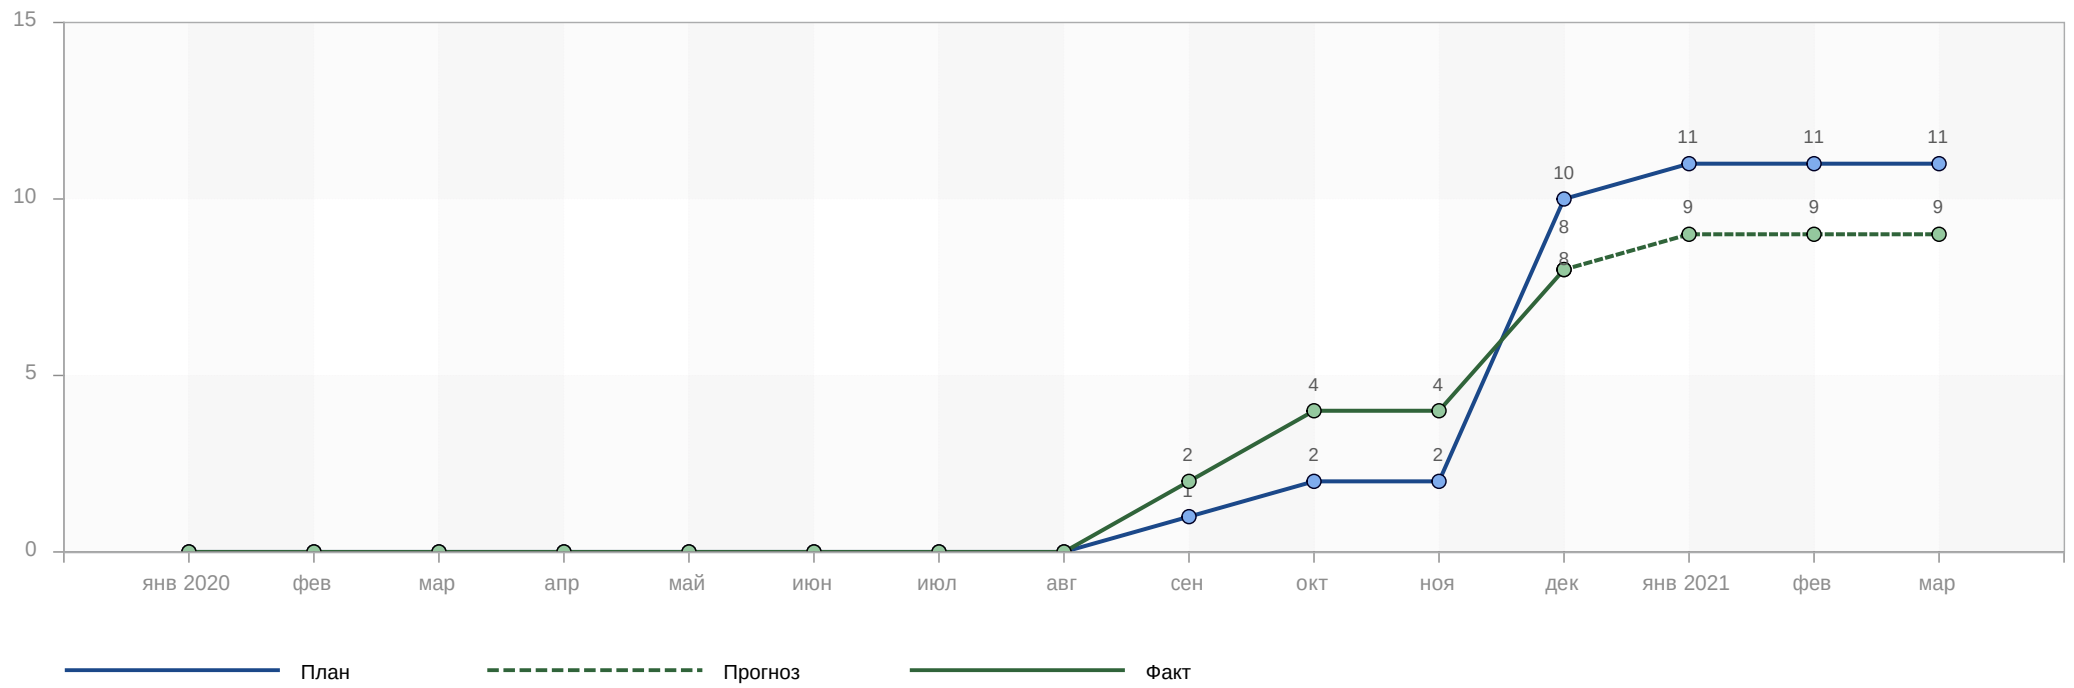


Рис. 1. "(Е2-38) Успех каждого ребенка (Курская область)"

График достижения показателя

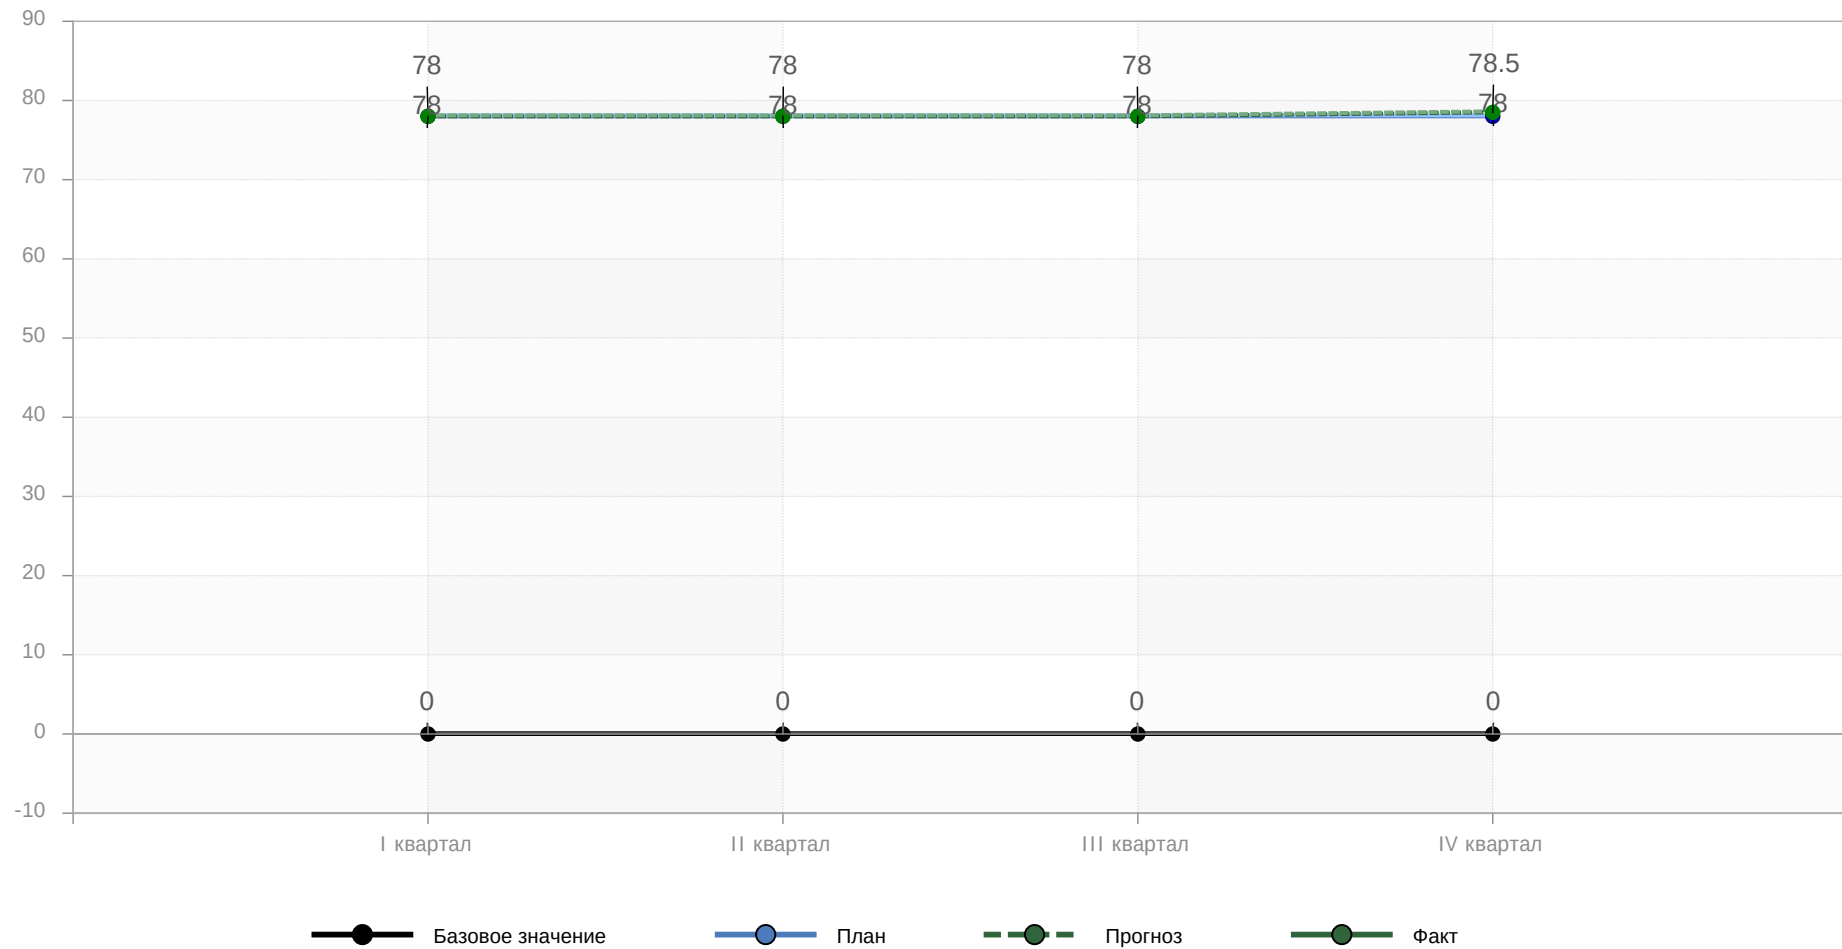


Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

Диаграмма достижения показателя

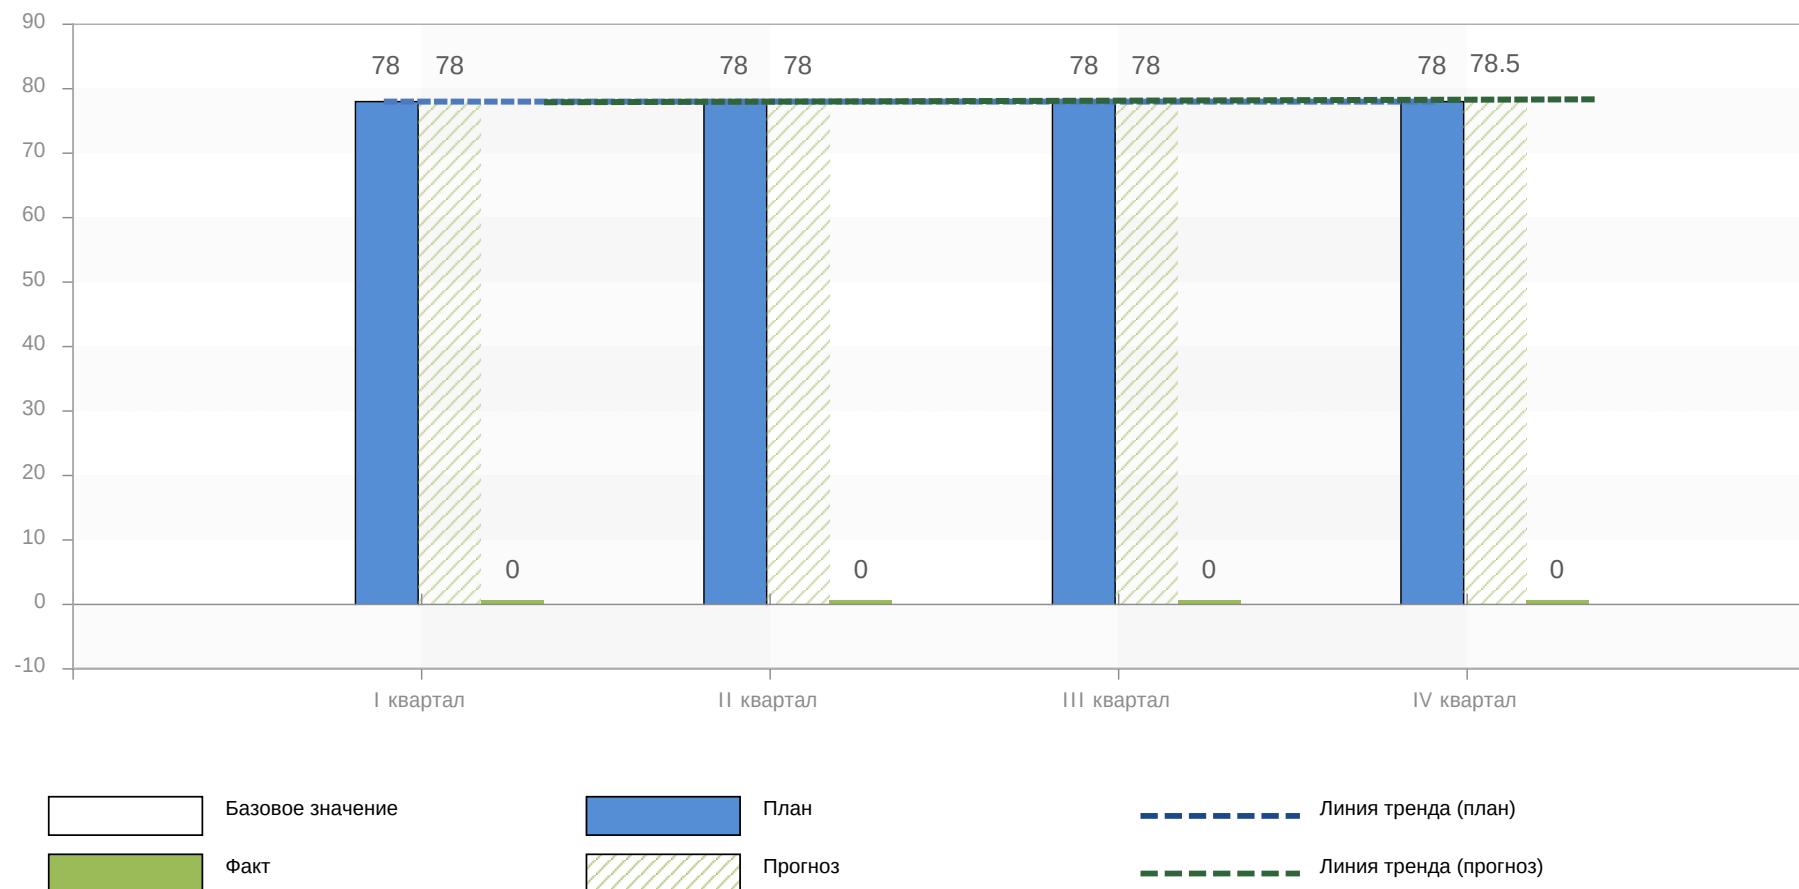


Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

График достижения показателя

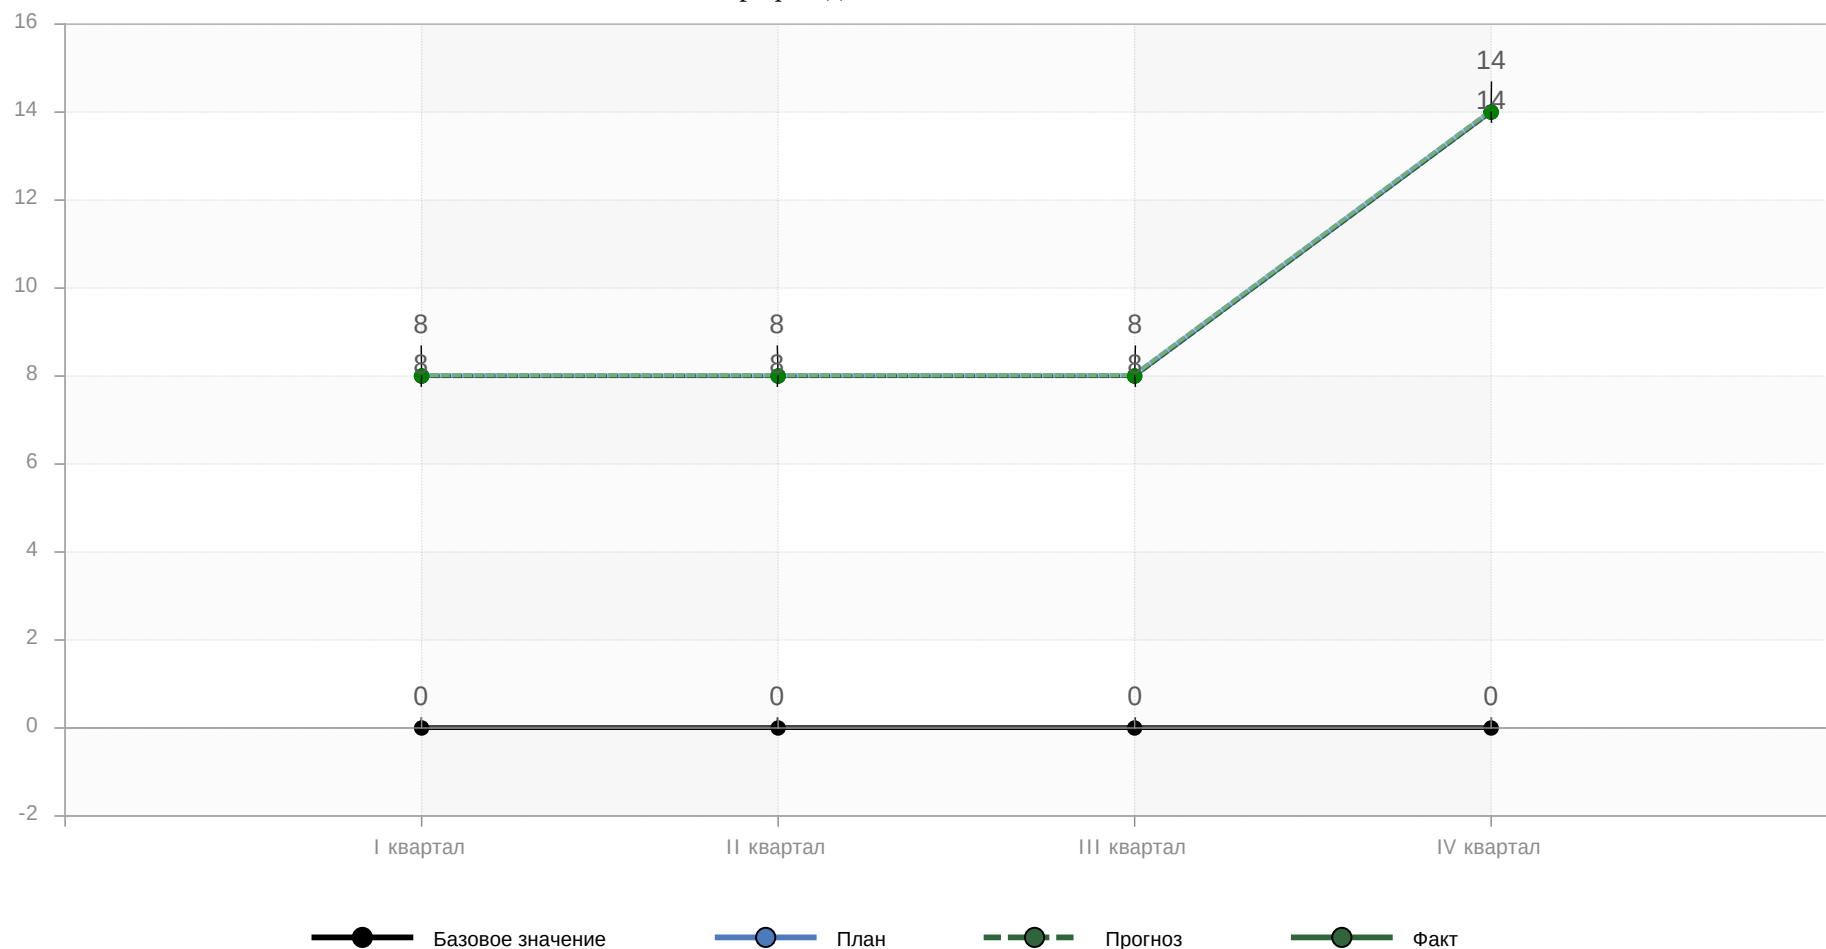


Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации



Диаграмма достижения показателя

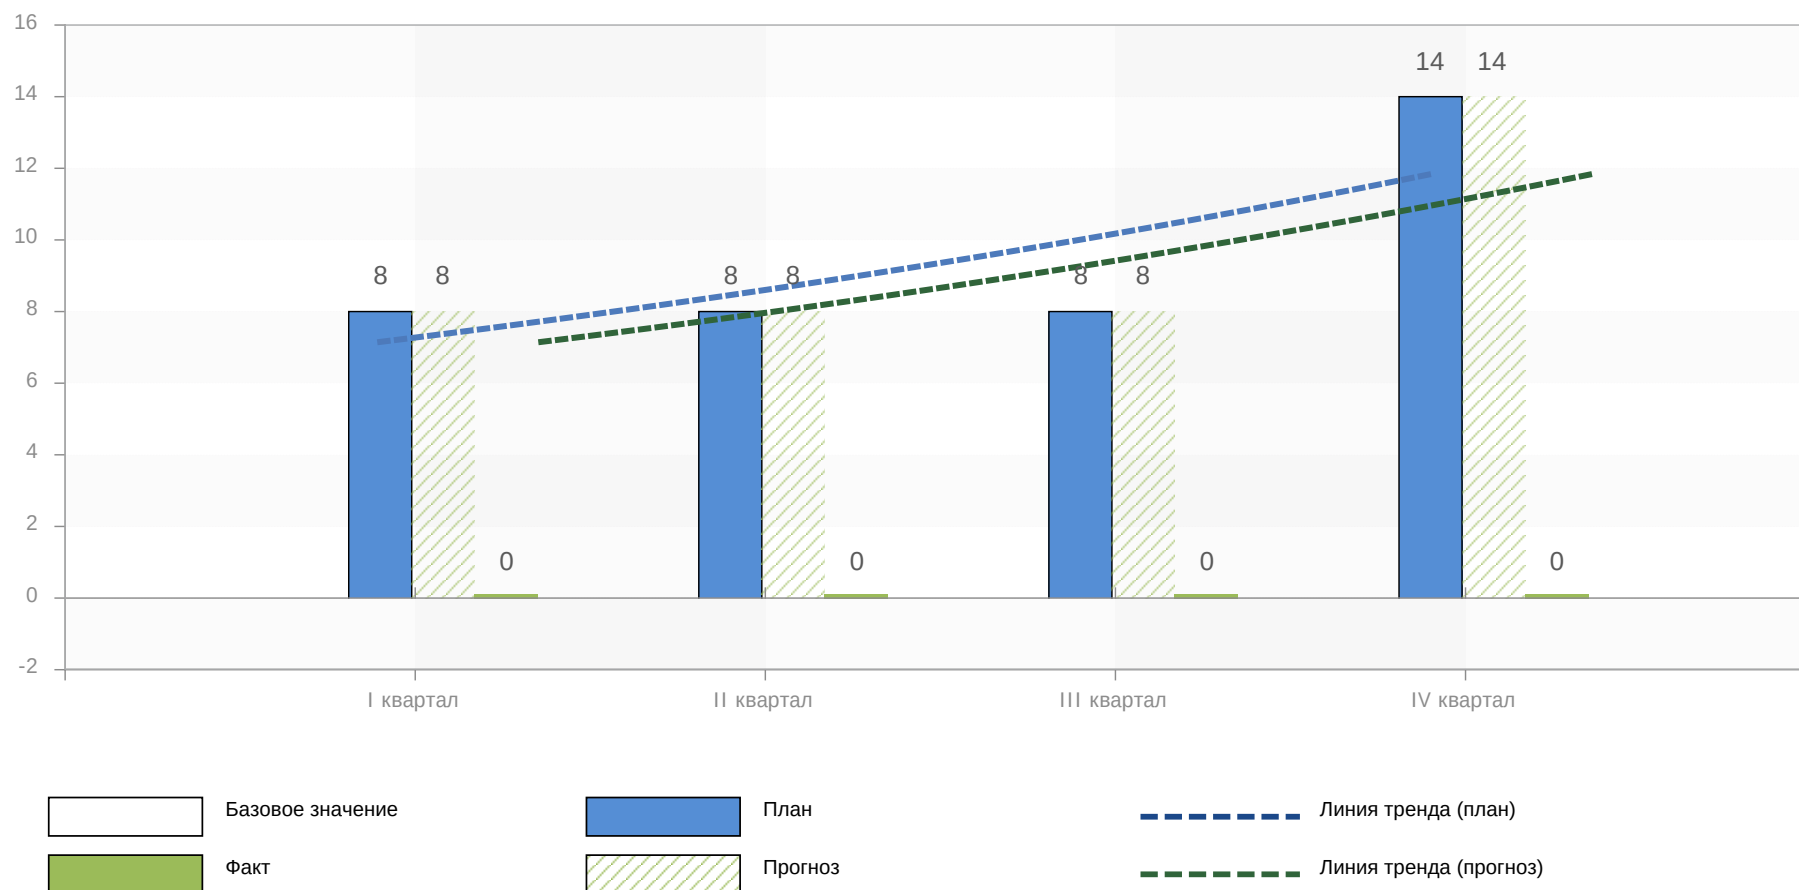


Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

График достижения показателя

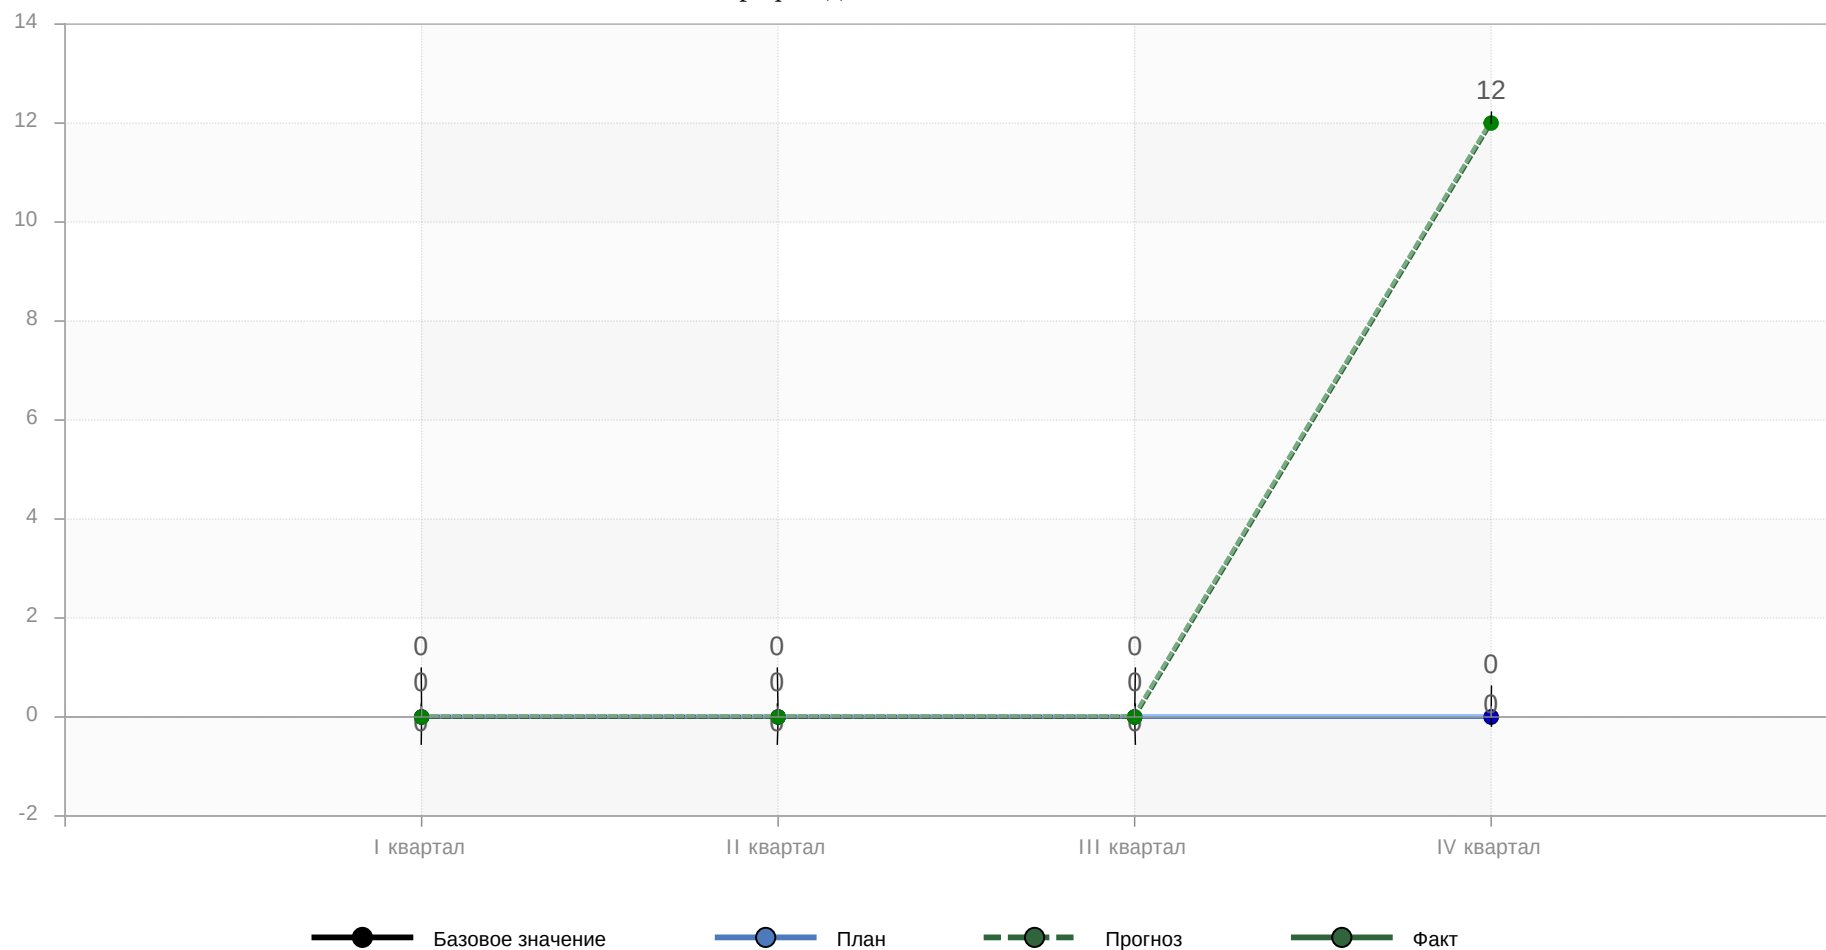


Рис. 5. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

Диаграмма достижения показателя

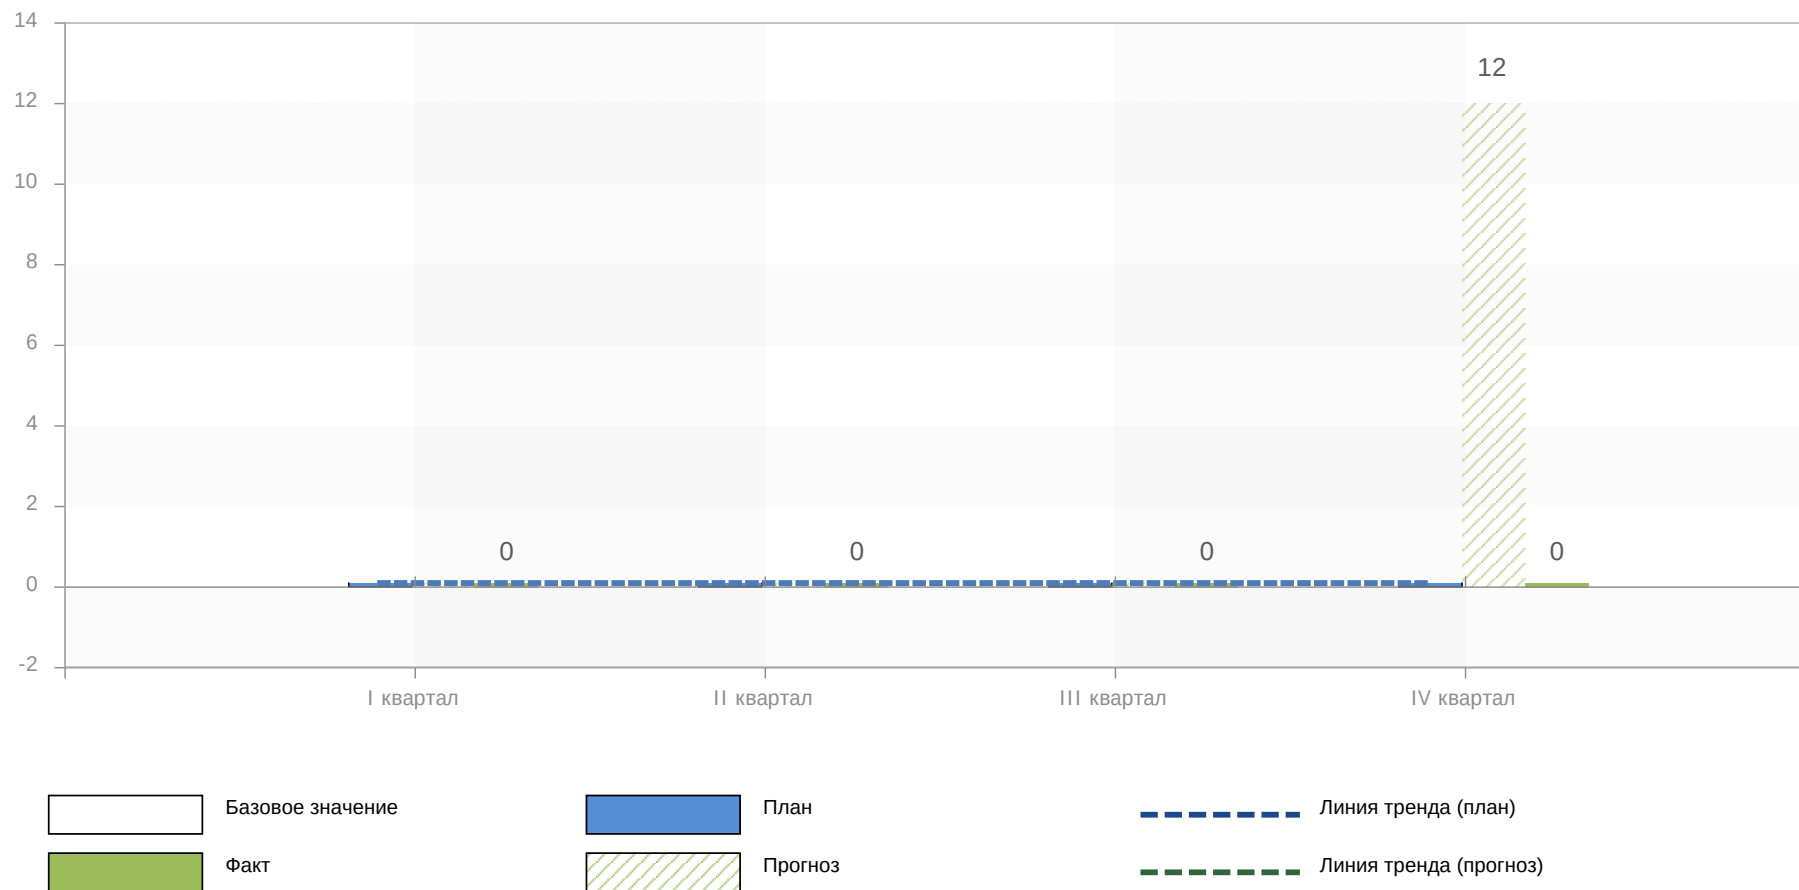


Рис. 6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

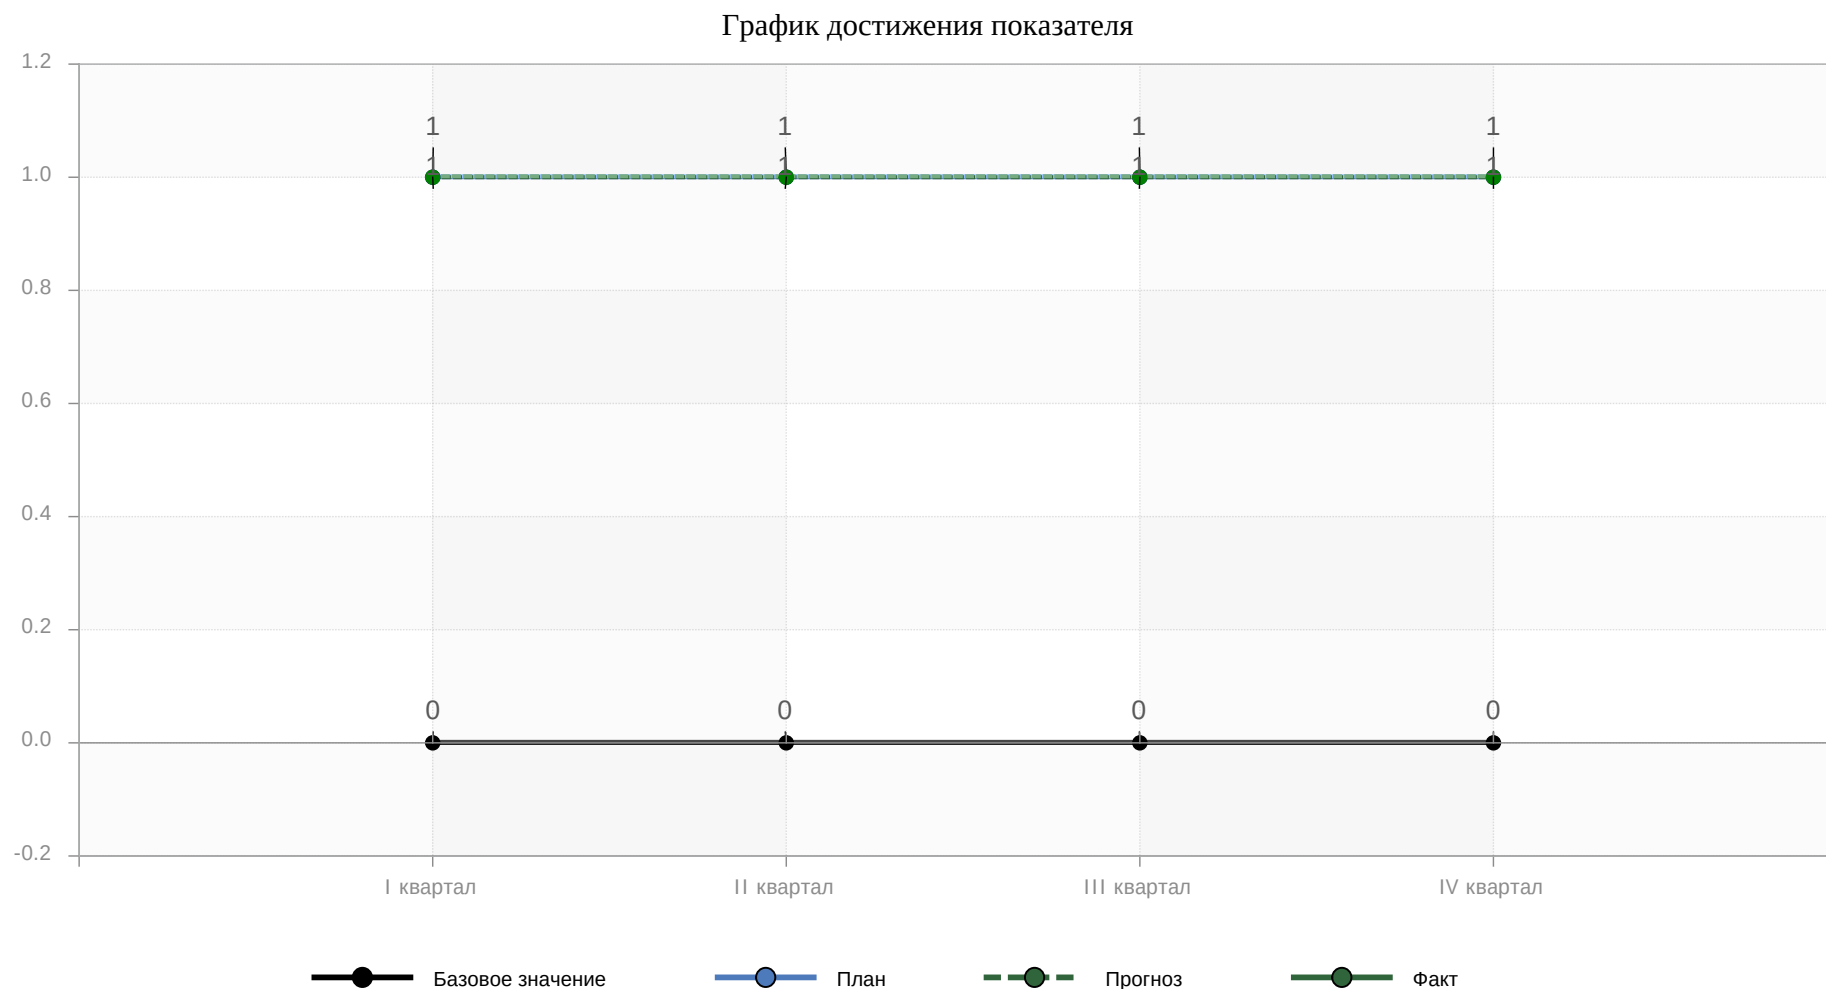


Рис. 7. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя

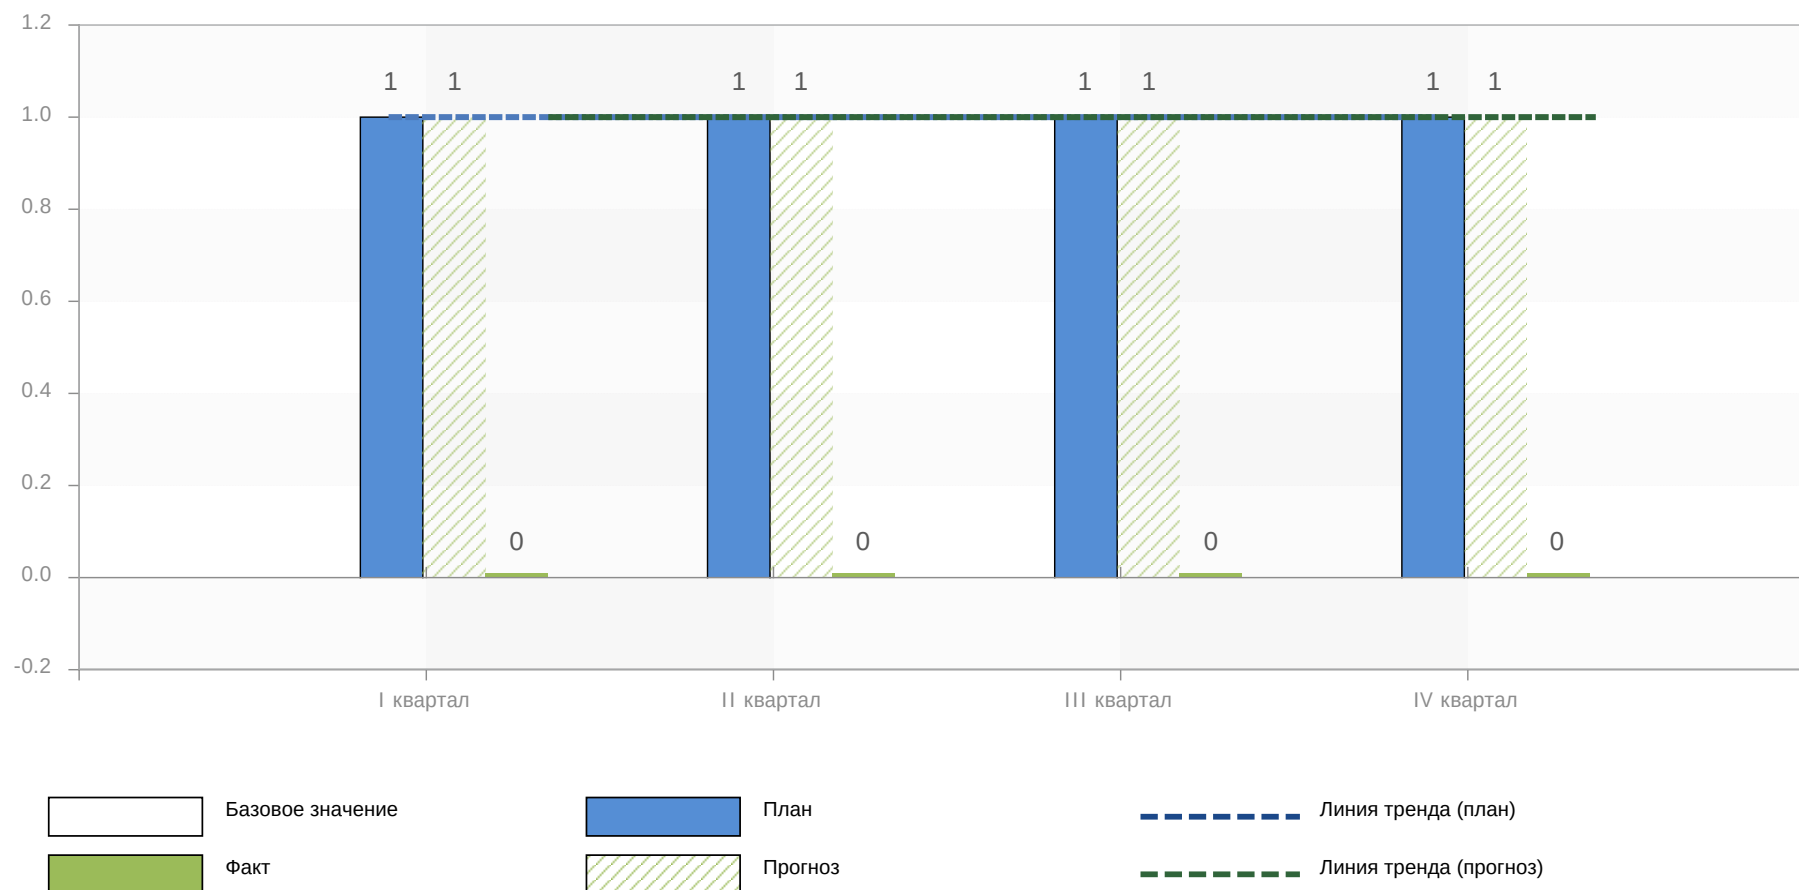


Рис. 8. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

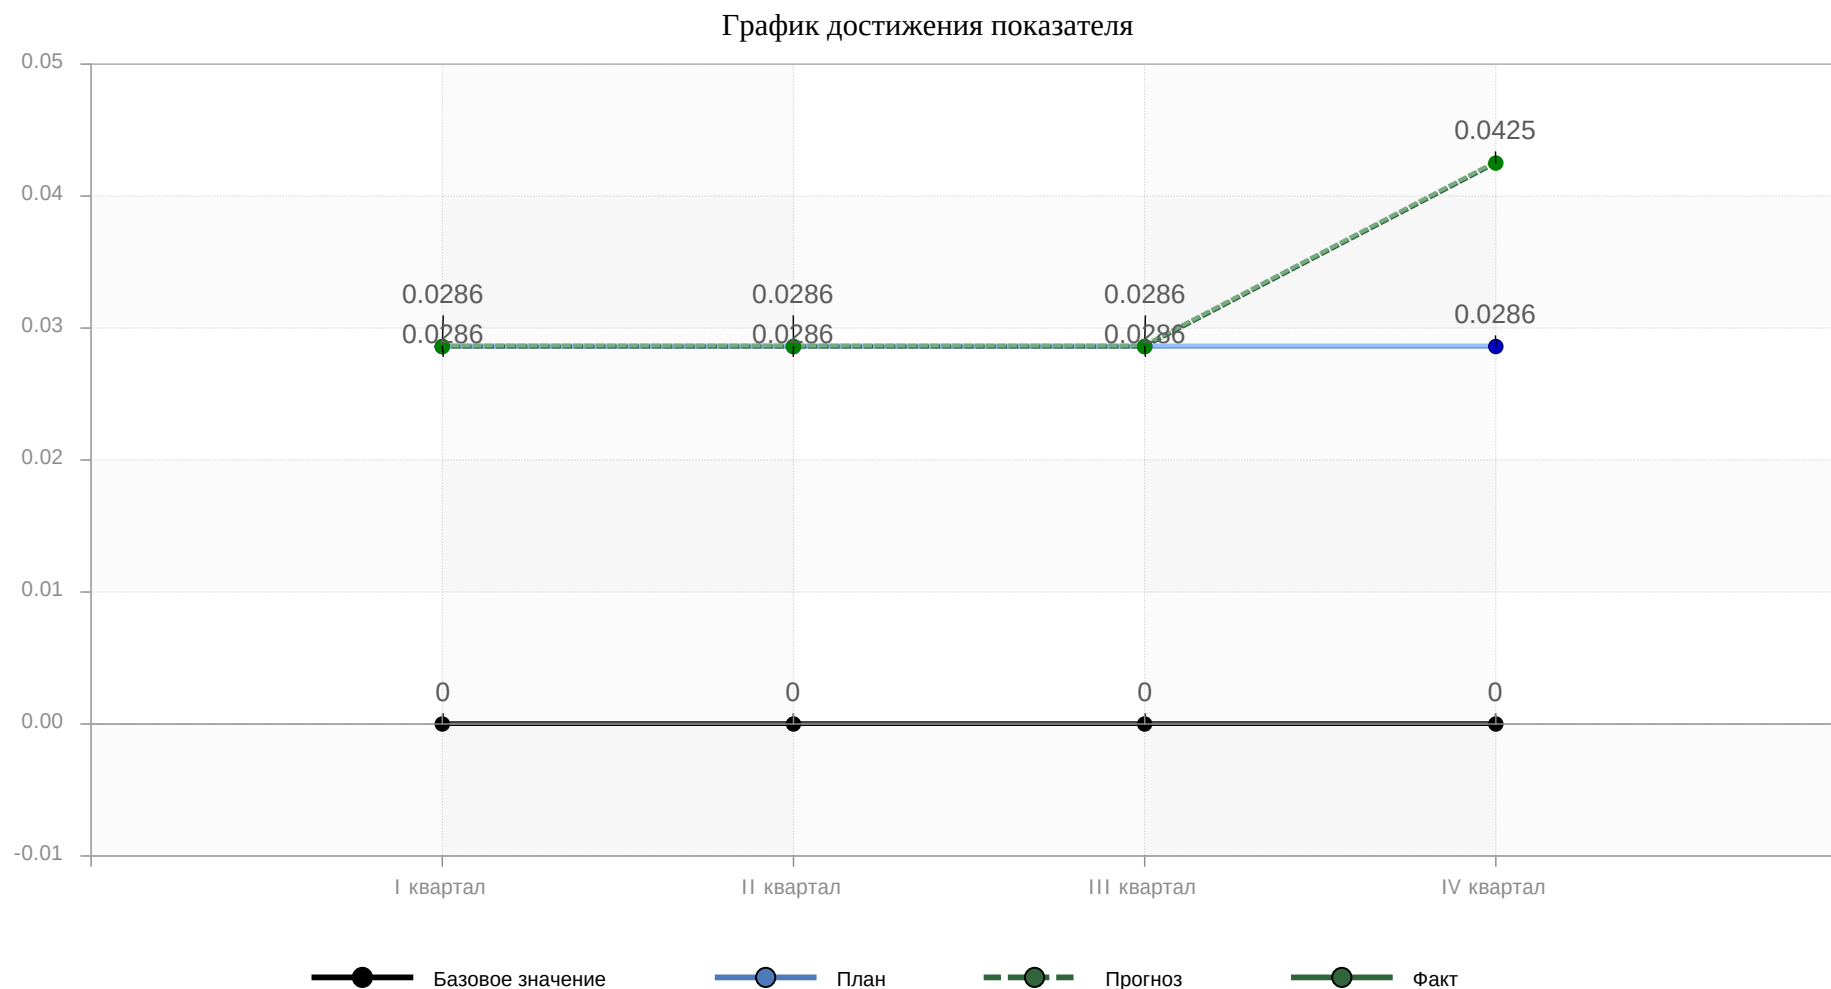


Рис. 9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

Диаграмма достижения показателя

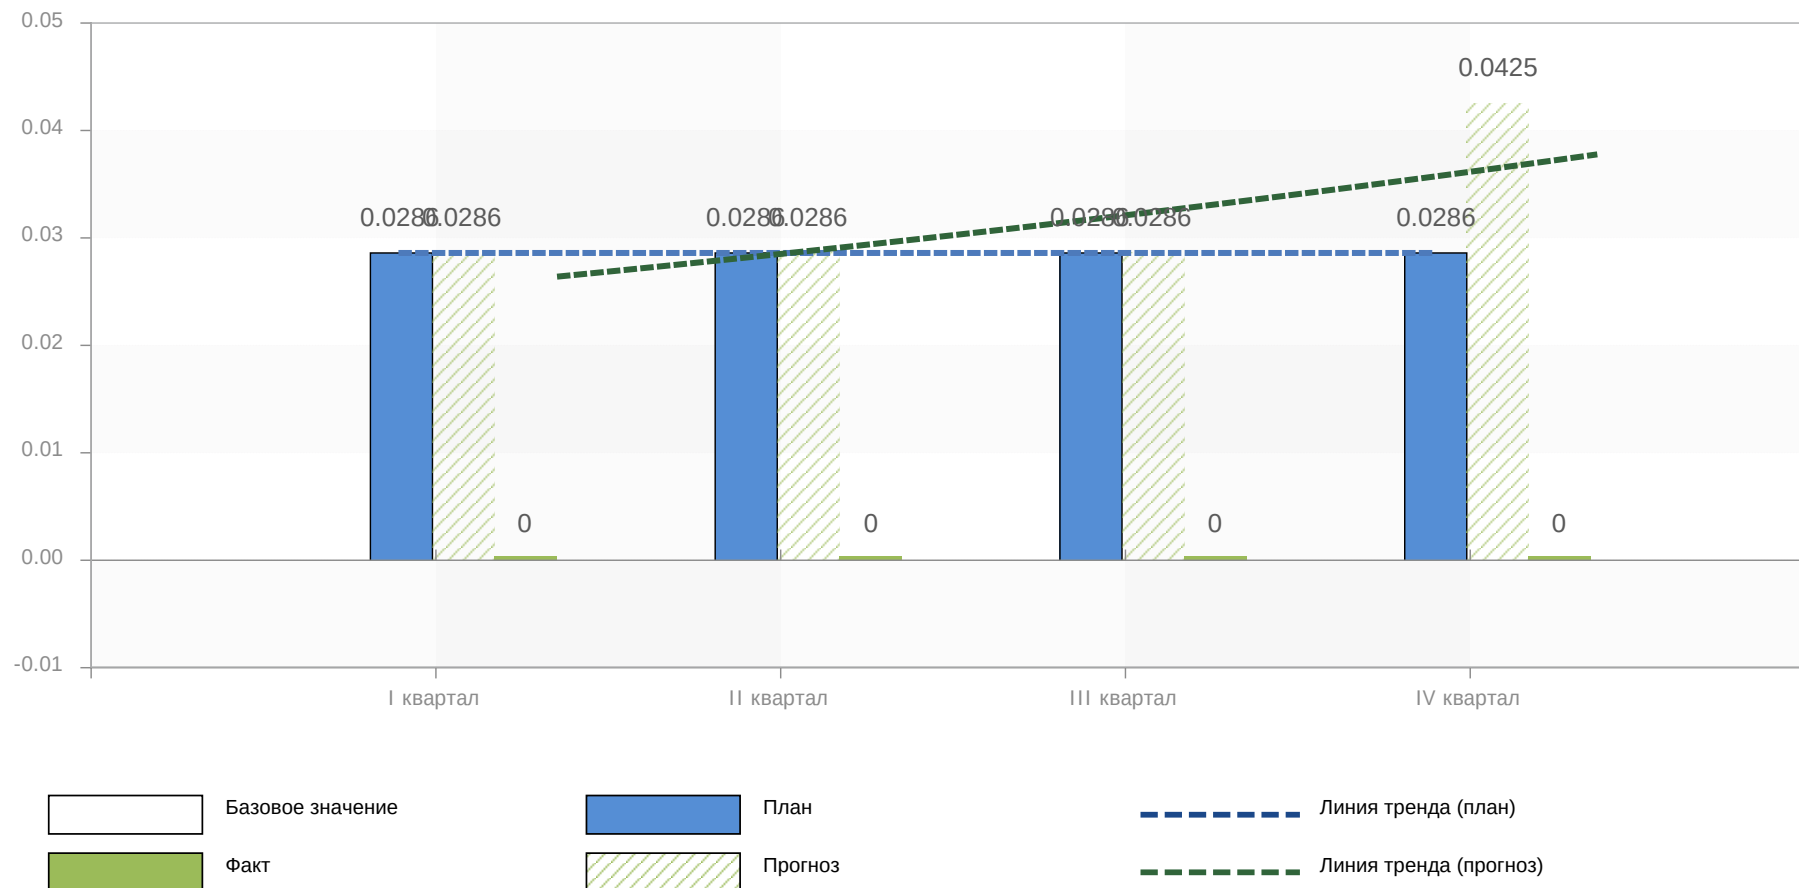


Рис. 10. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
