
(подпись)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Е4-38) Цифровая образовательная среда (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>

За период 2019-2020 годов в Курской области была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях региона, в 35 общеобразовательных организациях осуществлена поставка оборудования не в полном объеме, в связи с чем был создан риск исполнения, допоставка оборудования планируется в течение I квартала 2021 года. Кассовое исполнение составляет 90% по результату.

40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). В 2019 году был создан центр цифрового образования детей "IT-куб", охват детей по всем направленностям и формам взаимодействия составил более 4 тысяч человек за 2 года, в 2020 - 1990 чел.

15% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования получили цифровой профиль и индивидуальный план обучения.

15% образовательных организаций осуществили деятельность с использованием информационно-сервисных платформ. 3% обучающихся использовали информационно-сервисную платформу для "горизонтального" обучения

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	1	1	1	1	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 06.11.2019г. №073-2019-Е40046-1/2, приложен файл. Значение показателя указано нарастающим итогом в соответствии с дополнительным соглашением, оно было достигнуто в 2019 году.
2		Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по	Процент	5	5	5	5	18.3	15	122,00%	Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет об использовании платформы" Письмо Онлайн-платформы "Учи.ру" от 15.06.2020г. №1795, приложен файл. В соответствии с письмом ФГАУ "ФНПРО" № 100/3107-05 от 31.07.2020 г. при расчет показателя субъект вправе учитывать обучающихся, использующих информационные системы и ресурсы иных производителей. 15 680 учеников с весны 2020 года прошли интерактивные курсы для самостоятельного (индивидуального) изучения материалов, что от общего количества обучающихся 117 866 составило 13,3%. Значение показателя указывается



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		указанным программам									нарастающим итогом.
3		Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	10	10	10	10	27.7	15	184,67%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении запланированных значений показателя" Письмо ОШБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2139, приложен файл. Из 885 образовательных учреждений 245 используют портал Учи.ру, что составляет 27,7%
4		Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	1	1	1	1	42.44	3	1414,67 %	Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное с отчетом" Письмо Учи.ру от 15.06.2020г. №1795, приложен файл. 2. "об использовании цифровых ресурсов Учи.ру в Курской области" Отчет Учи.ру от 15.06.2020г. №6/н, приложен файл. Всего в Курской области 117866 обучающихся, 50 020 из которых проходили обучение на платформе Учи.ру, что составляет 42,44%
5		Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная	Процент	15	3	3	3	18.41	5	368,20%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении запланированных значений показателя" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 29.12.2020г. №01/2128, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Фактически достигнутое значение превышает плановое. 3374 педагога из 18 327 прошли повышение квалификации с использованием ДОТ, что составляет 18,41%

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 228 829,46 тыс. руб

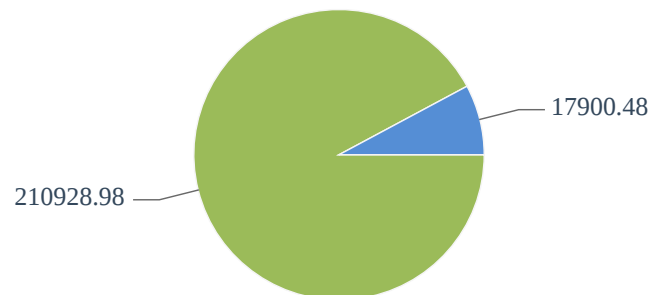

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 223 611,97 тыс. руб

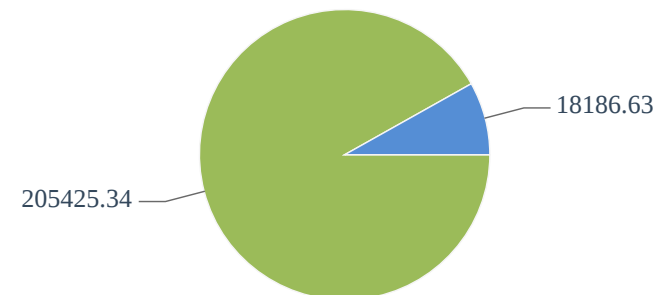

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	233 301,70	233 301,71	233 301,71	9 689,74	215 115,08	92,20	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	233 301,70	233 301,71	233 301,71	9 689,74	215 115,08	92,20	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	228 829,46	228 829,47	228 829,47	9 689,74	210 928,98	92,18	Контракты, заключенные по итогам проведенного аукциона, были расторгнуты по причине недобросовестного исполнения со стороны поставщика, вследствие чего было заключено 168 договоров с единственным поставщиком, 140 из которых исполнены не в полном объеме. По состоянию на 01.01.2021 кассовый расход составляет

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									больше 90%. Оставшаяся часть оборудования будет поставлена в течение I квартала 2021 года.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	219 139,73	219 139,73	219 139,73	0,00	201 239,24	91,83	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	223 611,97	223 611,97	223 611,97	0,00	205 425,34	91,87	Контракты, заключенные по итогам проведенного аукциона, были расторгнуты по причине недобросовестного исполнения со стороны поставщика, вследствие чего было заключено 168 договоров с единственным поставщиком, 140 из которых исполнены не в полном объеме. По состоянию на 01.01.2021 кассовый расход составляет больше 90%. Оставшаяся часть оборудования будет поставлена в течение I квартала 2021 года.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			233 301,70	233 301,71	233 301,71	9 689,74	215 115,08	92,20	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			233 301,70	233 301,71	233 301,71	9 689,74	215 115,08	92,20	
бюджет субъекта Российской Федерации			228 829,46	228 829,47	228 829,47	9 689,74	210 928,98	92,18	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			219 139,73	219 139,73	219 139,73	0,00	201 239,24	91,83	
бюджеты муниципальных образований			223 611,97	223 611,97	223 611,97	0,00	205 425,34	91,87	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 113,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 132,0000 Дата: 31.12.2021	
3		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 213,0000 Дата: 31.12.2022	
4		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Для не менее 25 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Курской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 113,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	01.04.2021	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Акты приема-передачи оборудования в рамках ЦОС" Акт приема-передачи Образовательных организаций Курской области от 31.12.2020г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Неполная поставка оборудования, Причина риска: Смена поставщика, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые решения: 1. Произведена смена поставщика, заключены контракты, оборудование поставлено частично, допоставка планируется в течение I квартала 2021 года, срок исполнения 01.04.2021. Произведена смена поставщика. Оборудование поставлено не в полном объеме, допоставка планируется в течение I квартала 2021 года. Акты приема-передачи приложены. 78 образовательных организаций оснащены оборудованием, в 35 имеется не полная поставка оборудования. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 113 из 113.
1.1.	РРП		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды Получена субсидия Российской	01.05.2020	20.12.2019	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Министерства Просвещения РФ от 20.12.2019г. №073-09-2020-132, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды				
1.2.	РРП		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	31.12.2020	01.04.2021	Долгушина С. В.	В работе. Просрочка 91 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты приема-передачи оборудования в рамках ЦОС" Акт приема-передачи Образовательных организаций Курской области от 31.12.2020г. №б/н, указана ссылка. Существует риск: Неполная поставка оборудования, Причина риска: Риск в связи с частичным исполнением мероприятия, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые решения: 1. Произведена смена поставщика, ведется оперативная работа по исполнению контрактов и поставки оборудования, срок исполнения 01.04.2021. Поставка оборудования осуществлена 30.12.2020 не в полном объеме, допоставка планируется в течение I квартала 2021 года.
1.2.1	РРП		Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	01.06.2020	05.06.2020	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка оборудования для реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Регионального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в состав национального проекта "Образование"" Извещение Единой информационной системы в сфере закупок от 05.06.2020г. № 0144300004020000194, указана ссылка. 2. "Поставка оборудования для реализации мероприятий

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование»" Извещение Единой информационной системы в сфере закупок от 05.06.2020г. № 0144300004020000202, указана ссылка. 3. "поставка оборудования для реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях регионального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в состав национального проекта "Образование"" Извещение Единой информационной системы в сфере закупок от 05.06.2020г. № 0144300004020000199, указана ссылка. Просрочка фактического исполнения связана со сложной эпидемиологической и экономической обстановкой при подготовке документации
1.2.2	РРП		Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	30.08.2020	30.08.2020	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы, отражающие мониторинг хода реализации мероприятий" Иное Комитета образования и науки Курской области от 30.08.2020г. №6/н, приложен файл.
1.2.3	РРП		Закуплено, доставлено и налажено оборудование Закуплено, доставлено и налажено оборудование	20.08.2020	01.04.2021	Уколов А. Ф.	В работе. Просрочка 224 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приема-передачи оборудования в рамках ЦОС" Акт приема-передачи Образовательных организаций от 31.12.2020г. №6/н, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Риск снят: Неполная поставка оборудования, Причина риска: Неисполнение контракта первым поставщиком, что привело к расторжению контрактов и смене поставщиков оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые решения: 1. Произведена смена поставщика, ведется работа по оперативной поставке оборудования, срок исполнения 01.04.2021. Произведена частичная поставка оборудования, приложены письма об отсрочке поставки, исполнение запланировано в I квартале 2021 года.
2.			Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 132,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.03.2021	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. На основе поданной заявки на участие в отборе в связи с утверждением новой конкурсной документации планируется изменение значений результата. Предоставлена информация : 132 из 132.
2.1.	РРП		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 132 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 132 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	31.12.2021	31.03.2021	Долгушина С. В.	В работе. Отклонения отсутствуют. На основе утвержденной конкурсной документации, которая предполагает изменение концепции по реализации запланированных мероприятий, подана заявка на участие в конкурсном отборе.
2.1.1	РРП		Согласован и утвержден перечень общеобразовательных организаций и	01.10.2020	14.10.2020	Долгушина С. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС Согласован и утвержден перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС				Подтверждающие документы: 1. "Документация на участие в отборе" Иное Министерства просвещения РФ от 14.10.2020г. №ТВ-30/04вн, приложен файл. Отклонения отсутствуют. В связи с новой конкурсной документацией планируется изменение концепции по реализации запланированных мероприятий. Заявка на участие в отборе подана
2.1.2	РРП		Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист) Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист)	01.03.2021	01.03.2021	Долгушина С. В.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 08.12.2020г. №073-2019-Е40046-1/3, приложен файл. На основании дополнительного № 073-2019-Е40046-1/3 от 08.12.2020 г. меняется формулировка результата с концепцией реализации.
2.1.3	РРП		Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	31.03.2021	31.03.2021	Уколов А. Ф.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное" Соглашение Министерства просвещения РФ от 08.12.2020г. №073-2019-Е40046-1/3, приложен файл. На основании дополнительного № 073-2019-Е40046-1/3 от 08.12.2020 г. меняется формулировка результата с концепцией реализации.
2.1.4	РРП		Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды Утвержден медиаплан информационного сопровождения	15.10.2020	14.10.2020	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документация на участие в отборе" Иное Министерства просвещения РФ от 14.10.2020г. №ТВ-30/04вн, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Подана заявка на участие в

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды				отборе в соответствии с новой утвержденной конкурсной документацией, т.к. планируется пересмотр концепции реализации мероприятий.
2.1.5	РРП		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели ЦОС Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели ЦОС	25.08.2020	25.08.2020	Уколов А. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении должностных лиц" Приказ Комитета образования и науки Курской области от 21.08.2020г. №1-855, приложен файл. Отклонения отсутствуют
3.			Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Значение: 213,0000 Дата: 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. На основе поданной заявки на участие в отборе в связи с утверждением новой конкурсной документации планируется изменение значений результата. Предоставлена информация : 213 из 213.
3.1.	РРП		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 213 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 213 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	31.12.2022	31.12.2022	Долгушина С. В.	В работе. Отклонения отсутствуют. На основе новой конкурсной документации планируется изменение концепции реализации мероприятий.
3.1.1	РРП		Утвержден медиаплан информационного сопровождения	15.10.2020	14.10.2020	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды</i> Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды				1. "Документация на участие в отборе" Иное Министерства просвещения РФ от 14.10.2020г. №ТВ-30/04вн, приложен файл. В связи с утверждением новой конкурсной документации подана заявка на участие в отборе, т.к. пересмотрена концепция реализации запланированного результата.
4.			<i>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</i> Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении запланированных значений" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 29.12.2020г. №01/2130, приложен файл. 220 организаций из 544 обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Предоставлена информация : 40 из 40.
4.1.	РРП		<i>Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов</i> Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020	29.12.2020	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исполнение" Письмо ОГБУ ДПо "КИРО" от 29.12.2020г. №01/2130, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Плановое значение достигнуто.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020	29.12.2020	Сахневич И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении запланированного мероприятия" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 29.12.2020г. №01/2130, приложен файл.
5.			Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на территории Курской области" Соглашение Министерства просвещения РФ от 28.08.2019г. №073-2019-Е40046-1/1, приложен файл. Значение указано нарастающим итогом, результат был достигнут в 2019 году, дополнительным соглашением на 2020 год создание Центра цифрового образования детей не предусмотрено Охват детей в 2020 году составил 1990 человек. Предоставлена информация : 1 из 1.
6.			Для не менее 25 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Курской области, внедрены в образовательную программу	31.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Достижение установленного значения" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 30.12.2020г. №01/2140, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>современные цифровые технологии</i> <i>Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020</i>				Предоставлена информация : 8 из 8.
6.1.	РРП		Для не менее чем 8 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий Для не менее чем 8 тыс. детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2020	31.12.2020	Долгушина С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении запланированных мероприятий" Письмо ОГБУ ДПО "КИРО" от 30.12.2020г. №01/2140, приложен файл. Отклонения отсутствуют
6.1.1	РРП		проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 8 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 8 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	31.12.2020	31.12.2020	Сахневич И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятия" Письмо ОГБУ ДПО КИРО от 30.12.2020г. №01/2140, приложен файл. Отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			области				

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

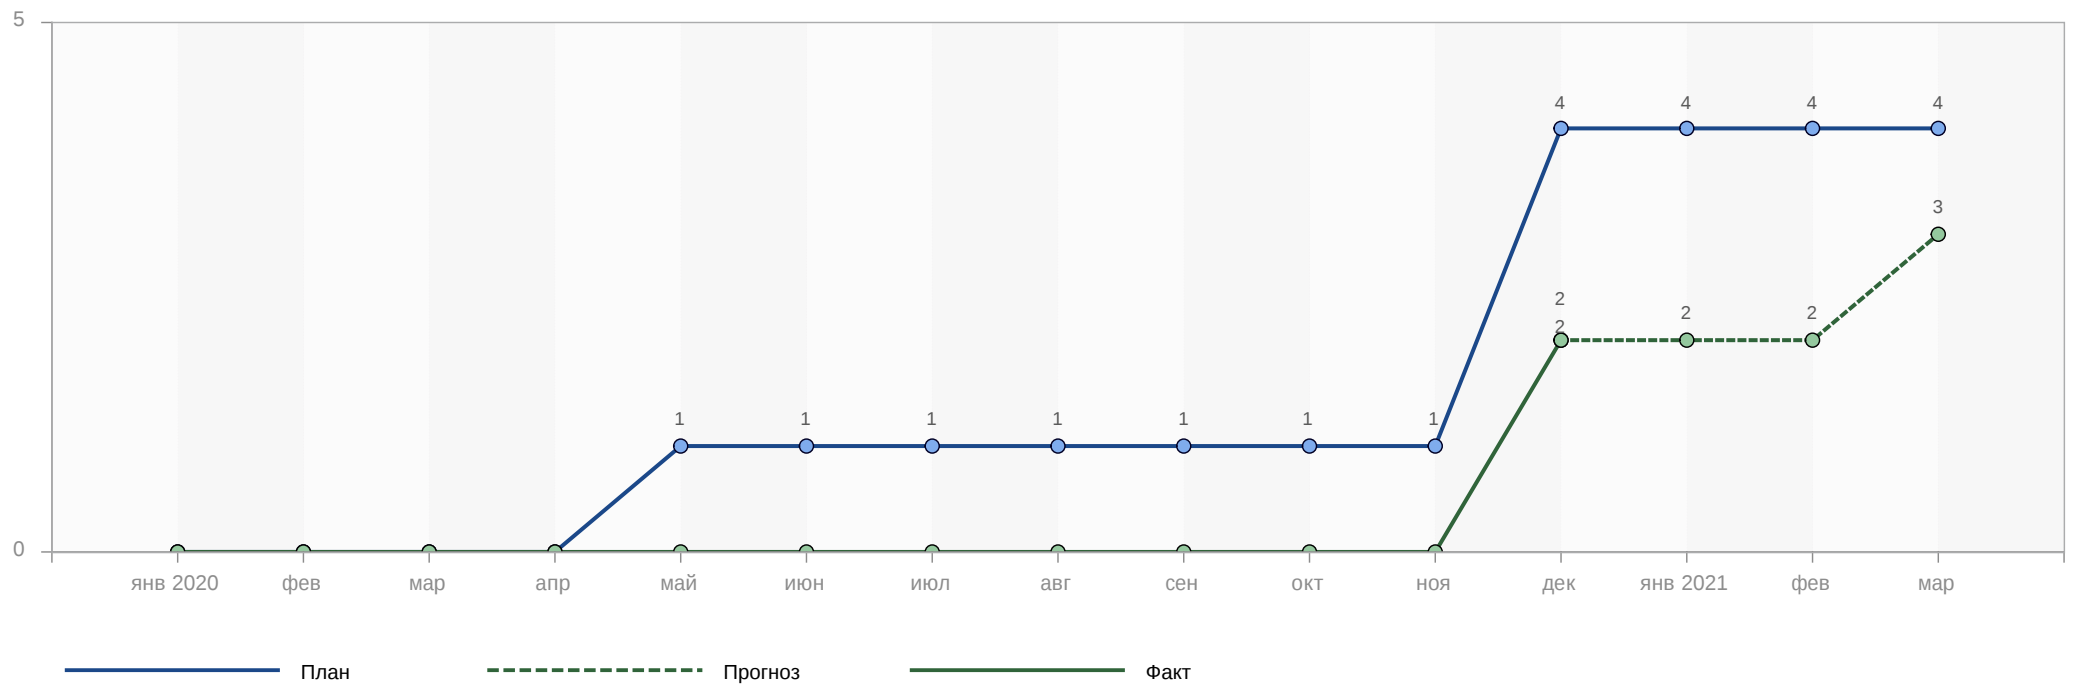


Рис. 1. "(Е4-38) Цифровая образовательная среда (Курская область)"

График достижения показателя



Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Диаграмма достижения показателя

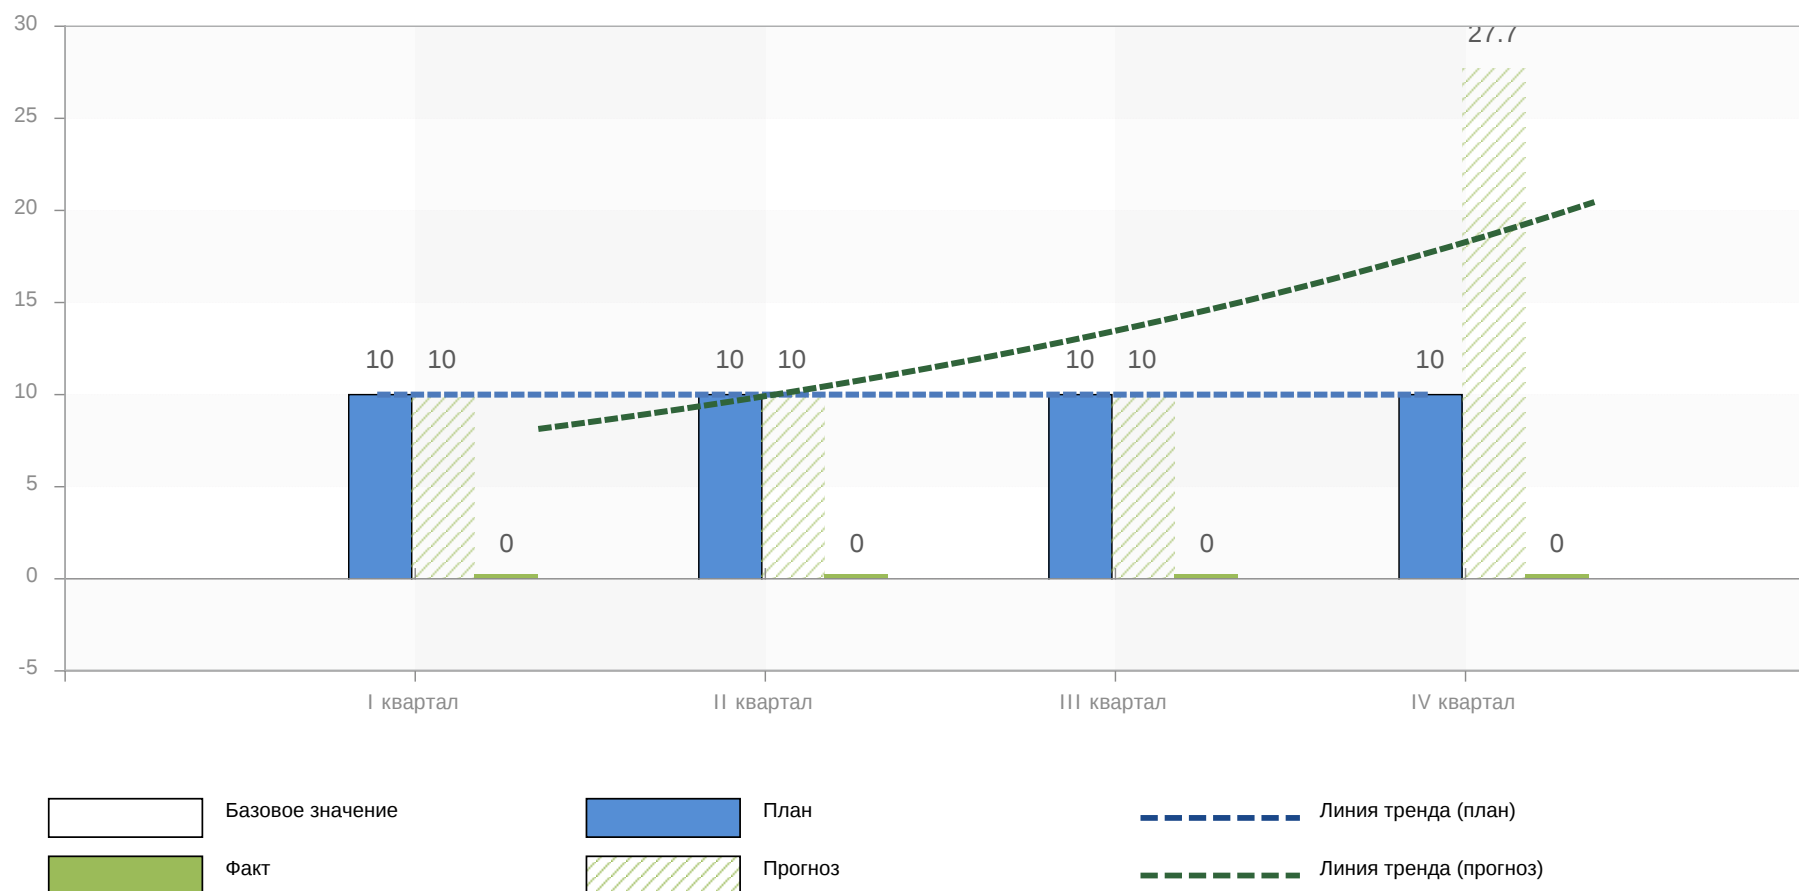


Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

График достижения показателя



Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

Диаграмма достижения показателя

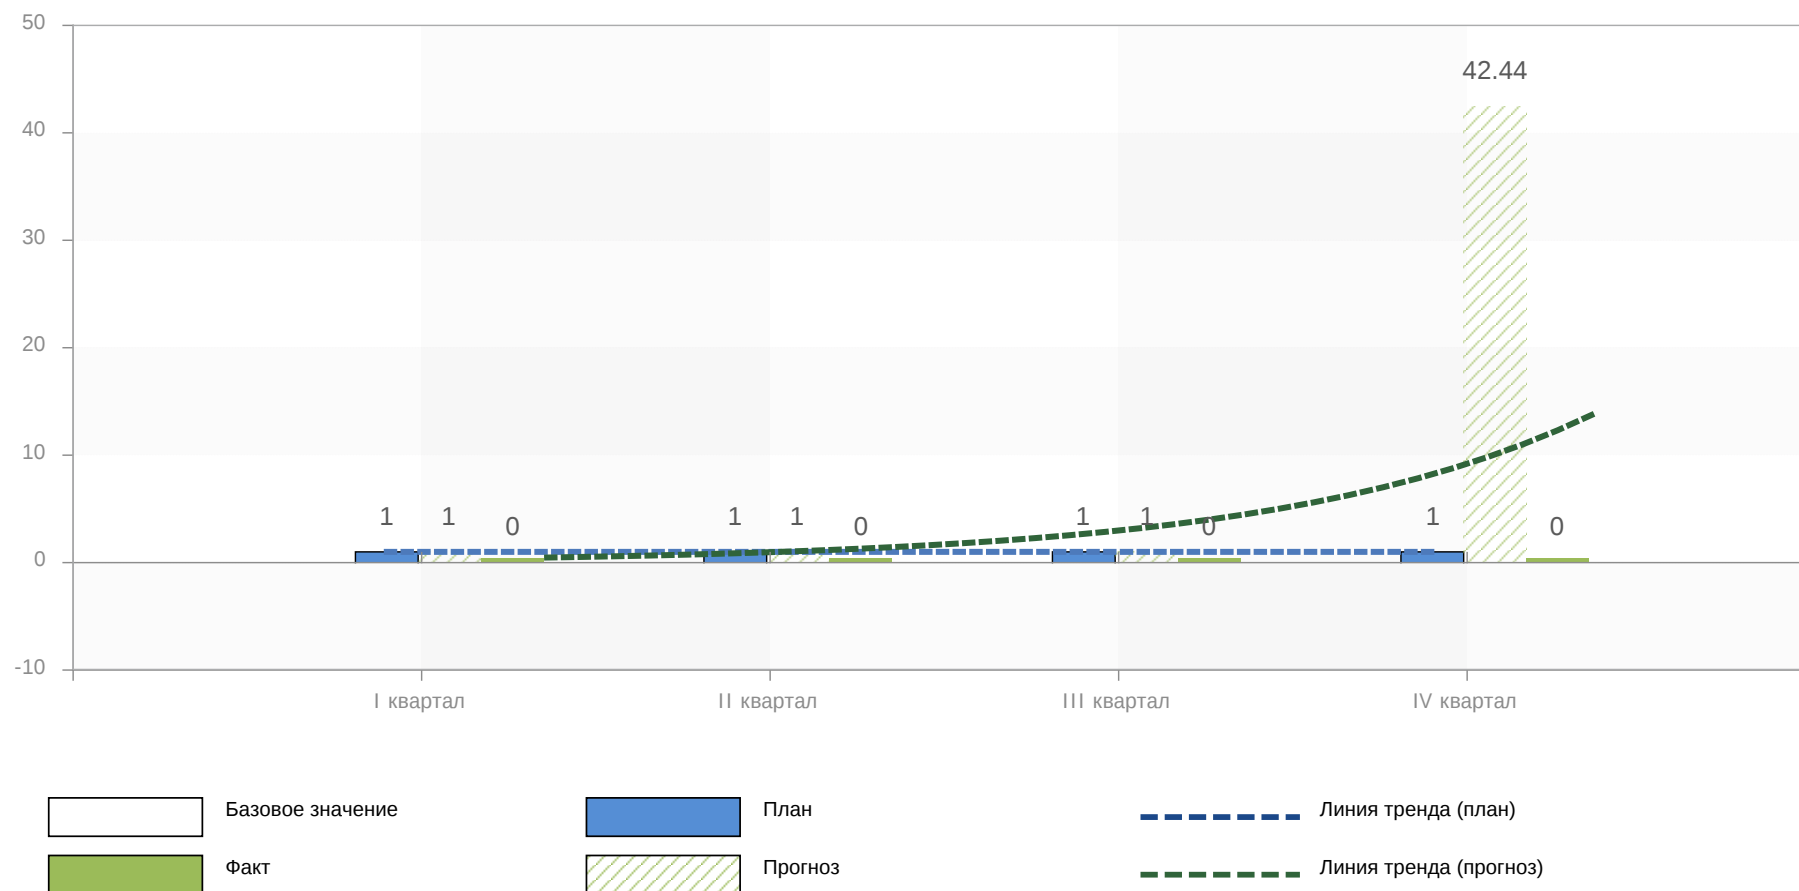


Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

График достижения показателя

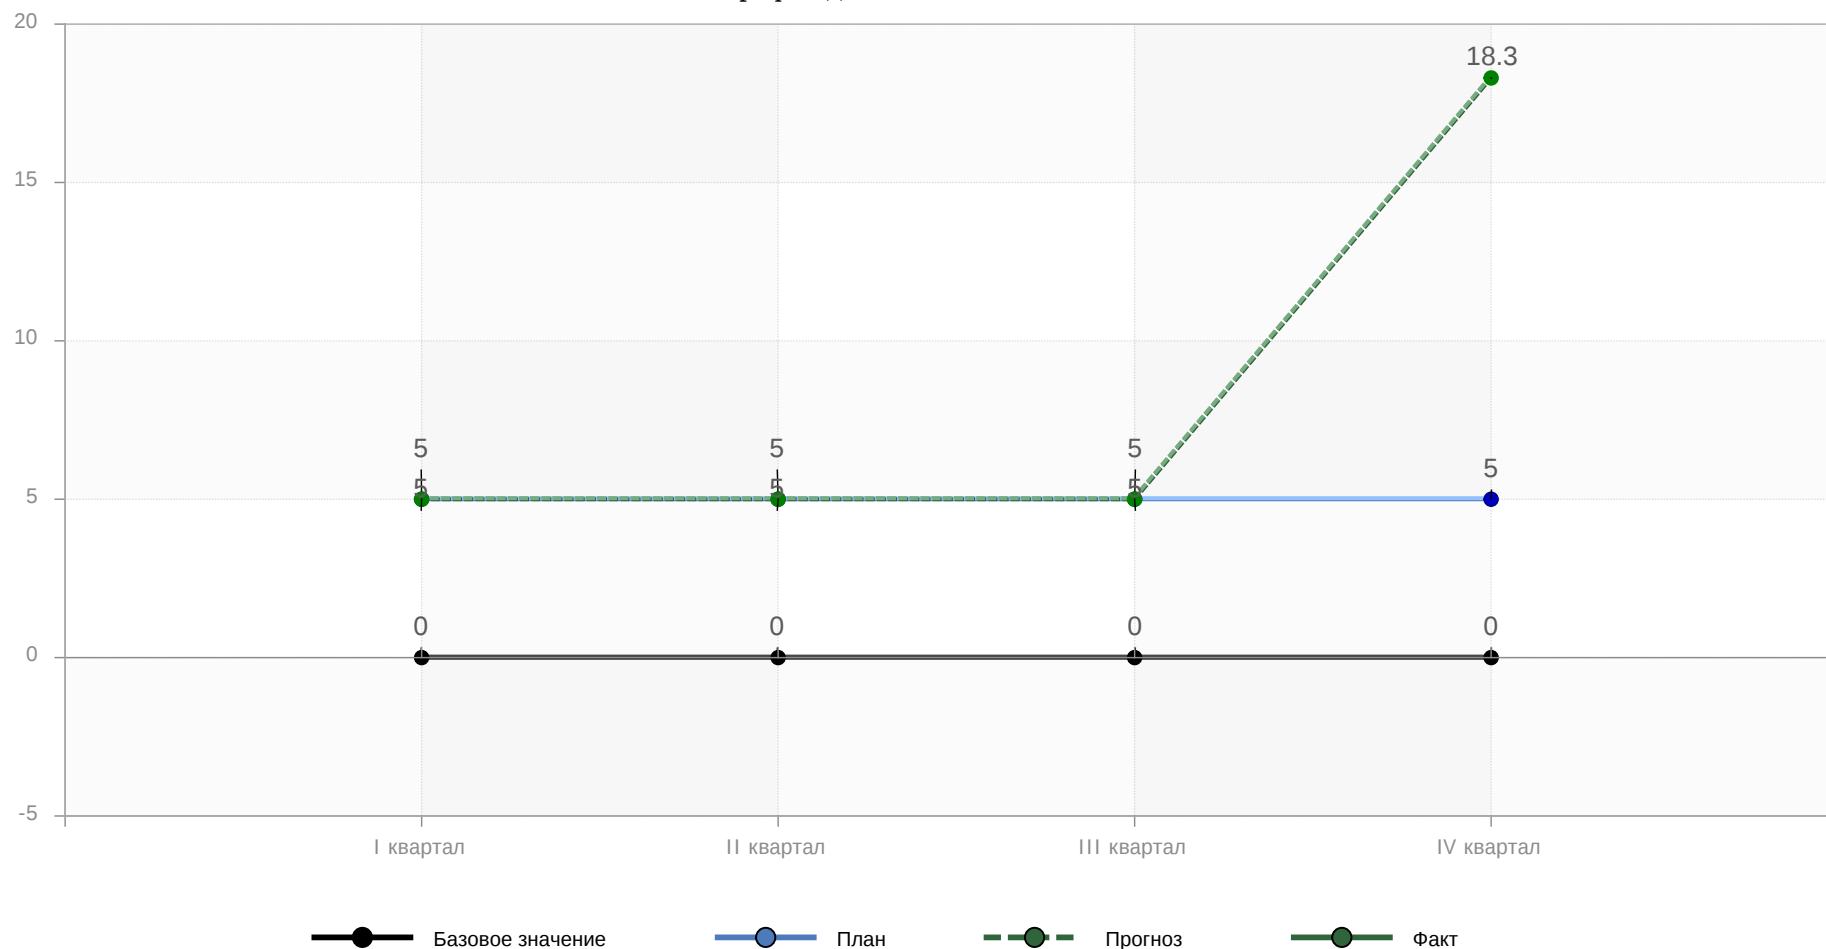


Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

Диаграмма достижения показателя

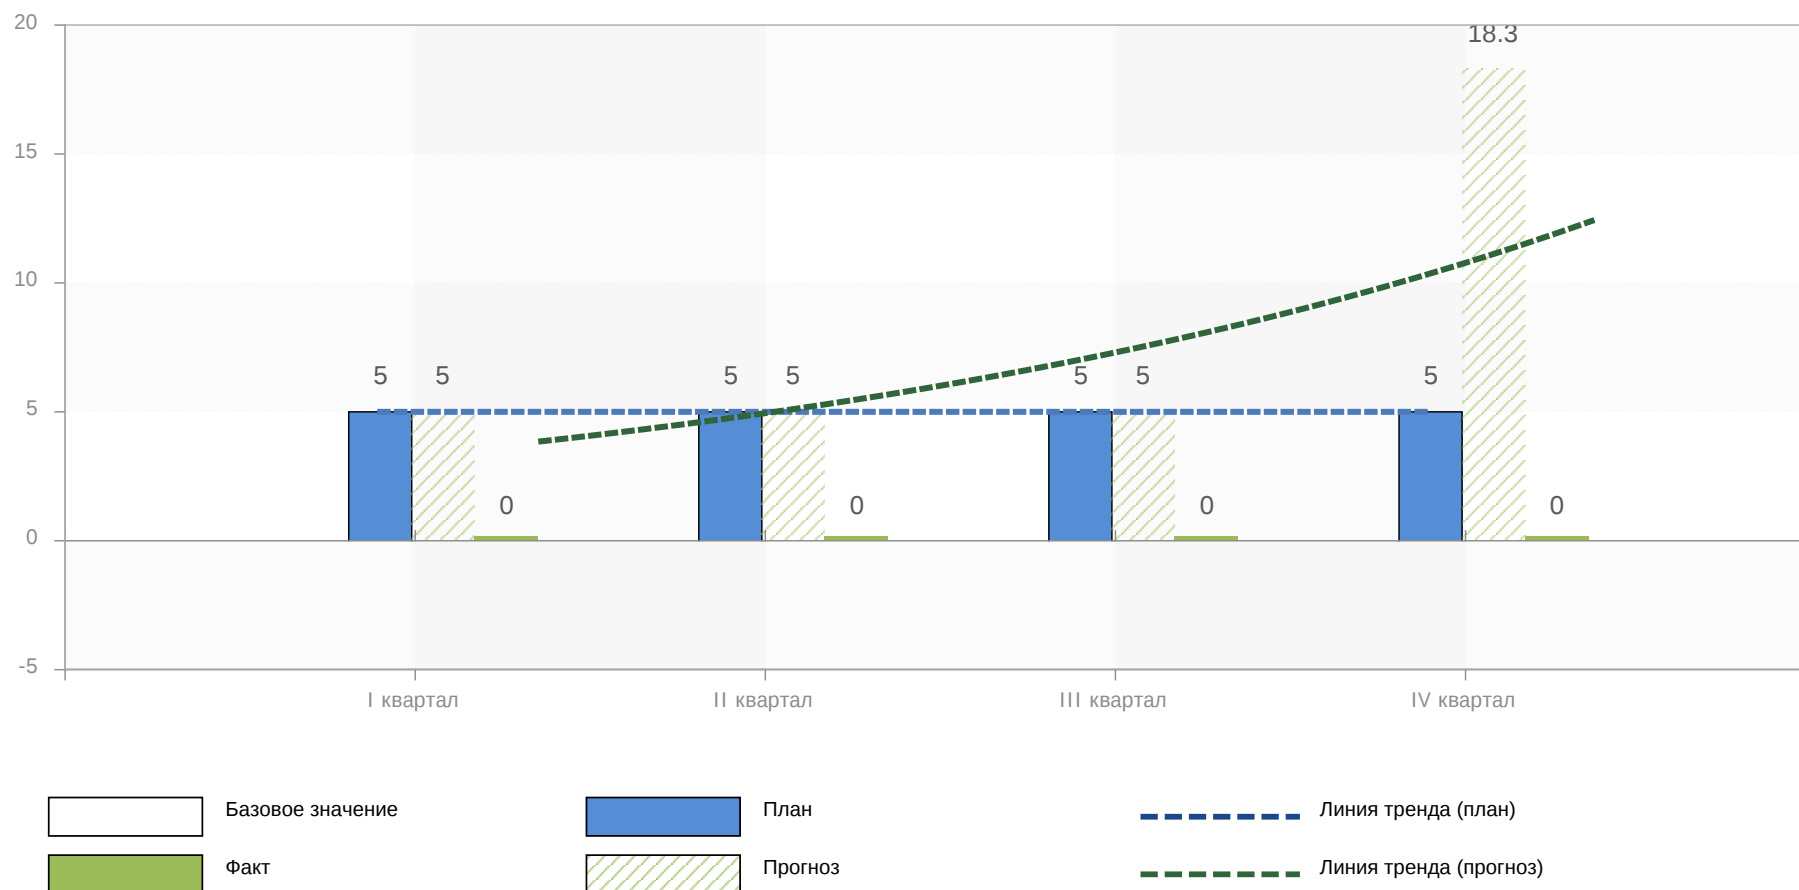


Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

График достижения показателя

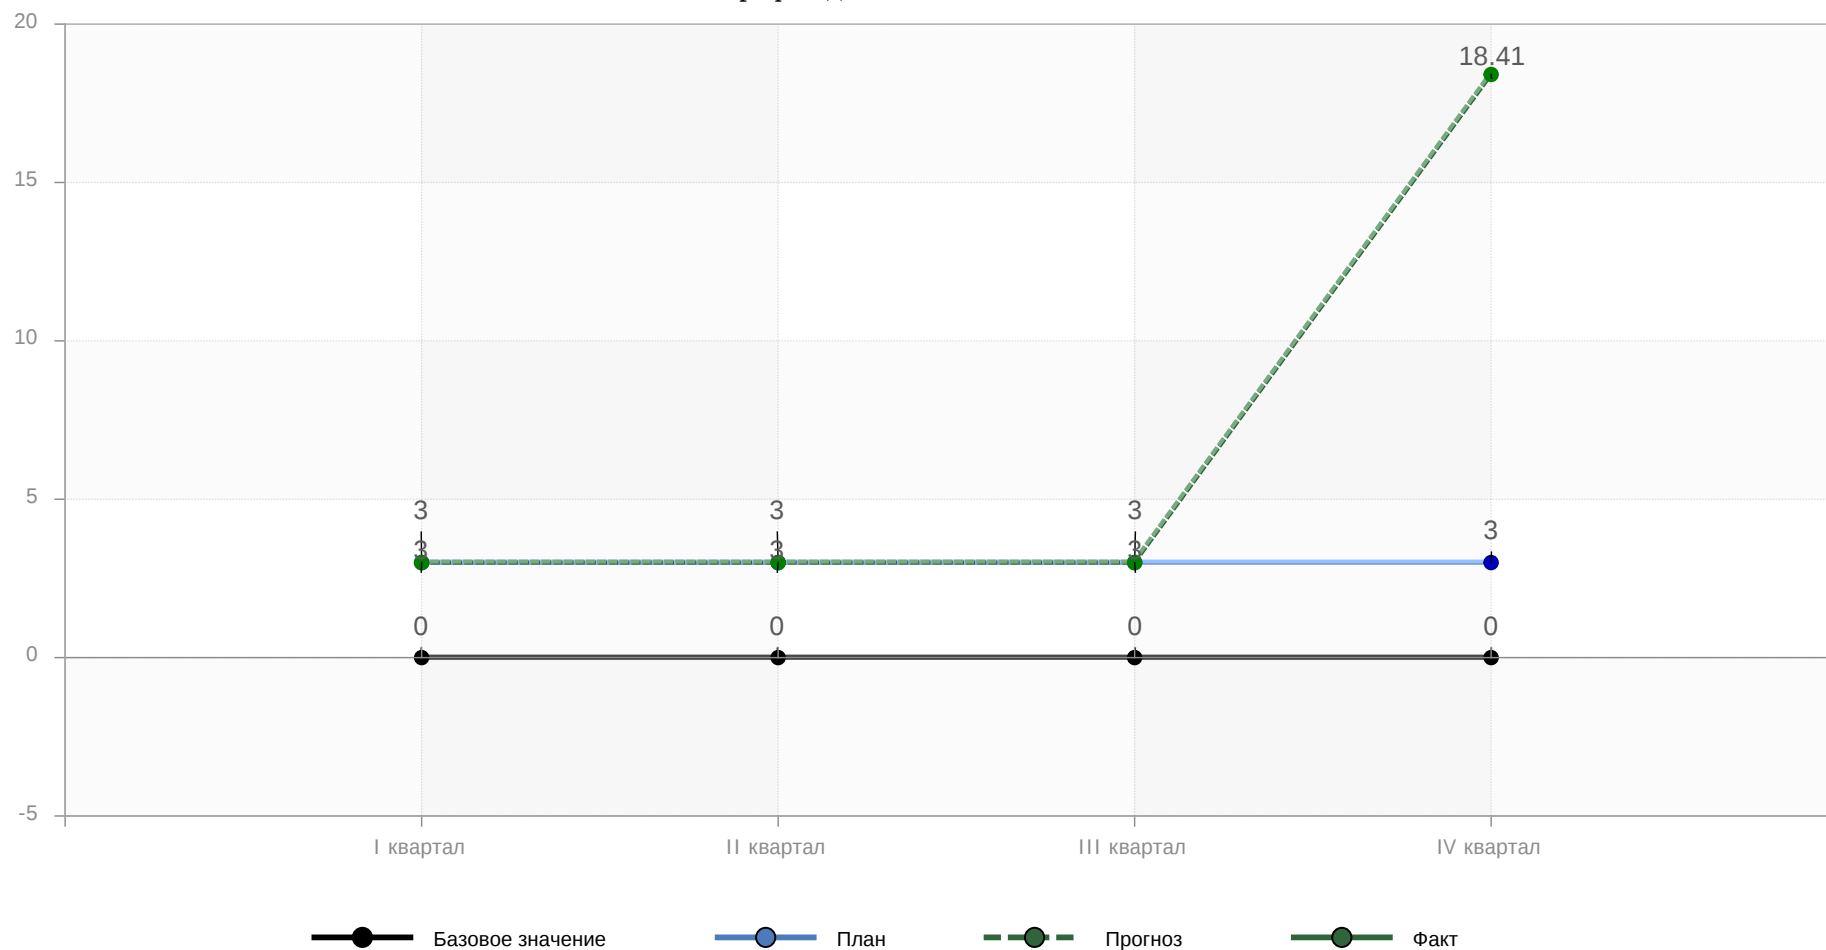


Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

Диаграмма достижения показателя

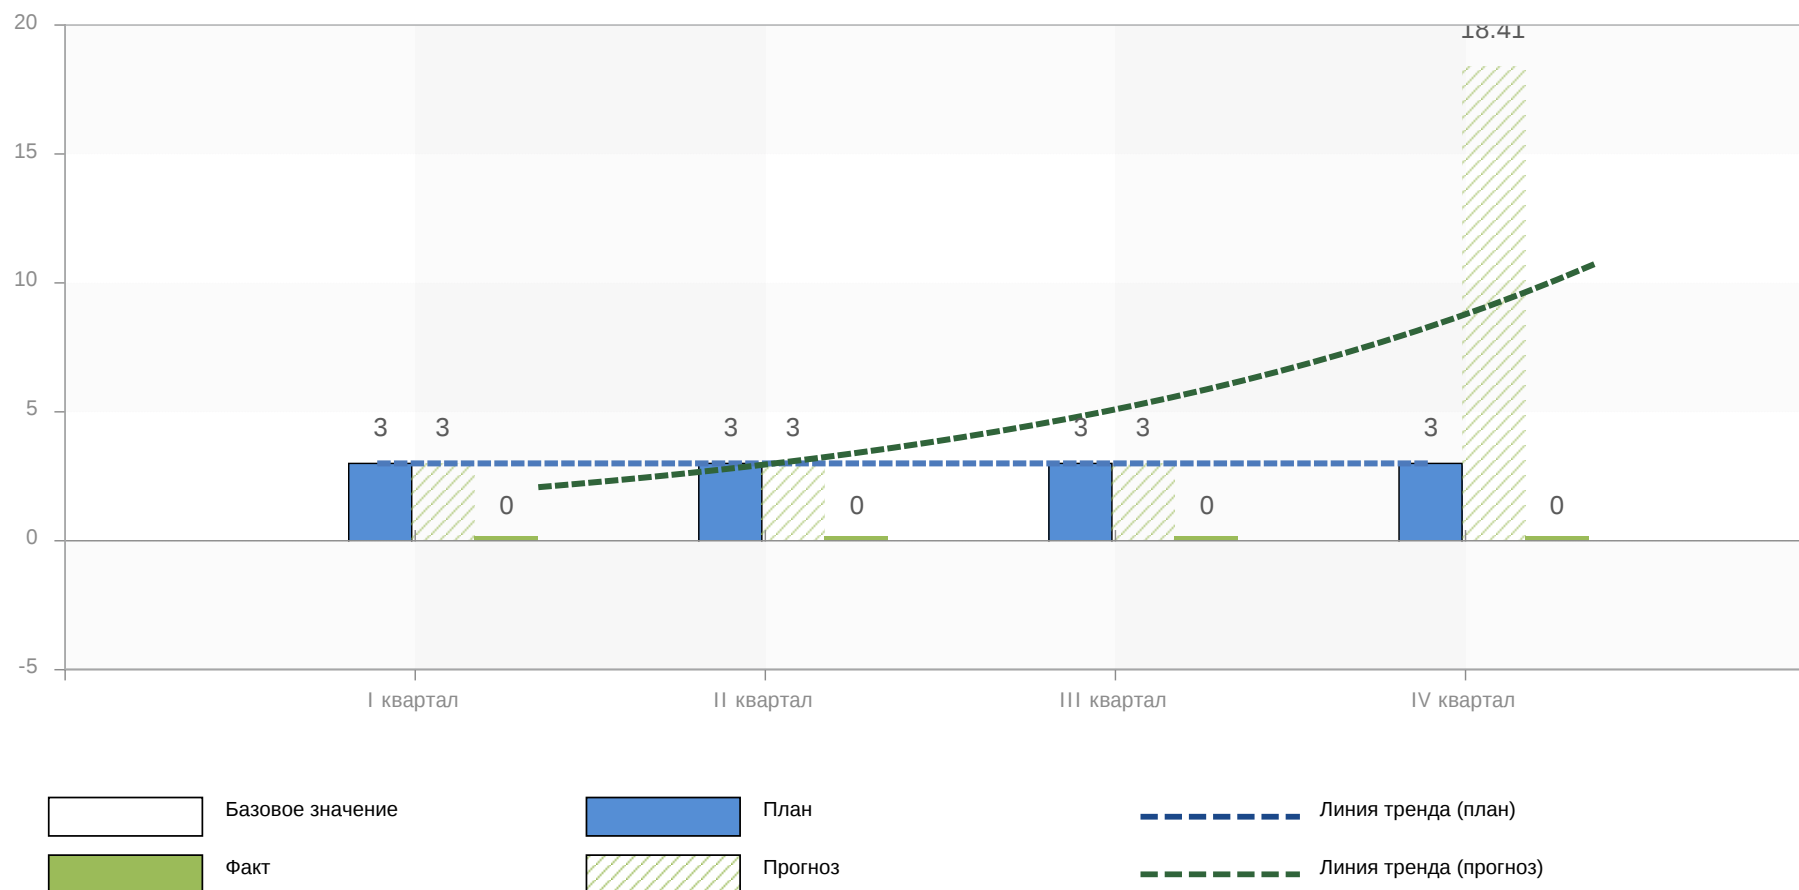


Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

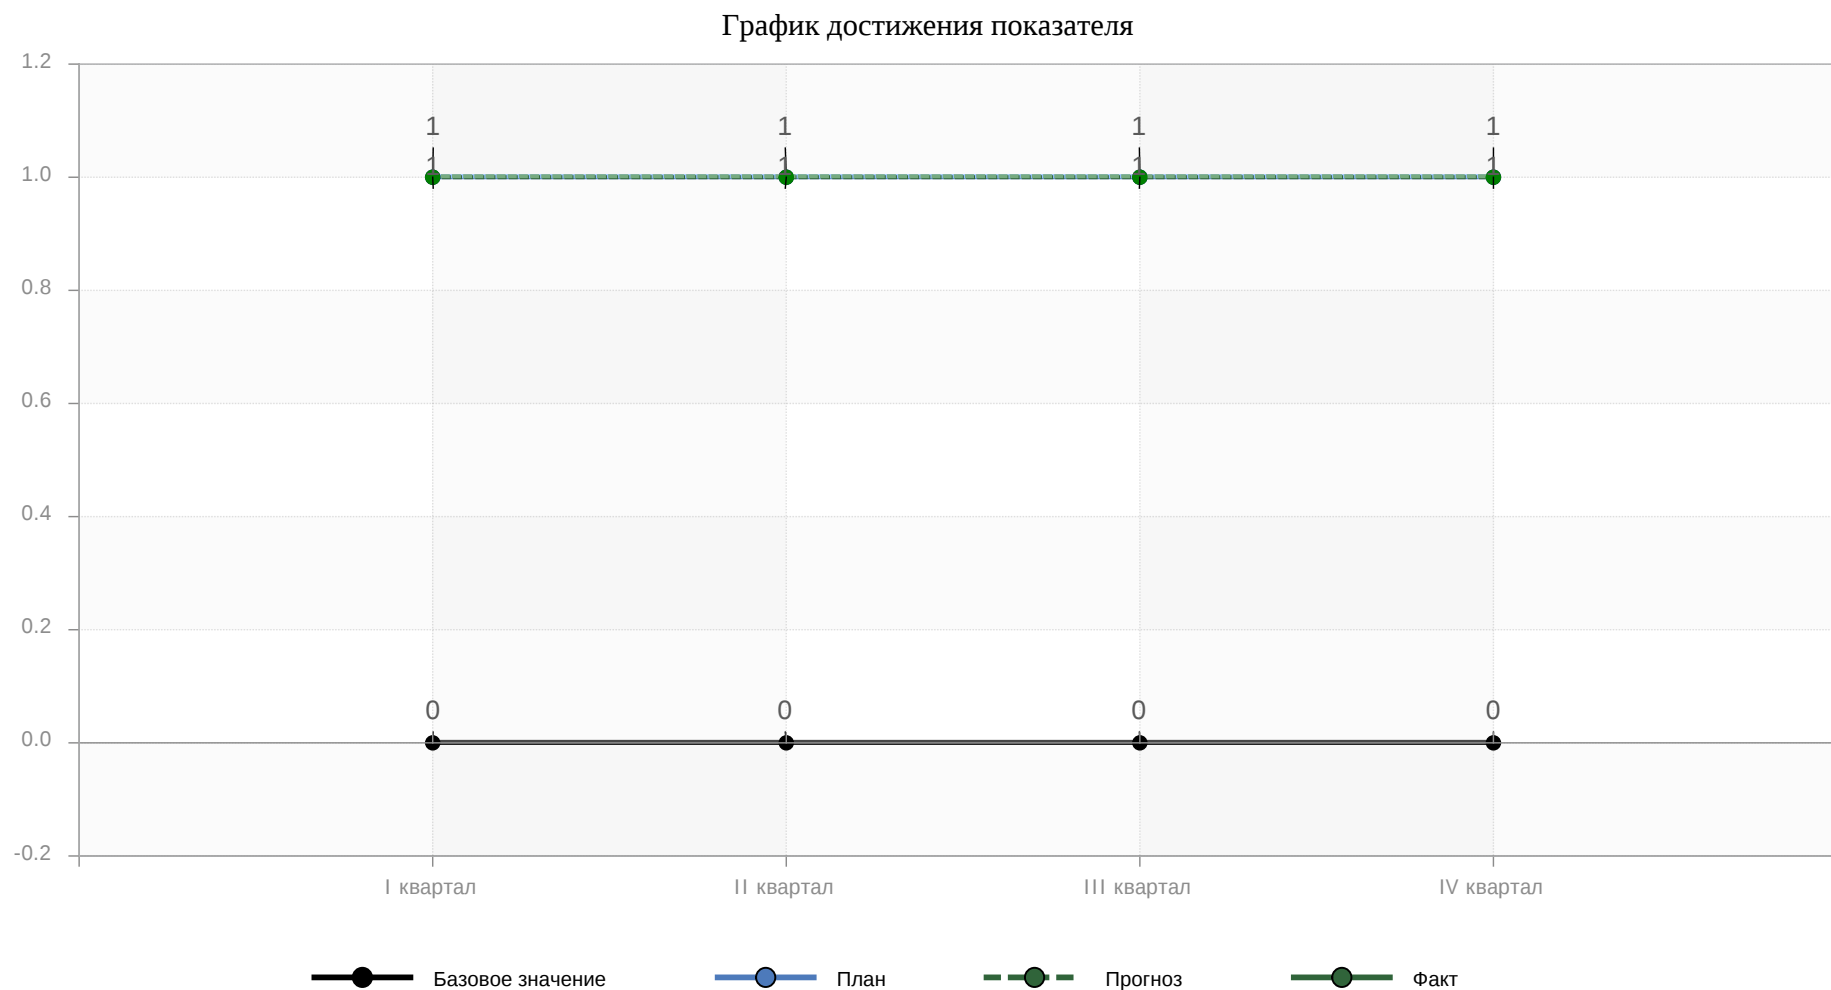


Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

Диаграмма достижения показателя

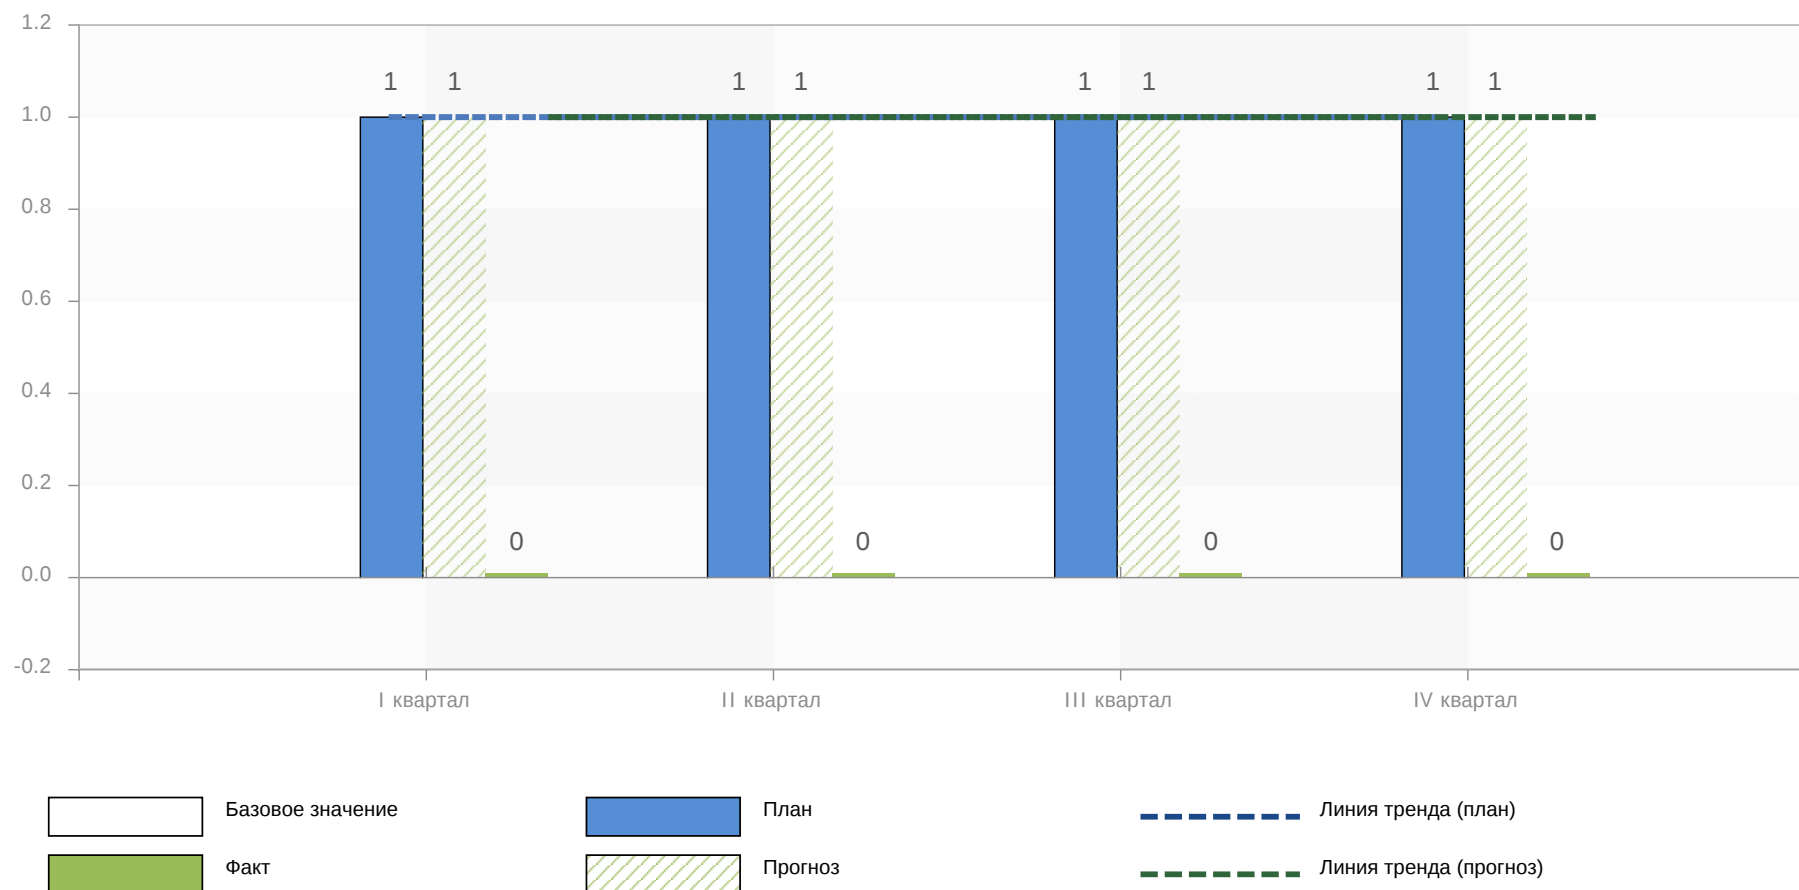


Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
